



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

24 เม.ย. 2567

เลขที่ ก.๓ สข.(กป.) ๒๑๑ /๒๕๖๗ วันที่ เมษายน ๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายท่อนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายทศพงษ์ศักดิ์ กาทหลง ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า  
 เดิมบางว. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA3	๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟปักเสา-ทาดสาย บริเวณ ดิสชั่วคราวก่อนวัดหนองหิน ถึงดิสชั่วคราวหนองห้วยวัง	DIS ชั่วคราว ก่อนวัดหนอง หิน	DIS ชั่วคราว หนองห้วยวัง	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ... หม้อแปลง ๑๑ เครื่อง ๓๓๐ เหวื่อ ... ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชผ.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑๒ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*ทศพงษ์ศักดิ์*  
 ( นายทศพงษ์ศักดิ์ กาทหลง )  
 ผจก.กฟส.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟผ.๓  
 เรียงน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA03 จาก DIS ชั่วคราววัดหนองหิน ถึง DIS ช.ค.หนองห้วยวัง  
 ในวันที่ 25 เม.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 539/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ... ฟีดเดอร์ ... จาก ... ถึง ...  
 ในวันที่ ... ตั้งแต่เวลา ... น. ถึง ... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *ทศพงษ์ศักดิ์* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *ก. ๓๓๐๑ไทย จันทร์เพ็ญ*

*Thong*  
 ( จตุพร อภัย ) จลยศิริ  
 ผจก.สมทบผ.คป.


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
 เรียงน ผจก. *กมลศักดิ์*  
 อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น  
 แผนผังแนบ 1 แผ่น  
 ผจพ. (สถานี) ...  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา ... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


*กมลศักดิ์*  
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวัดหนองหิน - วัดหนองหัววัง (DOA03)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	<del>25-เม.ย.67</del>	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	ปักเสา-พาดสายแรงสูงใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 539/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร		วันที่ 18 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภทร,นางสาวสุภัสษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นาย (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมีเ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing		สข.	SCADA	R บ้านสระด่าน
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
4	ตรวจสอบ Dis ชค. บ้านหนองหัววัง สถานะใบมีด "เปิด" วงจร						
5	Dis ชค. DOA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS ก่อนวัดหนองหิน
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สข. ทราบ						
7	แจ้งกฟส.สข. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งกฟส.สข. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
9	เมื่อกฟส.สข. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
10	แจ้งกฟส.สข. ปฏิบัติงานได้						
11	DBA03R-02	Nonreclosing	Normal		สข.	SCADA	R บ้านสระด่าน
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
12	เมื่อกฟส.สข. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
13	แจ้งกฟส.สข. ปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งกฟส.สข. ปลด Short Ground จุด G2 และเมื่อกฟส.สข. ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
15	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing		สข.	SCADA	R บ้านสระด่าน
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	Dis ชค. DOA03	ปลด	สับ		สข.		DIS ก่อนวัดหนองหิน
18	DBA03R-02	Nonreclosing	Normal		สข.	SCADA	R บ้านสระด่าน
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							

ปฏิบัติงานปักเสาเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย วันที่ 25 เมษายน 2567

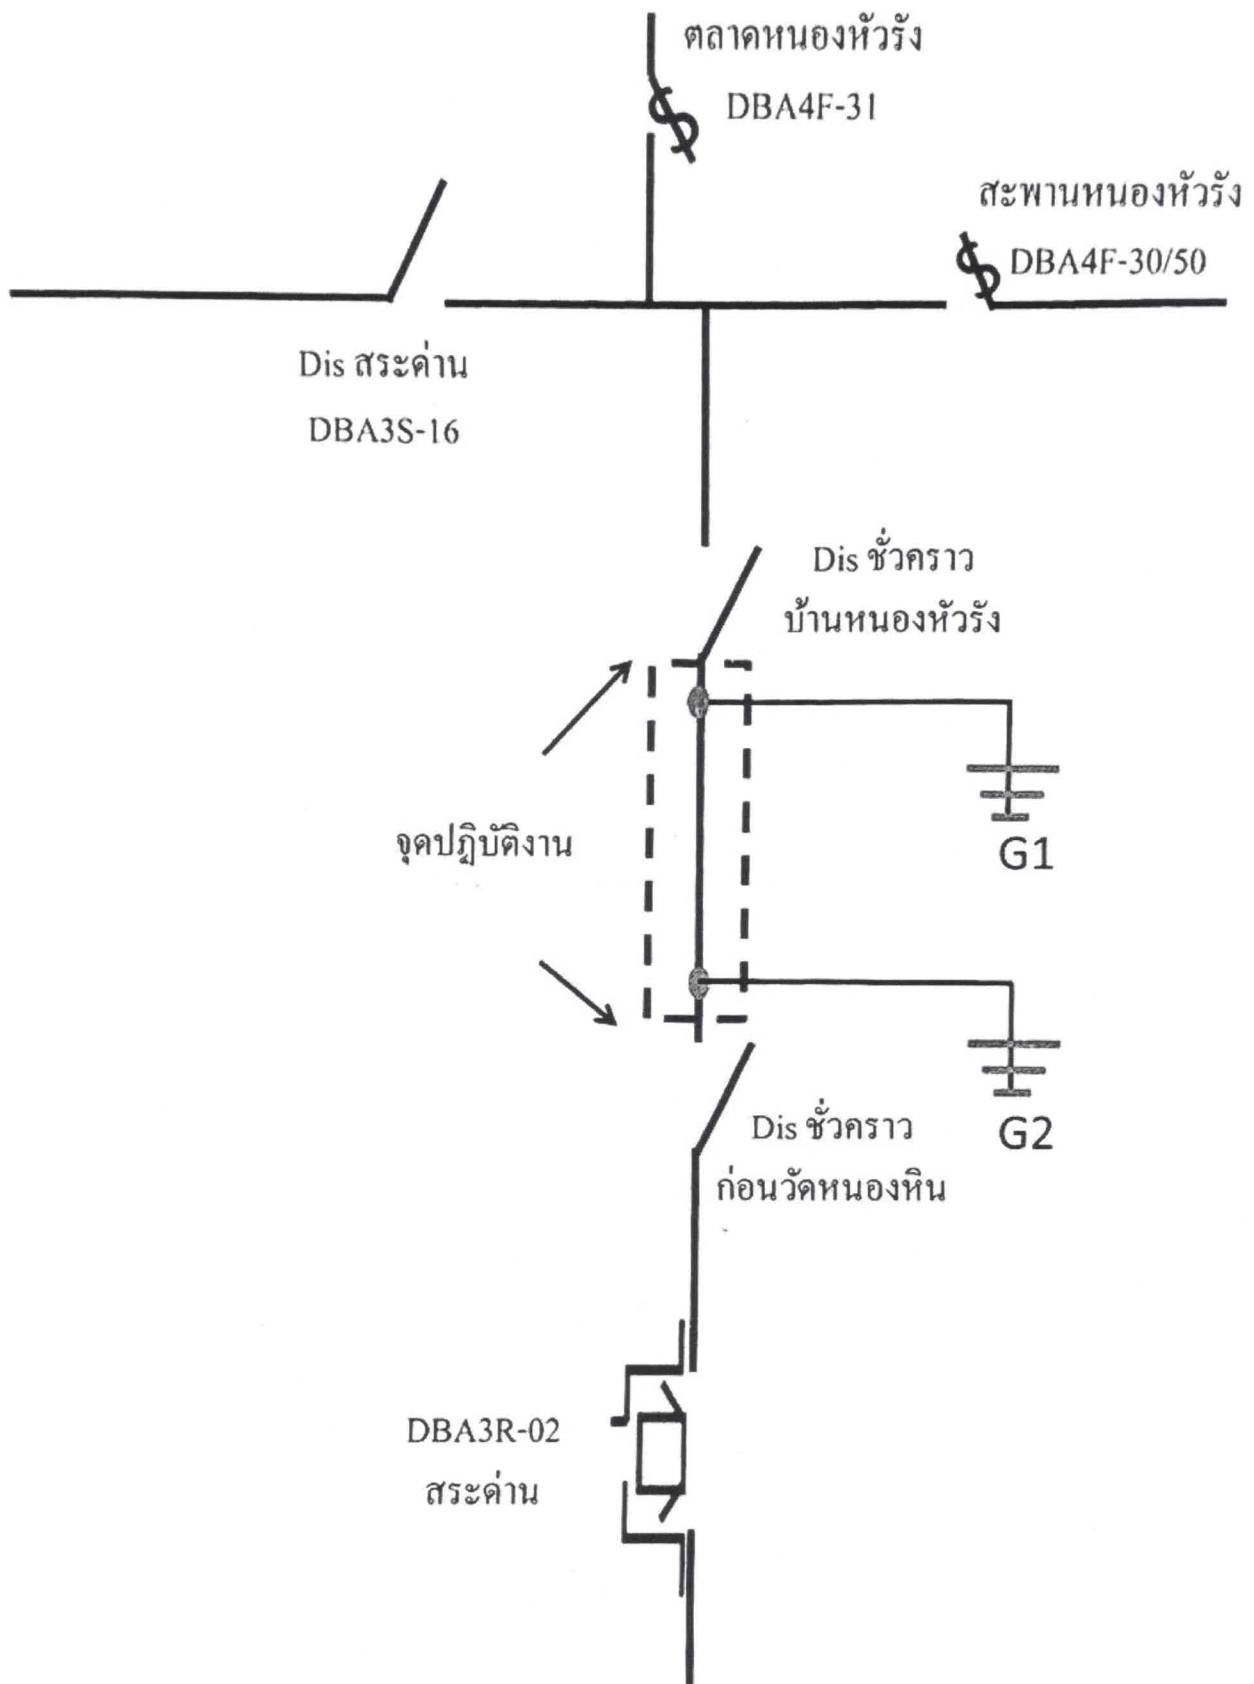

G1 ช้อตกราวด์ นายปิ่นนัทธ์ เทพบุตร ควบคุมงาน  
G2 ช้อตกราวด์ นายธนัช จันท์เพ็ญ ควบคุมงาน
