

# Switching Deadline

12 ม.ค. 66



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.๓.สพท.(กบ.) 031 /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล  
ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ฝัดศิริ

วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า...สองพี่น้อง จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูงดัน DDE ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F1(สพท.1)	17 ม.ค. 67	09.00	12.00	1.เปลี่ยนสายแรงสูงดัน DDE เป็นสาย SAC 185 ต.มม.	SPN1R01	BAM25-23	นายอดิสร จินตananนท์ โทร.๐๘๙-๒๐๒๗๕๕๓
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายภริกรฤทธิ หงษ์โต ตำแหน่ง หน.กบ..... โทร ๐๘๑-๙๘๒๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประเสริฐ ฝัดศิริ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเคอร์ SPN1 จาก DDE. dan R. จอมมา ถึง SPN1R-01  
ในวันที่ 17 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 60/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย...ประเสริฐ ฝัดศิริ... ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเกร็ดฤกษ์ หงษ์โต

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สพท.

อภ.บข.(ก.๓),

อภ.วว.(ก.๓)

(นายประเสริฐ ฝัดศิริ)  
๐๘๑.๕๓๓๖๖๖๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. .... (สถานี) - .....



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ภ.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณก่อน Recloser หน้าวัดดงตาล (SPN01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ม.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายต้น DDE เป็นสาย SAC 185		ตามใบขอปฏิบัติงาน 60/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	9 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,น.ส.สุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

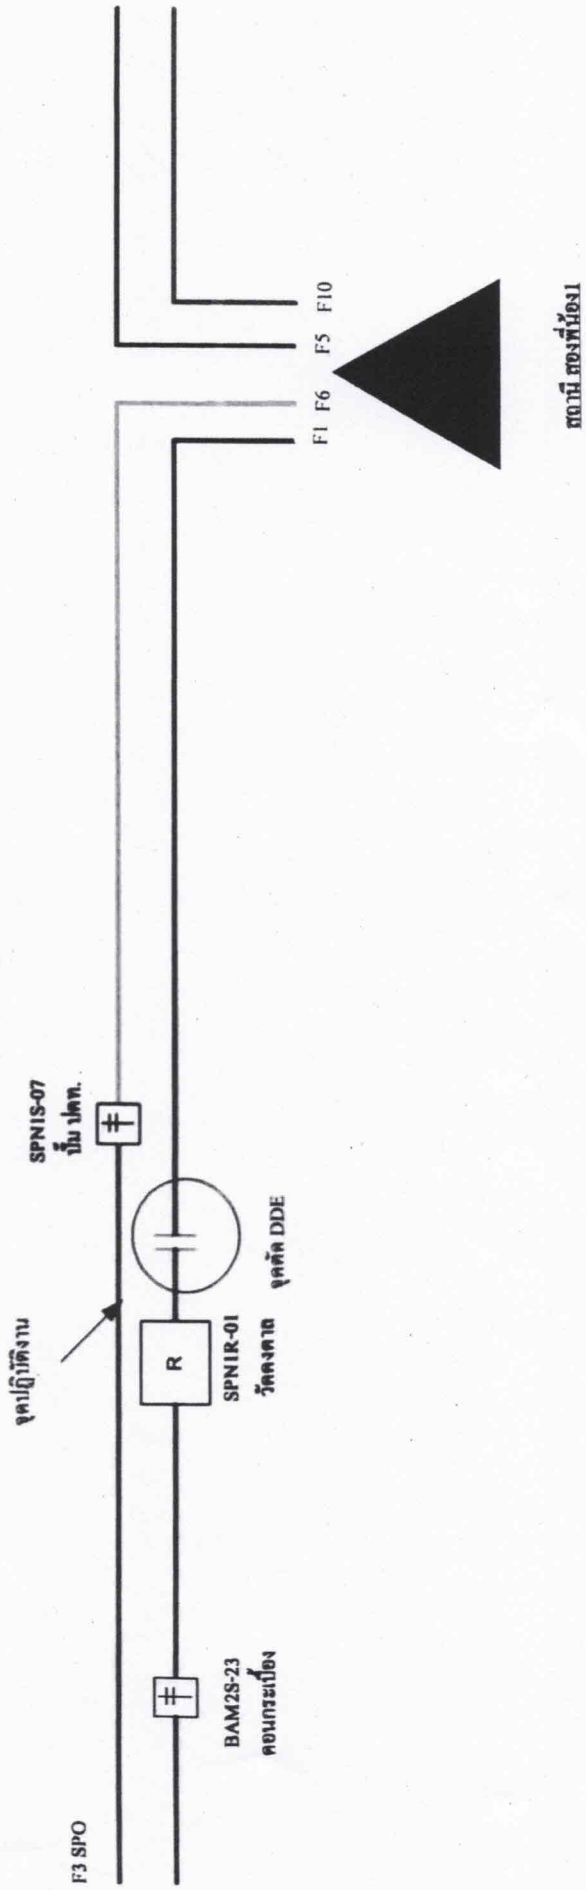
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
3	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
4	SPN01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.		R หน้าวัดดงตาล
5	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-
6	SPB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
7	ย้ายโหลด SPN01 บางส่วนไปรับไฟจาก SPB01						
8	BAM02S-23	ปลด	สับ		บปม.		SF6 วัดตอนกระเบื้อง
9	SPN01R-01	สับ	ปลด		สพน.		R หน้าวัดดงตาล
10	Dis.Source	สับ	ปลด		สพน.		DIS ด้าน Source R.หน้าวัดดงตาล
11	Dis.Load	สับ	ปลด		สพน.		DIS ด้าน Load R.หน้าวัดดงตาล
12	เมื่อพร้อมดับไฟ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลดโหลดวงจร SPN01 บริเวณพื้นที่ดับไฟ ออก						
14	หลังจากทำการปลดโหลดวงจร SPN01 บริเวณพื้นที่ดับไฟ ออก เรียบร้อย						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด DDE วงจร SPN01 บริเวณพื้นที่ดับไฟ ออก						
16	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE วงจร SPN01 บริเวณพื้นที่ดับไฟ ออก เรียบร้อย						
17	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
18	ปฏิบัติงานโดย Hotline กระเช้า ไม่มี Short Ground						
19	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
20	ให้ "OFF" Auto Reclose วงจร SPN01 ไว้ตลอดขณะปฏิบัติงาน						
21	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
22	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-
23	SPB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline กระเช้า ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
26	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	-
27	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB	-	-
28	SPB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	-
29	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการเชื่อม DDE วงจร SPN01 บริเวณพื้นที่ดับไฟ เข้า						
31	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อม DDE วงจร SPN01 บริเวณพื้นที่ดับไฟ เข้า เรียบร้อย						
32	ย้ายโหลด SPN01 บางส่วนกลับจาก SPB01						
33	Dis.Source	ปลด	สับ		สพน.	DIS	ด้าน Source R.หน้าวัดดงตาล
34	Dis.Load	ปลด	สับ		สพน.	DIS	ด้าน Load R.หน้าวัดดงตาล
35	SPN01R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพน.	R	หน้าวัดดงตาล
36	BAM02S-23	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.	SF6	วัดดอนกระเบื้อง
37	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN	-	-
38	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-
39	SPN01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	R	หน้าวัดดงตาล
40	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB	-	-
41	SPB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB	-	-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

# แผนผังย้ายโหลด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 17 ม.ค. 2567 เวลา 09.00-12.00 น.

บริเวณ หน้าวัดคงตาล



\* หมายเลข ปฏิบัติงาน โดยชุดออกไลน์ประจำ
