



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

08/05/67

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท.(กป) ๒๐๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทณันท์ พิชิตสุวรรณชล
ผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU10	๑๑ พ.ค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๖๐ ต้น บ้านดอนเจดีย์ ถึง บ้านหนองแก	PTU10S-13 ท้ายบ้านดอน เจดีย์	PTU10S-14 บ้านกำนันจิว	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๘๖ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผจก.ป. โทร. ๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๕

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สุรวุฒิ บุญนาค
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน
๒ พ.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ PTU10 จาก PTU10S-13 ถึง PTU10S-14
ในวันที่ 11 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 610/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทอจ้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟส. ชำนาญเรือ

อนุชา ชำนาญเรือ
(นายอนุชา ชำนาญเรือ)
๑๑ พ.ค. ๒๕๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. กทม.
อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านดอนเจดีย์ - บ้านหนองแก		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 พ.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปักเสา 12.2 เมตร ตามใบขอปฏิบัติงาน 610/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนิช ทองย้อย		วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายฉัตรพัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิทย์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนิช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	PTU10R-01	Normal	Non-Reclosing		พทน.		ทุ่งสมอ
3	ดับไฟ เวลา 09.00 น.						
4	PTU10S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		ท้ายบ้านดอนเจดีย์
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.พทน. ทราบ						
6	แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งกฟส.พทน. ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
9	แจ้งกฟส.พทน. ปฏิบัติงานได้						
10	PTU10R-01	Non-Reclosing	Normal		พทน.	R	ทุ่งสมอ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	หลังจากกฟส.พทน. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
12	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
13	PTU10R-01	Normal	Non-Reclosing		พทน.		ทุ่งสมอ
14	แจ้งกฟส.พทน. ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
15	แจ้งกฟส.พทน. ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
16	จ่ายไฟ						
17	PTU10S-13	ปลด	สับ		พทน.		ท้ายบ้านดอนเจดีย์
18	PTU10R-01	Non-Reclosing	Normal		พทน.	R	ทุ่งสมอ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังวงจรตีดิน

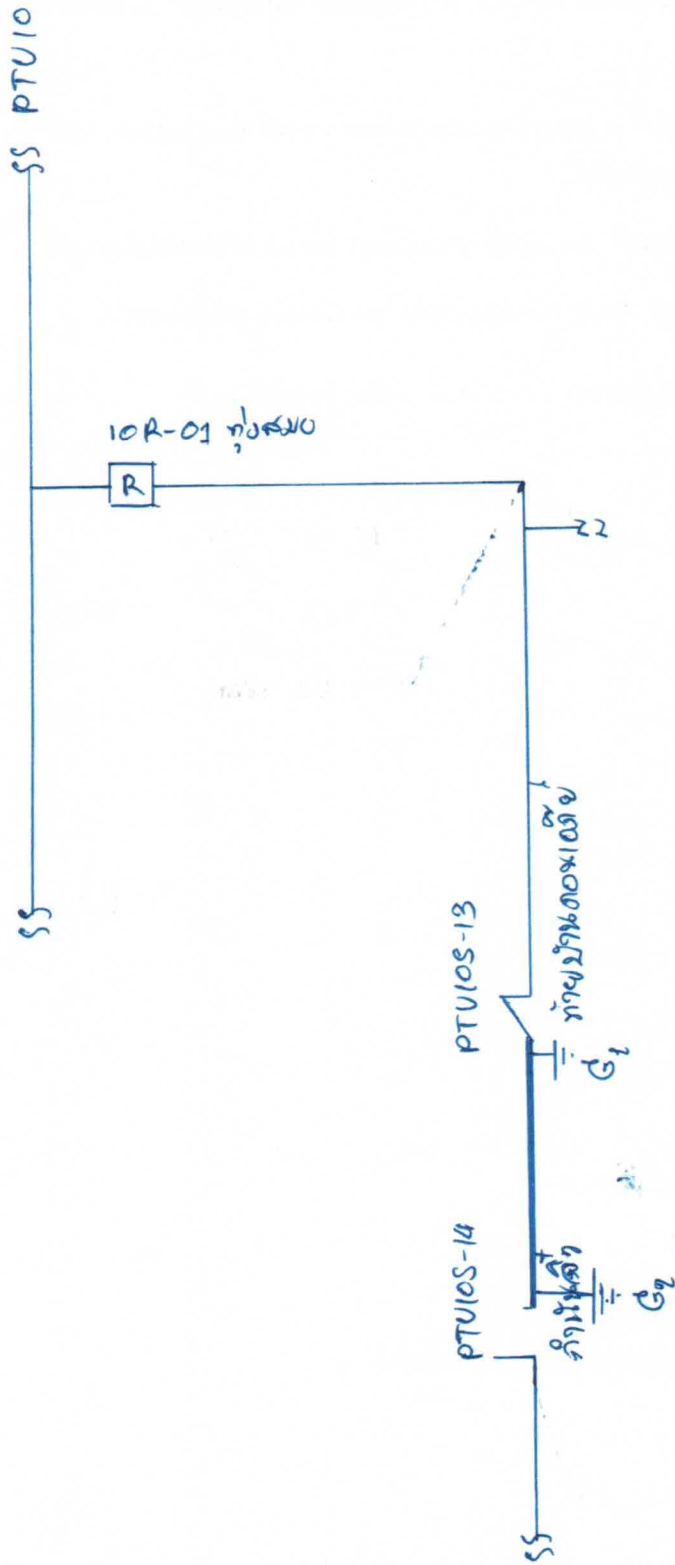

(นายอนุชา ชำนาญเรือ)
จ.น.บ.ก.ส.อ.ท.น.
