



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
TECHNICAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

17 ม.ค. 67

เลขที่ ก.๓.กฟส.(ปบ) ๒๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายทัศนีย์ พงษ์สุวรรณมิตร
ชื่อผู้ส่ง นายบัณฑิต กล่อมดี

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า ตำบลก.๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMU04	20 ม.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.	ปักเสา 12.20 ม. พร้อมต่อมือ จำนวน 71 ต้น	DIS ชั่วคราว แยกหนอง กระทุ่ม	SF6 ชั่วคราว หลังวัดหนอง กระทุ่ม	นายวิญเมือง ศรีจันทร์อินทร์ พงษ.7 ผกย. กรย.ก3.
๒								
๓								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ต.หนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ข.ม.ป.บ. โทร ๐๘๑-๕๔๒๙๘๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบัณฑิต กล่อมดี)
ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.)

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ TMU04 จาก 15 ชั่วคราวแยกหนอง

ในวันที่ 20 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 65/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย วิวิทย์ เถาแก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ศักรินทร์ จิตติขานนท์

9 ม.ค. 67

(นายวิวิทย์ เถาแก้ว)
อ.ค.๕ ๒๒๗ ข.ผ.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.)

เรียน ผ.จก. กฟอ. กฟส.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ต.หนองกระทุ่ม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ม.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	ปิดเสา 71 ต้น ตามใบขอปฏิบัติงาน 65/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 9 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing		TMU		
3	TMU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R หนองกระทุ่ม
4	TMU05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R หนองจิก
5	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ TMU04						
6	TMU04S-15	ปลด	สับ		กพส.		DIS บ้านทุ่งกระถิน
7	SF6 ชั่วคราว	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 หลังวัดหนองกระทุ่ม
8	เมื่อพร้อมดับไฟ						
9	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS หนองกระทุ่ม
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
15	TMUBR-04	Nonreclosing	Normal		TMU		
16	TMU05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R หนองจิก
สิ้นสุด Switching แรก							
17	เมื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
20	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing		TMU		
21	TMU05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		
22	จ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		กพส.		DIS	หนองกระทุ่ม
24	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ TMU04 กลับสภาพปกติ							
25	SF6 ชั่วคราว	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6	หลังวัดหนองกระทุ่ม
26	TMU04S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	บ้านทุ่งกระถิน
27	TMUBR-04	Nonreclosing	Normal		TMU			
28	TMU05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R	หนองกระทุ่ม
29	TMU05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R	หนองจิก
สิ้นสุด Switching								

สถานการณจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

KSA 08
KSA 06

24 ธันวาคม 2566

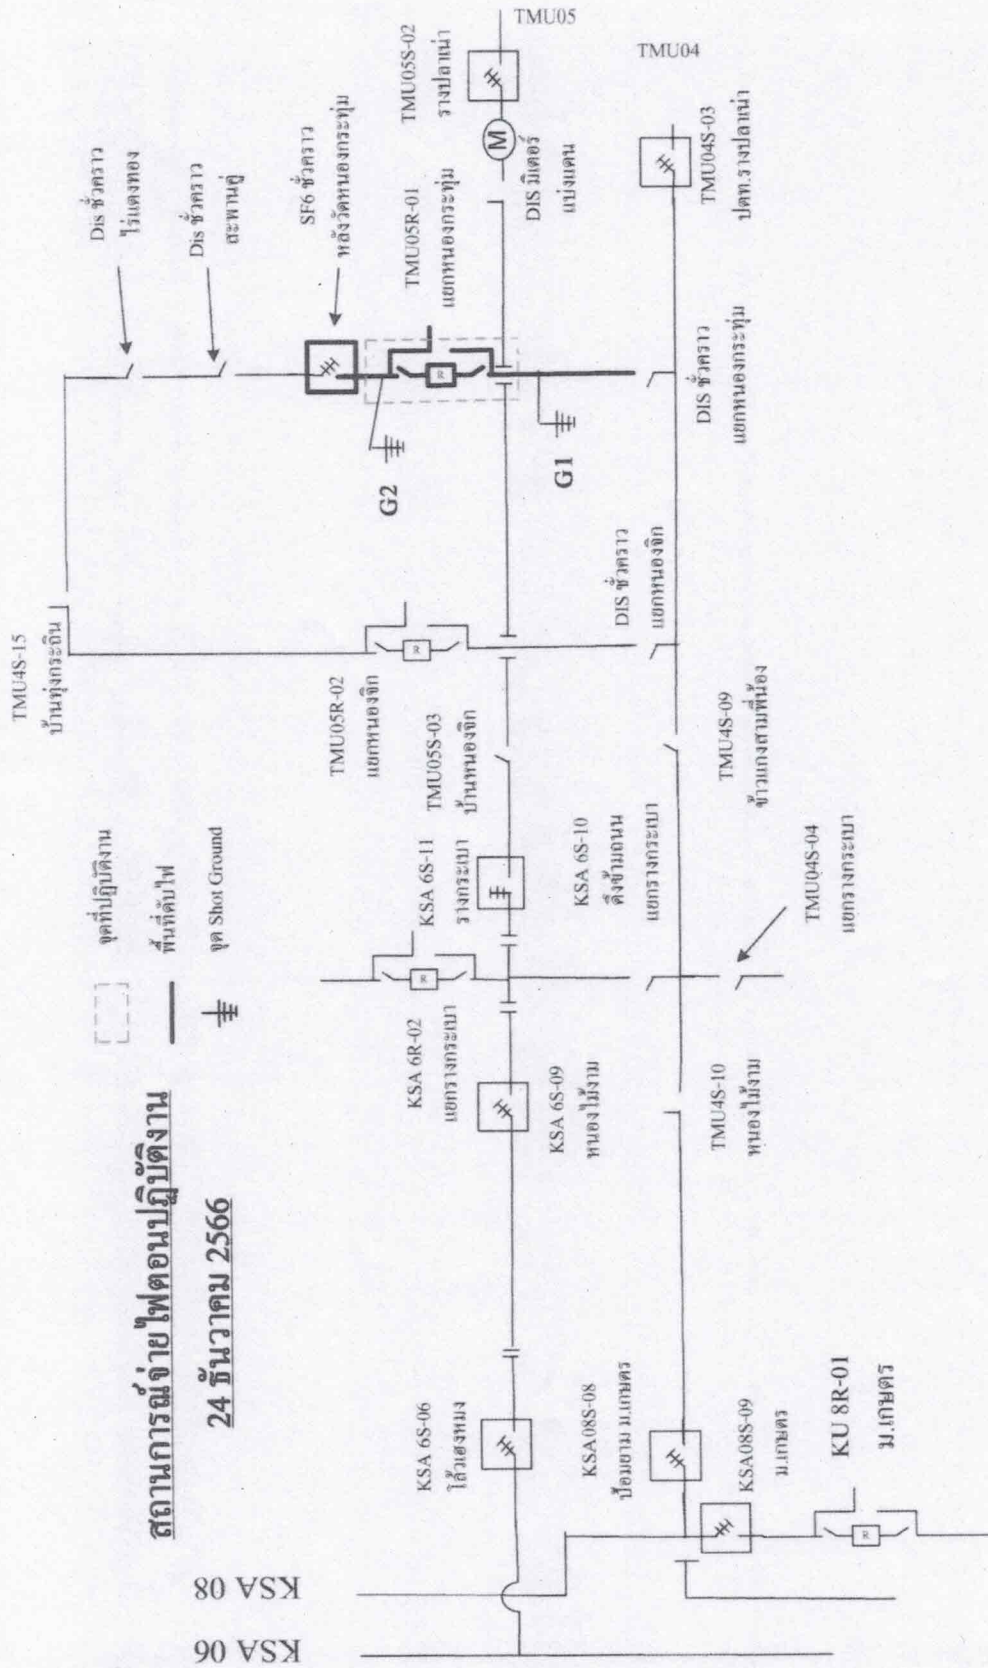

ไปพนมทวน

ไปก้มพงแดน

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ปล. ๕ งานนอกการ: ทุ่ง ๑ วัดไร่แตงทอง ๕๖ /
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ปล. ๕, ก่อตอปรณ
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗๐๐น.
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กสอ. กพร.
 ชื่อผู้อำนวยการงานระดมเจ้าหน้าที่ของพื้นที่งบประมาณ คัดเลือกแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)
 ชื่อ นาย. อ. ส. ก. ตำแหน่ง รจก.(ท) / ชจก.(ท) / ผชน. / วิศวกร / หน. / ชผ.
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๙๘-๙๒๓๕๕๖๐ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ.....
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก นาย. ว. ก. ตำแหน่ง พ.๕๖.๕ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๙๗-๐๐๙๐๗๖๐ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ.....
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว ผกธ. กธ๐. กค๑. ก.๓ กสอ. กพร. กสอ. มว. กสอ. ม๖๖.

๑. ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า.....
 ๒. ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่๑..... ผู้รับผิดชอบ.....
 จุดที่๒..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๓.....
 ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔..... ผู้รับผิดชอบ.....
 ๓. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... พร้อมแผนผัง Switching ดับไฟ
 ๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....

๕. ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่มีข้อทักท้วง มีข้อทักท้วง..... รายละเอียด.....
 วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....

๖. ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงจรรยาวิธีไฟฟ้า และวงจรถับดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
 ก่อนวันทำงานระดมหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล จัดประชุมแล้ว
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....
 รายนามผู้เข้าร่วมประชุม.....

๘. ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่
 ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล ชี้แจงแล้ว
 ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง.....

C3 Safety CAP 01
 หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้
 ๑. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบแรงดันก่อน
 เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
 ๒. เมื่องานแล้วเสร็จ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงจากเสา
 หมดแล้ว จึงแจ้งให้ถอดสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อถอดสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงสั่งการ
 ให้จ่ายไฟฟ้า





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก พชง.ผกร.กรข.ก.3 ถึง ผจก.กฟอ.กพส
เลขที่ _____ วันที่ 8 มกราคม 2567
เรื่อง ขออนุมัติดับไฟ
สิ่งที่ส่ง _____

เรียน ผจก.กฟอ.กพส /ผ.กส. *A*

ตามที่ข้าพเจ้า นายขวัญเมือง ศรีจันทร์อินทร์ พชง.7 ผกร.กรข.ก.3 เปิดงานปรับปรุงช่วง
หนองกระทุ่ม(แยกหนองกระทุ่ม-วัดไรแดงทอง)ช่วงที่ 1 หมายเลขงาน P-TDD02.3-I-KPNIA.0017
ข้าพเจ้า มีความประสงค์ขออนุมัติดับไฟฟ้าบริเวณปากทางเข้าหนองกระทุ่ม ถึง วัดหนองกระทุ่ม วันเสาร์ที่
20 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 17.00 น. เพื่อทำการปักเสา และติดตั้งอุปกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไปด้วย

- เห็นชอบ
- อนุมัติตามเสนอ

(Signature)

(นายขวัญเมือง ศรีจันทร์อินทร์)

พชง.7 ผกร.กรข.ก.3

8 ม.ค. 67

(Signature)
(นายบัณฑิต ก่อมณี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

- ๘ ม.ค. ๒๕๖๗

กฟอ.กำแพงแสน	รจก.(ท)	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ
เลขที่รับ 118	รจก.(ข)	<input type="checkbox"/> ดำเนินการต่อไป
วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๗	นพท.	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
	นบพ.	<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
	ผรณ.	
	วศก.	
	ผผ.บพ.	
	รณ.บพ.	
	ผผ.บศ.	
	รณ.บศ.	
	รณ.บม.	
	รณ.บส.	
	รณ.บป.	
	จป.	
	ห้อง LAN	

(Signature)

(นายบัณฑิต ก่อมณี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

- ๘ ม.ค. ๒๕๖๗

ส่ง Scan แล้ว

วันที่.....
