



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.ต.สช.(กป.) ๒๙๒ ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายพิษพงษ์ ภาททอง

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.ต.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA7	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟปักเสาพาดสาย ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านวังจิก-บ้านคอดัน	DIS ชั่วคราว บ้านวังจิก	DIS ชั่วคราว บ้านคอดัน	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๓ เครื่อง ๑๑๑ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๘๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชส.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัยวัฒน์ อ่ำสกุล)

ผ.ก.บ.กฟส.สช. รักษาการแทน ผจก.กฟส.สช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ DBA7 จาก DIS ชั่วคราวบ้านวังจิก ถึง DIS ชั่วคราวบ้านคอดัน

ในวันที่ 29 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 704/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต ๒๗ ๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เทอดไทย จันทร์เพ็ญ

(นายศักดิ์ เทียงหงษ์
๖๐๓.5 ๓๓๖ ๖๖.๐๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สามชุก

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิ่ง แผ่น

แผนผังแบบ แผ่น

ผจก. (สถานี

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

SCAN ส่งแล้ว

วันที่ ๐๕ พ.ค. ๒๕๖๗

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บ้านวังจิก - บ้านคอตัน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 พ.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	พาดสายระบบ22เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน 704/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	16 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายพรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT	GND	สข.		R ลำพระยา
3	DBA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT	GND	สข.		R บ้านวังจิก
4	ย้ายโหลด DBA 7 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA 2						
5	DBA02S-13	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 หน้า บ.สยามโซล่า
6	DIS ชั่วคราว โล้น DBA7	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS ชั่วคราวบ้านคอตัน
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	DIS ชั่วคราว โล้น DBA7	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS ชั่วคราวหน้าวัดวังจิก
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
12	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
14	DBA02R-02	Nonreclosing, ALT	GND Normal		สข.		R ลำพระยา
15	DBA07R-01	Nonreclosing, ALT	GND Normal		สข.		R บ้านวังจิก
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
17	DBA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT	GND	สข.		R ลำพระยา
18	DBA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT	GND	สข.		R บ้านวังจิก
19	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
20	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	DIS ชั่วคราว โล้น DBA7	ปลด	สับ		สข.		DIS ชั่วคราวหน้าวัดวังจิก
23	ย้ายโหลด DBA 7 บางส่วนกลับจาก DBA 2						
24	DIS ชั่วคราว โล้น DBA7	ปลด	สับ		สข.		DIS ชั่วคราวบ้านคอตัน
25	DBA02S-13	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 หน้า บ.สยามโซล่า
26	DBA02R-02	Nonreclosing, ALT	GND Normal		สข.		R ลำพระยา
27	DBA07R-01	Nonreclosing, ALT	GND Normal		สข.		R บ้านวังจิก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ปฏิบัติงานพาดสายแรงสูงระบบจำหน่าย วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

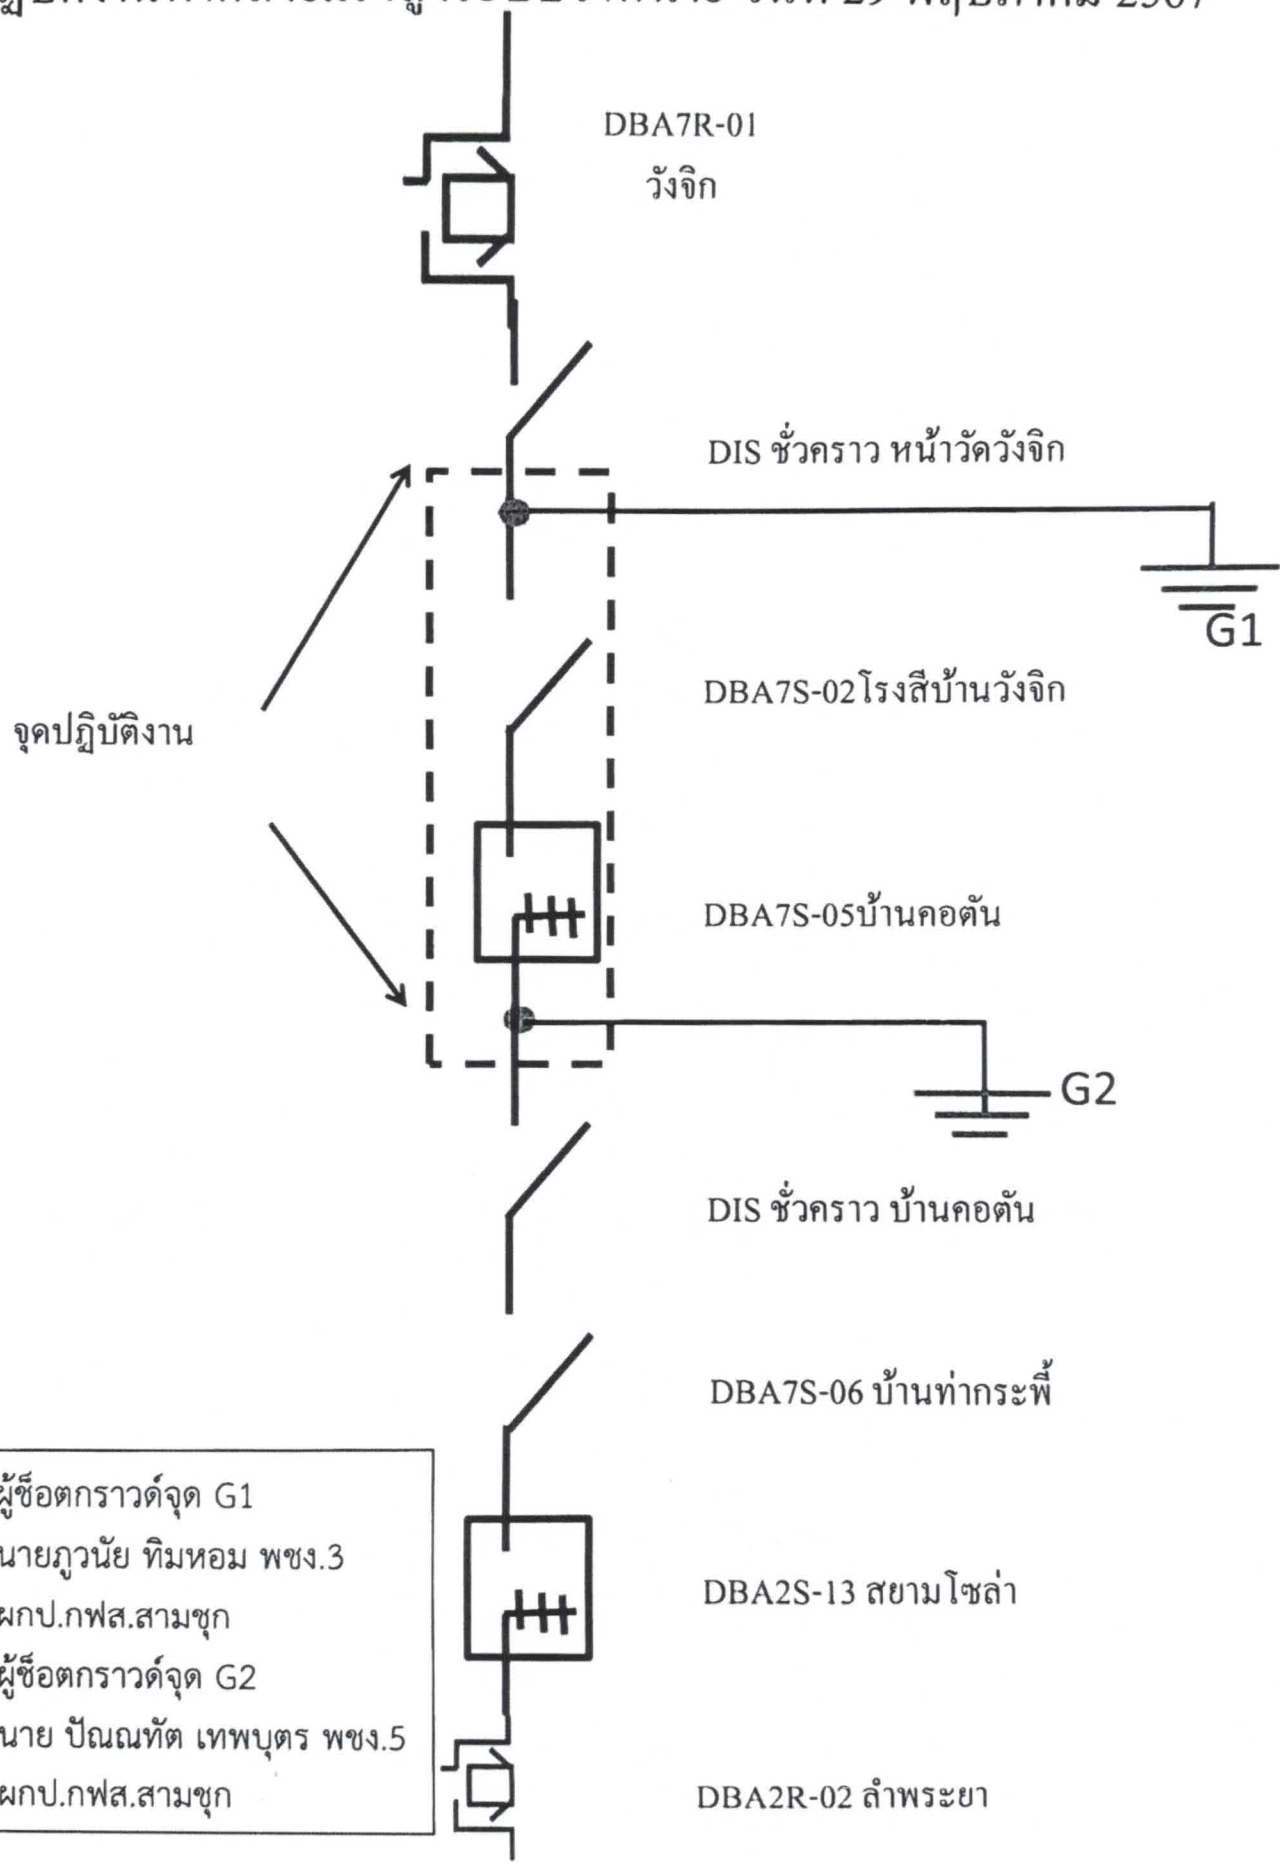

ผู้ซื้อตกราวด์จุด G1
 นายภูวนัย ทิมหอม พง.3
 ผกป.กฟส.สามชุก
 ผู้ซื้อตกราวด์จุด G2
 นาย ปิณณทัต เทพบุตร พง.5
 ผกป.กฟส.สามชุก
