



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 1 มิ.ย. 64

เลขที่ ก.๓ สข.(กบ.) ๗๒๗ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายพุดชงค์ กาทหลง

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย ฟีดเคอร์ ๓
สถานีไฟฟ้า เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๓	๐๕ มิ.ย. ๖๔ 6 มิ.ย.	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟเปลี่ยนสายแรงสูง บริเวณร้านค้าตรงชัยถึงอรัญ คอนกรีต	DBA03S-05 ดำรงชัย	ดิสชั่วคราว อรัญคอนกรีต	นายรินทร์ คำภีภา ๐๙๒-๒๔๘๔๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๗ เครื่อง ๑๕๐๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๖๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวานิช ไพจิตต์ ตำแหน่ง พชง ๗ โทร ๐๘๙ - ๒๑๘๔๔๔๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

พุดชงค์

(นายพุดชงค์ กาทหลง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเคอร์ DBA03 จาก DBA3S-05 ถึง ดิสชั่วคราวอรัญคอนกรีต
ในวันที่ 6 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 711/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มิเชล ของธิต ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวานิช ไพจิตต์

(นายวานิช ไพจิตต์)
๐๙๒.๕ ๓๓๓ น.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.อ.สข., กฟส.๑, กฟส.๒.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS DBA3S-05 (ตำรงชัยค้ำไม้) - DIS ชั่วคราว (อรัญคอนกรีต)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 มิ.ย. 64	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 711/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชนช ทอญย้อย		วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โชนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	DBA03VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA	-	-
4	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA R	หน้าราชมงคล
5	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	-
6	SPC03VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPC	-	-
7	SPC05VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPC	-	-
8	**ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปรับไฟจาก SPC03**						
9	DBA02S-08	ปลด	สับ		สช.	SCADA SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
10	DBA03S-07	ปลด	สับ		สช.	SCADA SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
11	DIS ชั่วคราว วงจร DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	อรัญคอนกรีต
12	DBA02S-08	สับ	ปลด		สช.	SCADA SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
13	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.						
14	DBA03S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	ตำรงชัยค้ำไม้
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
17	แจ้ง กฟส.สช.ปฏิบัติงานได้						
18	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
19	DBA03VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA	-	-
20	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA R	หน้าราชมงคล
21	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	-
22	SPC03VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPC	-	-
23	SPC05VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPC	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	เมื่อ กฟส.สช.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
25	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	DBA03VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		-	-
27	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
28	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-	-
29	SPC03VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPC		-	-
30	SPC05VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPC		-	-
31	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
32	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
33	DBA03S-05	ปลด	สับ		สช.		DIS	ตำรงชัยค้ำไม้
34	**ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนกลับคืนจาก SPC03**							
35	DBA02S-08	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
36	DIS ชั่วคราว วงจร DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS	อรัญคอนกรีต
37	DBA02S-08	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
38	DBA03S-07	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
39	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
40	DBA03VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		-	-
41	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
42	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	-
43	SPC03VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPC		-	-
44	SPC05VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPC		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

ปรับปรุงเบ็ดเตล็ดสายแรงสูงระบบจำหน่าย วันที่ 4 มิถุนายน 2564

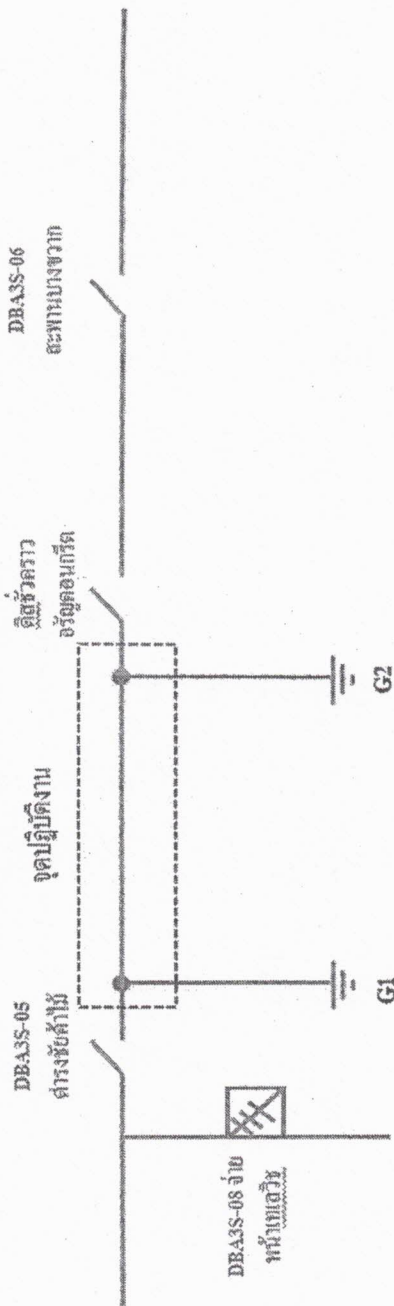

G1 วัดไฟช็อตกราวด์ โดยชุดแก๊สไฟ นายวาทิช ไพจิตร ควบคุมงาน

G2 วัดไฟช็อตกราวด์ โดยชุดซ่อมย่อย นายอรรถพงษ์ เข้มเนตร ควบคุมงาน

