



Switching Deadline

30 พ.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปน). 514/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 20 พ.ค. 2567

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนและแก้ไขเฟิร์มฟอร์มชำรุดวงจร DBA03 สฟพ.เดิมบางนางบวช ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA 03	4 มี.ย. 67	09.00 น.	12.00 น.	แก้ไขจุดร้อน DIS RISER POLE DBA03S-01 หน้า สฟพ.ดบ., DIS DBA03S-02 บางแอก และแก้ไขเฟิร์มฟอร์มชำรุด โดยชุดฮอทไลน์ สุพรรณบุรี และชุดฮอทไลน์ เดิมบาง	DBA03S-01	DBA03S-02	นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา 080-8476904

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ชผ.ปน โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA03 จาก DBA03S-01 ถึง DBA03S-02

ในวันที่ 4 มี.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 730/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ ~~ห้วย~~ สุภัทรา วงศ์บุญลก ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทามทวิกรม ศรีศักดิ์ดา

นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญลก

จตภ. 4 แทน ทบ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กน. ....

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1 ..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 ..... แผ่น

ผจพ. .... (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis Pot Head DBA0310S-01 และ DBA03S-02		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 มิ.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ตบ.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน DMA03S-01, DBA03S-02 ตามใบขอปฏิบัติงาน 730/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภักษา วงศ์บุญมาก		วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดณ์, นายวิวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, วรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 5.4 MW
5	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 3.14 MW
6	DBA05R-01	Normal	Nonreclosing +AL		DBA	R	ทำพิน
7	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing +AL		DBA	R	ประตูคูลองขอม
8	ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA05						
9	DBA04S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ตบ.		SF6 โรงสีบ้านทิง
10	DBA04R-01	สับ	ปลด		ตบ.	SCADA	R ประตูคูลองขอม
11	ย้ายโหลด DBA03 ไปรับไฟจาก DBA04						
12	DBA03S-04	ปลด	สับ		ตบ.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
13	DBA03VB-01	สับ	ปลด		DBA		เบรกเกอร์ 22 เควี
14	DBA03S-01	สับ	ปลด		ตบ.		DIS Pot Head F.3
15	เมื่อพร้อมดับไฟ						
16	DBA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตบ.		DIS บางแอก
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.ตบ. รับทราบ						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ตบ ทำการ Test ไฟ ลงข้อมูลใน WeSafe						
19	เมื่อ กฟอ.ตบ. ทำการลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
20	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
21	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
22	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
23	DBA05R-01	Nonreclosing	Normal		DBA	R	ทำพิน
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
25	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตซ์						
26	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
27	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
28	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
29	DBA05R-01	Normal	Nonreclosing +AL		DBA	R	ทำพิน
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	DBA03S-02	ปลด	ล๊ับ		ดบ.		DIS บางแอก
32	ย้ายโหลด DBA03 กลับจาก DBA04						
33	DBA03S-01	ปลด	ล๊ับ		ดบ.		DIS Pot Head F.3
34	DBA03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		DBA		เบรกเกอร์ 22 เควี
35	DBA03S-04	ล๊ับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
36	ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนกลับไฟจาก DBA05						
37	DBA04R-01	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing		ดบ.	SCADA	R ประตูคองขอม
38	DBA04S-11	ล๊ับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 โรงสีบ้านทิง
39	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
40	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
41	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
42	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		Load = 3.14 MW
43	DBA05R-01	Nonreclosing	Normal		DBA	R	ทำพิน
44	DBA04R-01	Nonreclosing	Normal		DBA	R	ประตูคองขอม
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>							

แผนผัง Single line แสดงพื้นที่รับไฟ เพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนวงจร DBA03 สฟฟ.ตบ.  
วงจร DBA03 บริเวณ DIS RISER POLE DBA3S-01 หน้า สฟฟ.ตบ. ถึง DIS DBA3S-02 บ้านบางแค

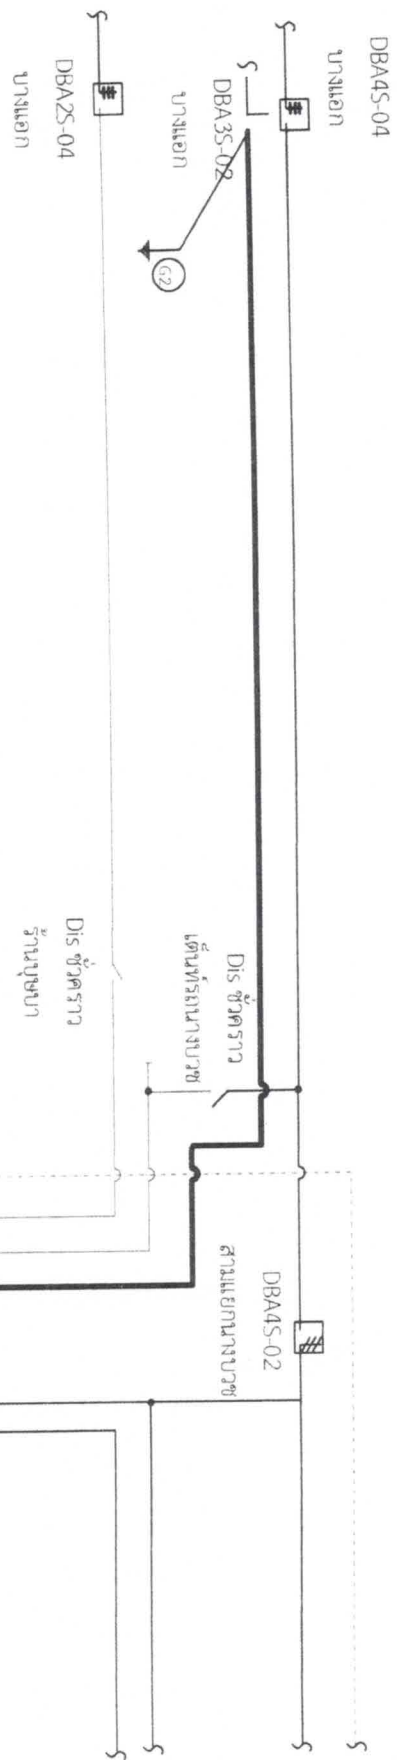

### สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

*Don't*

1. วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนและเปลี่ยนพร็องรุ่มชำรุด

หมายเลขตู้ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

