



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๑๓.๑๒๖ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ นายปรีชา สมัยนิยม

โทรสารขอตัดไฟ

แผนงานด่วน

Switching Deadline

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 23 พ.ค. 67

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ท.ผ.บ.ค. รักษาการแทน ผ.จ.ก.ภ.ส.ด.ม.ช.

ด้วย กฟส.ด่านมะขามเตี้ย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขสายแรงสูงตกถูกด้วย จำนวน ๑๔ จุด วงจร DMA๐๓ ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า สฟพ.ด.ม.ช. ถึง สฟพ.ก.จ.๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานีฯ	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน	
๑	115 kV สฟพ.ด.ม.ช.	๒๔ พ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐	แก้ไขสายแรงสูงตกถูกด้วย จำนวน ๑๔ จุด	สฟพ.ด.ม.ช.	สฟพ.ก.จ.๔	นายประสาน ฯ โทร ๐๘-๔๑๕๕-๕๕๑๒		
๒	DMA01 สฟพ.ด.ม.ช.							DMA01S-01 สฟพ.ด.ม.ช.	DMA01S-03 บ้านยุติธรรม
๓	DMA03 สฟพ.ด.ม.ช.							DMA03S-01 สฟพ.ด.ม.ช.	DMA01S-09 ยางเกาะ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สามแยกยางเกาะ ถึง สี่แยกถั่วทราย ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป.ภ.ส.อ.ด.ม.ช. โทร. ๐๓๔-๖๓๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายปรีชา สมัยนิยม)

ตำแหน่ง ท.ผ.บ.ค. รักษาการแทน ผ.จ.ก.ภ.ส.ด.ม.ช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ 115 kV จาก สฟพ.ด.ม.ช. ถึง สฟพ.ก.จ.๔
ในวันที่ 24 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 738/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเดอร์ DMA1 จาก DMA1S-01 ถึง DMA1S-03
ในวันที่ 24 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 738/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พีดเดอร์ DMA3 จาก DMA3S-01 ถึง DMA1S-09
ในวันที่ 24 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 738/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.บ.ร. โภกพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประสาน ประสพผล

22 พ.ค. 67


(นายปรีชา สมัยนิยม)
จัดให้ปฏิบัติงานตามแผน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. อภข.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี DMA, KCE)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ ตำบลมะขามเตี้ย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 พ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมช.	งานที่ทำ	แก้ไขสายแรงสูงตกจากลูกถ้วย (19 จุด)		ตามใบขอปฏิบัติงาน 738/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่	22 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่		22 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
3	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	DMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	-
5	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	-
6	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมช.	R	ตลาดตำบลมะขามเตี้ย
7	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE	-	-
8	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE	-	-
9	ระบบ 115 เควี						
10	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว) ไปจ่ายจาก DMA02						
11	DMA02S-11	ปลด	สับ		ดมช.	SCADA	SF6 หนองโสน
12	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE	-	INCOMING 1
13	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE	-	ใบมีด 115 เควี
15	ดับไฟสายส่ง 115 เควี เวลา 08.30 น.						
16	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
18	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
19	ระบบ 22 เควี						
20	ย้ายโหลด DMA01 ไปจ่ายจาก DMA02						
21	DMA01S-06	ปลด	สับ		ดมช.	SCADA	SF6 หน้า รร.ตำบลมะขามเตี้ย
22	DMA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมช.	SF6	ปากทางบ้านยุติธรรม
23	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
24	DMA01VB-01	สับ	ปลด		DMA	-	-
25	DMA01S-01	สับ	ปลด		ดมช.	DIS	POT HEAD F.1
26	DMA03S-01	สับ	ปลด		ดมช.	DIS	POT HEAD F.3
27	DMA01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมช.	SF6	บ้านยางเกาะ
28	แจ้งพื้นที่เฟดดับให้ กฟส.ดมช. รับทราบตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยแล้ว						
29	แจ้ง กฟส.ดมช. ลงข้อมูลในระบบ WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
30	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	-
31	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	-
32	DMA02R-02	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดมช.	R	ตลาดตำบลมะขามเตี้ย
33	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
34	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดกลับ						
35	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
36	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	-
37	DMA02R-02	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดมข.	R	ตลาดด้านมะขามเตี้ย
38	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE	-	-
39	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
40	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
41	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE	-	ใบมีด 115 เควี
42	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
43	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
44	DMA04YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
45	ย้ายโหนดสถานีฯ กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว) กลับจาก DMA02						
46	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
47	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE	-	INCOMING 1
48	DMA02S-11	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6 หนองโสน
49	ระบบ 22 เควี						
50	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ เวลา 12.00 น.						
51	DMA01S-01	ปลด	สับ		ดมข.	DIS	POT HEAD F.1
52	DMA03S-01	ปลด	สับ		ดมข.	DIS	POT HEAD F.3
53	DMA01S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดมข.	SF6	บ้านยางเกาะ
54	DMA01VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		DMA	-	-
55	ย้ายโหนด DMA01 กลับจาก DMA02						
56	DMA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดมข.	SF6	ปากทางบ้านยุติธรรม
57	DMA01S-06	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6 หน้า รร.ด้านมะขามเตี้ย
58	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	-
59	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
60	DMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	-
61	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	-
62	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.	R	ตลาดด้านมะขามเตี้ย
63	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE	-	-
64	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ผังดับไฟทำงาน ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี

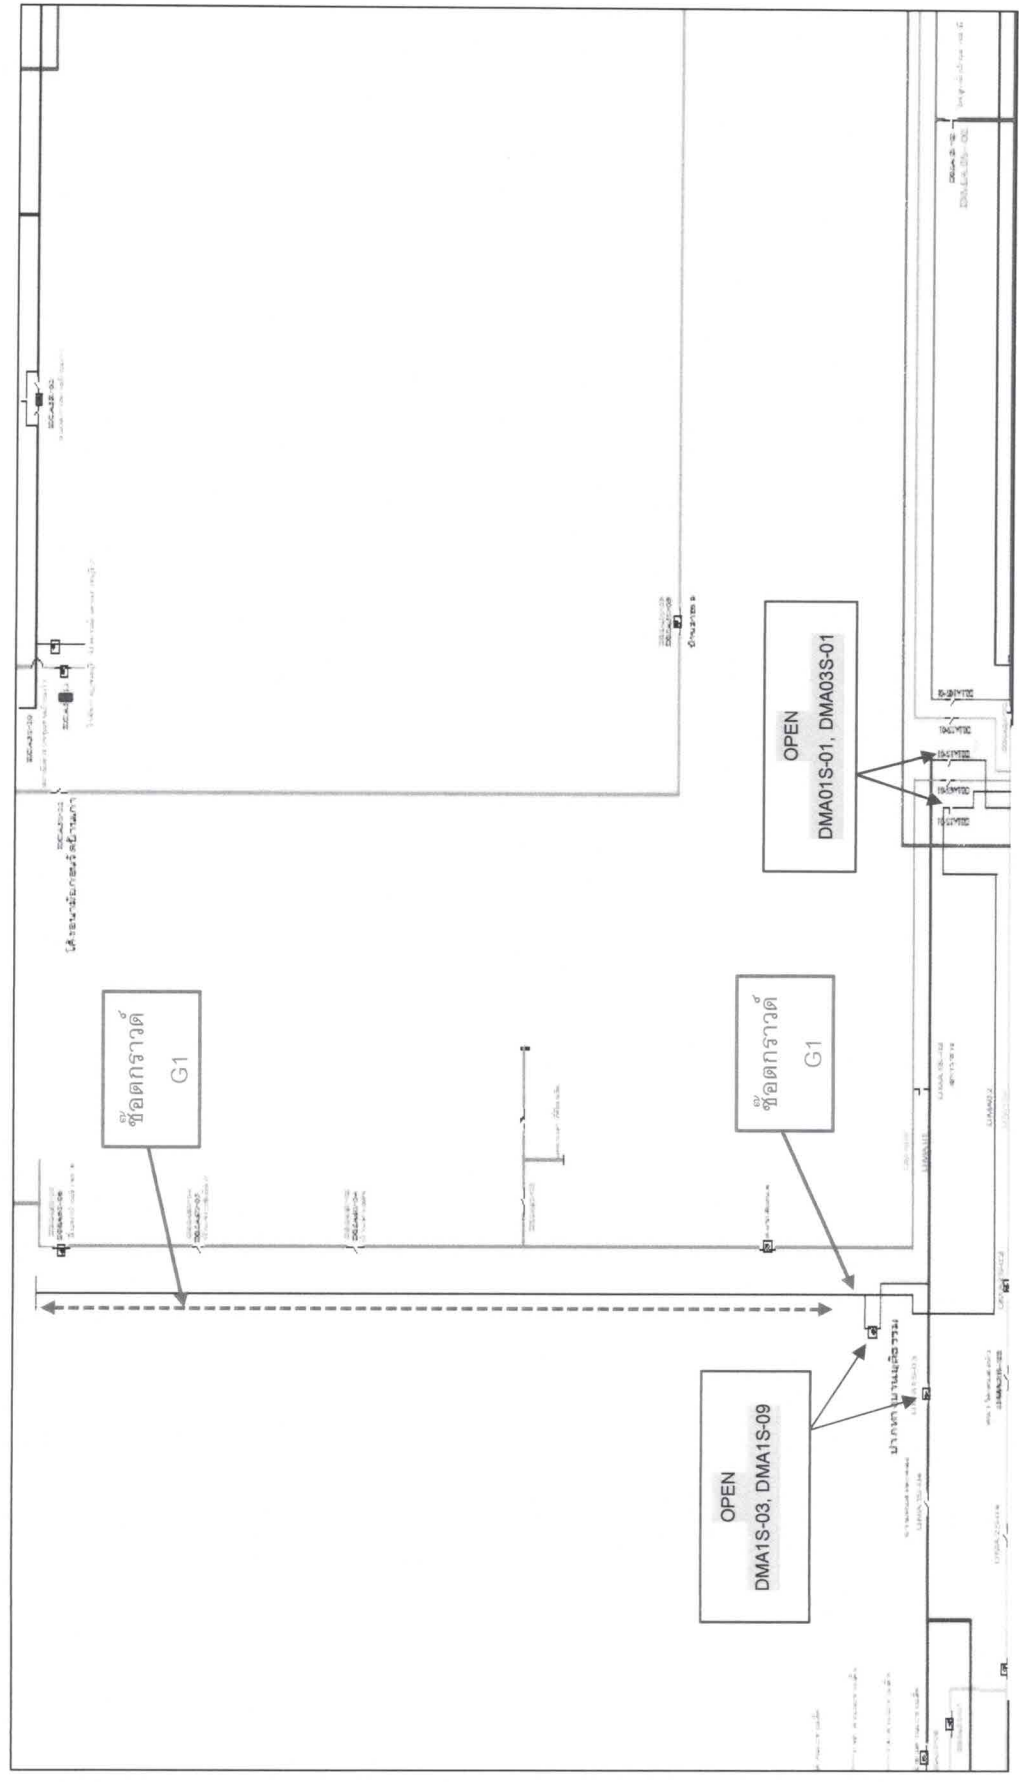
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗



หมายเหตุ : แก้ไขสายตกถูกถ้วยวงจร DMA๐๓ จำนวน ๑๙ จุด ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี

ผังดับไฟทำงาน ๒๒ เควี DMA๐๑ DMA๐๓ สฟฟ.ตมช.

วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗



หมายเหตุ : แกะไขสายตลุกถ่วงจร DMA๐๓ จำนวน ๑๙ จุด ได้เส้นสายส่ง ๑๕ เควี
พื้นที่ปฏิบัติงาน : ←-----→
