

Switching Deadline

29 พ.ค. 67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

01633

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สท.ร.(ปบ.)
ชื่อผู้รับ นายพิชานันท์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ดันยัตเส็ง

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดไฟพาดสายเพิ่มวงจร ๒๒KV ช่วงคลองบางยาง-คลองฉาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงาน/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|--|------------------------|---------------------|------------------------------|
| ๑ | OYL4YS | ๑ มิ.ย.๖๗ | ๐๘.๓๐ | ๑๗.๐๐ | ตัดไฟพาดสายเพิ่มวงจร ๒๒KV ช่วงคลองบางยาง-คลองฉาง | OYM4YB | OYL4YS-๐๖ | นายพนตล ปักษาทอง ๐๘๘-๙๔๐๒๖๕๙ |
| ๒ | OYMo๒ | ๑ มิ.ย.๖๗ | | | | -disชั่วคราวคลองบางยาง | -disชั่วคราวคลองฉาง | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....จ.โรจิง-ดอนหวาย มิ่งมน้ำต้งตคลองบางยาง-คลองฉาง และใน.ช.โรจิง๓๔ บางส่วน.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ยุทธิภูมิ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๑๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ดันยัตเส็ง)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเดอร์ MTS12V จาก OYM4YB-06 ถึง OYL4YS-06
ในวันที่ ๑ มิ.ย.๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 740/2567
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเดอร์ OYMo๒ จาก ผจก.กฟส. ถึง คลองคลอง
ในวันที่ ๑ มิ.ย.๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 740/๒๕๖๗
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย สักดิ์สิทธิ์ เจริญผลอดาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟส.สามพราน

ร.จก.๔ แทน ท.ผ.กฟ.
(นางสาวรุ้งกมล วรรณพิทักษ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟท.๓
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิตซ์ ๕ แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------------|--|-----------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณคลองบางยาง - คลองฉาง (OYM02) | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 1 มิ.ย. 67 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 17.00 น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กพร.สพร. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย OYM02 | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 740/2567 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | | วันที่ | 22 พฤษภาคม 2567 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 22 พฤษภาคม 2567 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 22 พฤษภาคม 2567 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | | 1. จรวัฒน์, วัฒนา, พิชา, วีรวัชร, อมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นครินทร์, พิชา, ณัฐกาญจน์, สุธี, สามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรณพงษ์, มโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |


| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-----------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | OYM-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | OYM | | TP1 - |
| 3 | OYM-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | OYM | | TP2 - |
| 4 | OYM02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | OYM | | CB - |
| 5 | OYM06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | OYM | | CB - |
| 6 | OYM04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | OYM | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 7 | OYL04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | OYL | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 8 | - ย้ายโหลด OYM02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก OYM06 | | | | | | |
| 9 | SAU04S-03 | ปลด | สับ | | สพร. | SCADA | SF6 ร้านข้าวมันไก่ |
| 10 | OYMBVB-01 | ปลด | สับ | | OYM | | CB ขนานบัส |
| 11 | DIS ชค. OYM02 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สพร. | | DIS คลองบางยาง |
| 12 | OYMBVB-01 | สับ | ปลด | | OYM | | CB ขนานบัส |
| 13 | ตรวจสอบสถานะสายส่ง 115 เควี Close Loop สถานีฯ NCA01,05YB-01 ปกติ | | | | | | |
| 14 | Open Loop สายส่ง 115 เควี ที่สถานีฯ OYM | | | | | | |
| 15 | OYM04YB-01 | สับ | ปลด | | OYM | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 16 | OYM04YS-01 | สับ | ปลด | | OYM | | DIS ใบมิด 115 เควี |
| 17 | OYM04YS-03 | สับ | ปลด | | OYM | | DIS ใบมิด 115 เควี |
| 18 | - เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 19 | DIS ชค. OYM02 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สพร. | | DIS คลองฉาง |
| 20 | OYL04YS-06 | สับ | ปลด, ล็อกกุญแจ | | สพร. | | Z ช.ไร่ชิง 30 |
| 21 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | |
| 22 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 23 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 24 | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe | | | | | | |
| 25 | OYM-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | OYM | | TP1 - |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|-----------------------|
| 26 | OYM-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | OYM | | TP2 - |
| 27 | OYM02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | OYM | | CB - |
| 28 | OYM06VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | OYM | | CB - |
| 29 | OYL04YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | OYL | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 30 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย | | | | | | |
| 31 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 32 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 33 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 34 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 35 | OYM-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | OYM | | TP1 - |
| 36 | OYM-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | OYM | | TP2 - |
| 37 | OYM02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | OYM | | CB - |
| 38 | OYM06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | OYM | | CB - |
| 39 | OYL04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | OYL | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 40 | - เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 41 | DIS ชค. OYM02 | ปลด | สับ | | สพร. | | DIS คลองฉาง |
| 42 | OYL04YS-06 | ปลด, ล็อคกุญแจ | สับ | | สพร. | | Z ช.โรจิง 30 |
| 43 | - ย้ายโหลด OYM02 บางส่วน กลับจาก OYM06 | | | | | | |
| 44 | OYMBVB-01 | ปลด | สับ | | OYM | | CB ขนานบัส |
| 45 | DIS ชค. OYM02 | ปลด | สับ | | สพร. | | DIS คลองบางยาง |
| 46 | SAU04S-03 | สับ | ปลด | | สพร. | SCADA | SF6 รั้น้ำมันไก่ |
| 47 | OYMBVB-01 | สับ | ปลด | | OYM | | CB ขนานบัส |
| 48 | Close Loop สายส่ง 115 เควี ที่สถานีฯ OYM | | | | | | |
| 49 | OYM04YS-01 | ปลด | สับ | | OYM | | DIS ใบมิต 115 เควี |
| 50 | OYM04YS-03 | ปลด | สับ | | OYM | | DIS ใบมิต 115 เควี |
| 51 | OYM04YB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | OYM | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 52 | สายส่ง 115 เควี Close Loop สถานีฯ NCA01,05YB-01 ปกติ | | | | | | |
| 53 | OYM-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | OYM | | TP1 - |
| 54 | OYM-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | OYM | | TP2 - |
| 55 | OYM02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | OYM | | CB - |
| 56 | OYM06VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | OYM | | CB - |
| 57 | OYM04YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | OYM | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 58 | OYL04YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | OYL | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |

งานดับไฟวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 พาดสายเพิ่มวงจร 22KV
 ถ.โรจิง - ดอนห้วย ช่วงคลองบางยาง-คลองฉาง

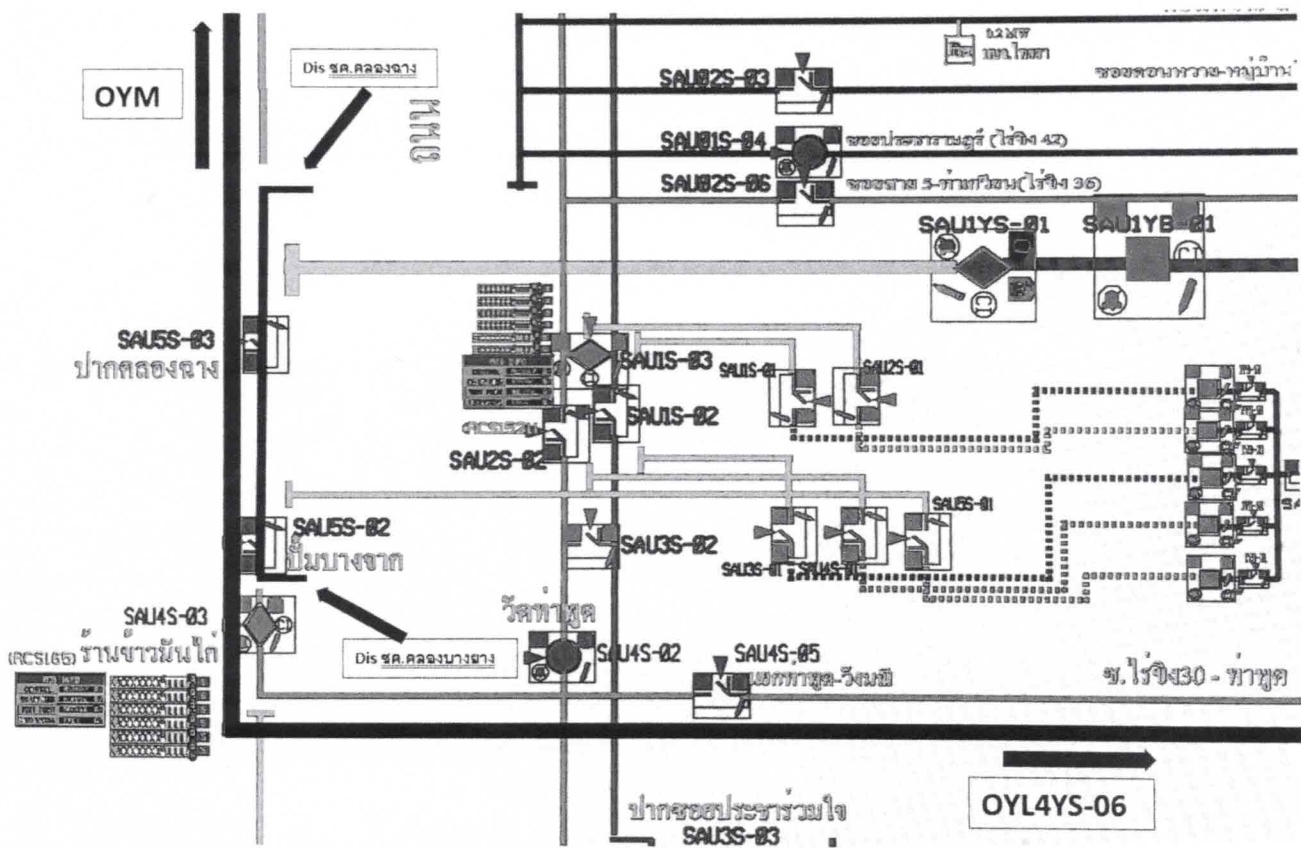

งานดับไฟวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 พาดสายเพิ่มวงจร 22KV
 ถ.โรจชิง - ดอนหวาย ช่วงคลองบางยาง-คลองฉาง(ก่อนท่า)

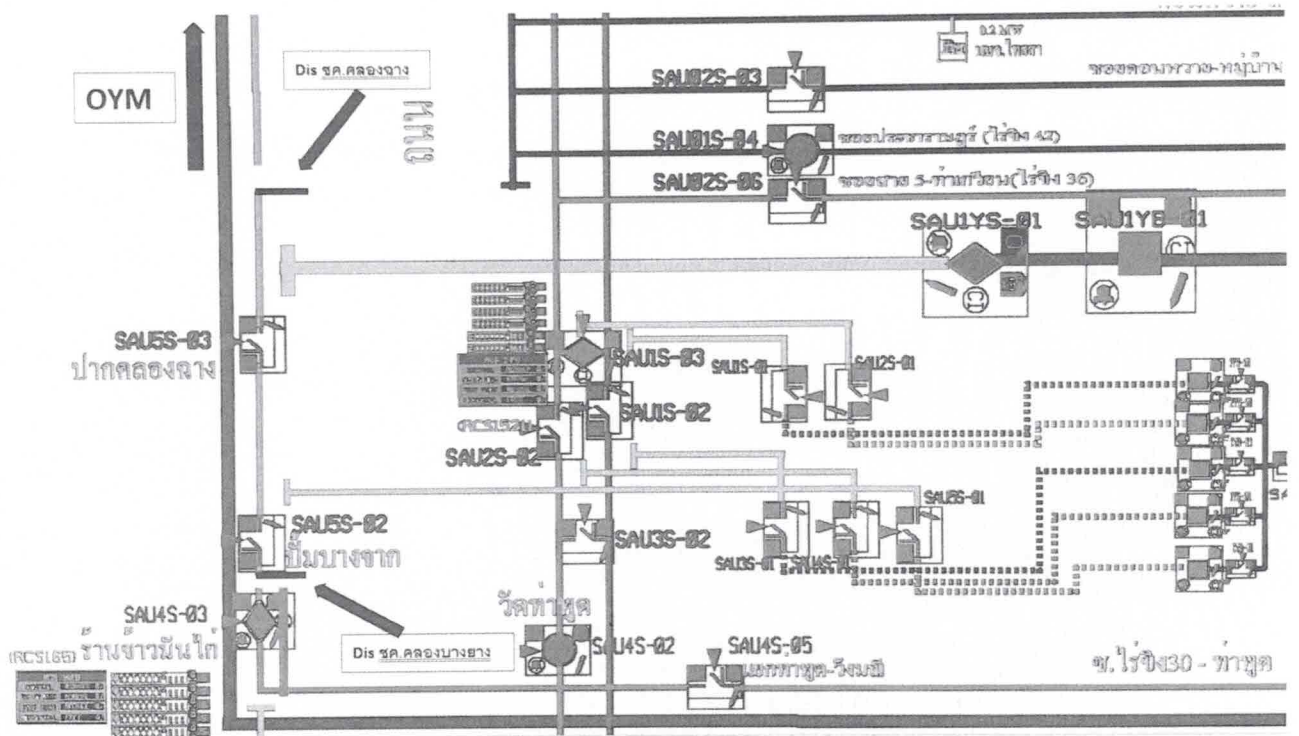

งานดับไฟวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 พาดสายเพิ่มวงจร 22KV
 ถ.ไร่ซิง - ดอนหวาย ช่วงคลองบางยาง-คลองนาง(หลังท่า)

