



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 มิ.ย. 67

เลขที่ ก.๓ บล.(ปบ.) ๑๐๑๗ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หึงสุวรรณ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูงเปลือย เป็น สายหุ้ม ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่<br>เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/<br>บริเวณ        | จาก      | ถึง                  | ผู้ควบคุมงาน                                    |
|-----|----------|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------|----------|----------------------|---|
| 1.  | BEA5     | 8 มิ.ย.67    | 08.30 น.        | 16.30 น. | เปลี่ยนสายแรงสูง<br>เปลือยเป็นสายหุ้ม | BEA5S-17 | BEA5S-07<br>BEA5S-06 | นายสุรชัย ไทรเมือง<br>พงง.6 ผจก. กพอ.<br>บางเลน |
| ๒.  | BEA6     |              |                 |          |                                       |          | จุดปลดบักอาร์ม       |   |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) หมู่บ้านบุญทวีสุข KCFพลังงานสีเขียว

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ผ.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสดำรง ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสดำรง ๑.๒  ไม่มีโอกาสดำรง  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หึงสุวรรณ)  
ผจก.กฟส.บางเลน

**หมายเหตุ** ขอตัดไฟแบบแรงดัน เนื่องจากส่วนเกี่ยวข้องพร้อมในวันนี้

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์... 1 จาก BEA5S-17 ถึง BEA5S-06,07  
ในวันที่ 8 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 780/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์... 2 จาก จุดปลดบักอาร์ม ถึง BEA5S-06  
ในวันที่ 8 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย... ประสานงานขอตัดไฟกับ... ไทยงามศิลป์

(นายเอกชัย หึงสุวรรณ)  
๐๗.5 ททท นพ.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. บล.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



ขั้นตอนการสวิชชิง... 2 แผ่น  
แผนผังแนบ... 1 แผ่น  
ผจฟ. (สถานี...)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |  |          |                                    |        |                            |  |
|------------------------|--|----------|------------------------------------|--------|----------------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | บริเวณหมู่บ้านทวีสุข (BEA05,06)  |          |                                    |        |                            |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 8 มิ.ย. 67   | ระหว่าง  | 08.30 น.                           | ถึง    | 16.30 น.                   |  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟอ.บล.  | งานที่ทำ | เปลี่ยนสายแรงสูงเปลี่ยนเป็นสายหุ้ม |        | ตามใบขอปฏิบัติงาน 780/2567 |  |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดง   |          |                                    | วันที่ | 2 มิถุนายน 2567            |  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          |                                    | วันที่ | 2 มิถุนายน 2567            |  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |                                    | วันที่ | 2 มิถุนายน 2567            |  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายจรวัดณ์,นายวัดณา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายพิรภัทร,น.ส.สุภชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |                                    |        |                            |  |

| ที่                                   | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                               |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|--|
| 1                                     | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง   |                                      |                      |      |              |            |  |
| 2                                     | กฟส.บางเลน แจ้ง VSPP บ. KCF พลังงานสีเขียว หุดขนาน เรียบร้อย                                 |                                      |                      |      |              |            |  |
| 3                                     | BEA-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | BEA          |            | -                                      |
| 4                                     | BEA05VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | BEA          |            | Load 2.98 MW                           |
| 5                                     | BEA-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | BEA          |            | -                                      |
| 6                                     | BEA06VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | BEA          |            | -                                      |
| 7                                     | BEA10VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | BEA          |            | Load 2.99 MW                           |
| 8                                     | ย้ายโหลด BEA05 บางส่วนไปรับไฟจาก BEA10   |                                      |                      |      |              |            |  |
| 9                                     | BEABVB-01  | ปลด                                  | สับ                  |      | BEA          |            | - ขนานบัส                              |
| 10                                    | BEA05S-09  | ปลด                                  | สับ                  |      | บล.          |            | DIS แยกวัดลานคา                        |
| 11                                    | BEA05S-07  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | บล.          |            | DIS ไดนาสตัดกอล์ฟ                      |
| 12                                    | BEABVB-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | BEA          |            | - ขนานบัส                              |
| 13                                    | เมื่อพร้อมดับไฟ  |                                      |                      |      |              |            |  |
| 14                                    | BEA05S-17  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | บล.          |            | DIS ตรงข้ามบีม ESSo                    |
| 15                                    | Dis.ไลน์ BEA05   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | บล.          |            | DIS ชั่วคราว ปากทาง KCF พลังงานสีเขียว |
| 16                                    | ตรวจสอบ SF6 รหัส BEA05S-06 (บ้านบุญทวีสุข) สถานะ Open พร้อมให้ ล็อคคาน                       |                                      |                      |      |              |            |  |
| 17                                    | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด DDE วงจร BEA06 บริเวณต้นบักอาร์มข้ามถนน (ตามแผนผัง) ออก |                                      |                      |      |              |            |  |
| 18                                    | หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE วงจร BEA06 บริเวณต้นบักอาร์มข้ามถนน (ตามแผนผัง) ออก เรียบร้อย   |                                      |                      |      |              |            |  |
| 19                                    | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ  |                                      |                      |      |              |            |  |
| 20                                    | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1   |                                      |                      |      |              |            |  |
| 21                                    | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2   |                                      |                      |      |              |            |  |
| 22                                    | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3   |                                      |                      |      |              |            |  |
| 23                                    | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G4   |                                      |                      |      |              |            |  |
| 24                                    | หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว  |                                      |                      |      |              |            |  |
| 25                                    | BEA-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | BEA          |            | -                                      |
| 26                                    | BEA05VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | BEA          |            | -                                      |
| 27                                    | BEA-TP2  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | BEA          |            | -                                      |
| 28                                    | BEA06VB-01   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | BEA          |            | -                                      |
| 29                                    | BEA10VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | BEA          |            | -                                      |
| 30                                    | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้   |                                      |                      |      |              |            |  |
| ***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***** |  |                                      |                      |      |              |            |  |

| ที่                                   | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                               |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|--|
| 31                                    | หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ   |                                      |                      |      |              |            |  |
| 32                                    | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1  |                                      |                      |      |              |            |  |
| 33                                    | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2  |                                      |                      |      |              |            |  |
| 34                                    | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G3  |                                      |                      |      |              |            |  |
| 35                                    | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G4  |                                      |                      |      |              |            |  |
| 36                                    | หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว        |                                      |                      |      |              |            |  |
| 37                                    | BEA-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | BEA          |            | -                                      |
| 38                                    | BEA05VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | BEA          |            | -                                      |
| 39                                    | BEA-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | BEA          |            | -                                      |
| 40                                    | BEA06VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | BEA          |            | -                                      |
| 41                                    | BEA10VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | BEA          |            | -                                      |
| 42                                    | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ   |                                      |                      |      |              |            |  |
| 43                                    | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการเชื่อม DDE วงจร BEA06 บริเวณต้นบ่ออาร์มข้ามถนน (ตามแผนผัง) เข้า |                                      |                      |      |              |            |  |
| 44                                    | หลังจาก Hotline ทำการเชื่อม DDE วงจร BEA06 บริเวณต้นบ่ออาร์มข้ามถนน (ตามแผนผัง) เข้า เรียบร้อย   |                                      |                      |      |              |            |  |
| 45                                    | BEA05S-17  | ปลด                                  | ล๊اب                 |      | บล.          |            | DIS ตรงข้ามบับม ESSo                   |
| 46                                    | กฟส.บางเลน แจ้ง VSPP บ.กฟ พลังงานสีเขียว พร้อมรับไฟ  |                                      |                      |      |              |            |  |
| 47                                    | Dis.ไลน์ BEA05   | ปลด                                  | ล๊اب                 |      | บล.          |            | DIS ชั่วคราว บากทาง KCF พลังงานสีเขียว |
| 48                                    | ย้ายโหลด BEA05 บางส่วนกลับจาก BEA10  |                                      |                      |      |              |            |  |
| 49                                    | BEABVB-01  | ปลด                                  | ล๊اب                 |      | BEA          |            | - ขนานบัส                              |
| 50                                    | BEA05S-07  | ปลด                                  | ล๊اب                 |      | บล.          |            | DIS ไดนาสติกอล์ฟ                       |
| 51                                    | BEA05S-09  | ล๊اب                                 | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | บล.          |            | DIS แยกวัดลานคา                        |
| 52                                    | BEABVB-01  | ล๊اب                                 | ปลด                  |      | BEA          |            | - ขนานบัส                              |
| 53                                    | กฟส.บางเลน แจ้ง VSPP บ.กฟ พลังงานสีเขียว ขนาน ได้  |                                      |                      |      |              |            |  |
| 54                                    | BEA-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | BEA          |            | -                                      |
| 55                                    | BEA05VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | BEA          |            | -                                      |
| 56                                    | BEA-TP2  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | BEA          |            | -                                      |
| 57                                    | BEA06VB-01   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | BEA          |            | -                                      |
| 58                                    | BEA10VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | BEA          |            | -                                      |
| ***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***** |  |                                      |                      |      |              |            |  |

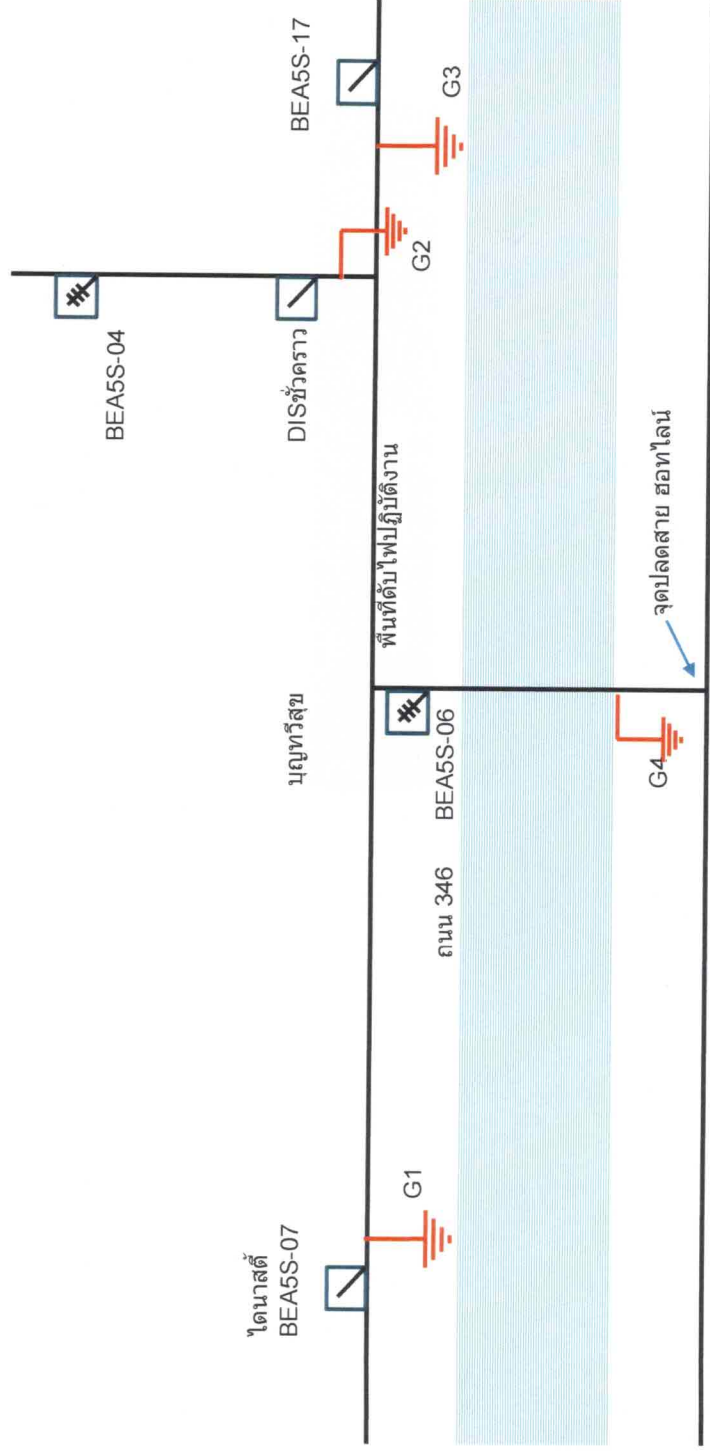

ผังดับไฟปฏิบัติงาน วันที่ 8 มิถุนายน 2567  
เปลี่ยนสายเปลือย เป็น สายหุ้ม
