



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
วันที่ 9 มิ.ย. 64

เลขที่ ก.๓ /๓๖๓  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์ตันธุ์  
ชื่อผู้ส่ง นายฉัตรทอง ไทสิทธิ์ทอง

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟท.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีคอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑ คจ.	12,13/06/64	08.00	17.00	รื้อถอนสายเปลือย 185 ต.มม. และ ทาดสาย SAC	DDEจุด A เลขทองบรีอ	SF6 DOA09S-07 ทองกุฎี	โทร.๐๙๐-๐๔๓๕๓๑๑๔
๒.	๑ คจ.	20/06/64	08.00	17.00	ขนาด 185 ต.มม.	DDEจุด B	SF6 DOA09S-07 ทองกุฎี	นายปรีชา ทองระย้า
๓.	๑ คจ.	27/06/64	08.00	17.00		DDEจุด B	DDEจุด C	

\*หมายเหตุ ขอตัดไฟ 115 เควี สถานีคอนเจดีย์ - สถานีคูทอง ในวันเวลาดังกล่าวด้วย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฉัตรทอง สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.จ.(สข.) โทร. ๐๘๑-๘๗๒๐๒๖๗  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉัตรทอง ไทสิทธิ์ทอง)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟท.สท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOA09 จาก DDEจุด A ถึง DOA9S-07  
ในวันที่ 12 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 789/64  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชุมนว ชาญชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ปรีชา ทองระย้า สุวรรณประทีป

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผคก. กฟภ.(สข.)  
อภ.บข.(ก.๓), อภ.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายฉัตรทอง ไทสิทธิ์ทอง)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟท.สท.

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผคฟ. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน เลยวัดหนองปรือ - บ้านหนองกุฎี
2. กำหนดวันที่ทำงาน 12,13/6/64 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟภ.สพ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย DOA09 ตามใบขอปฏิบัติงาน 789/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 7 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 7 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 7 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching ย้ายโหลดวัดที่ 12 มิ.ย.64						
2	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	Load 8.72 MW
3	DOA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA	-	Load 2 MW
4	DOA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA	-	Load 0.95 MW
5	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	Load 17.83 MW
6	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	Load 18.00 MW
7	UTG07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG	-	Load 3.00 MW
8	UTG02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R หนองไฉ่
9	- ย้ายโหลด DOA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก UTG02						
10	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG	-	ขนานบัส
11	DOA09S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 บ้านหนองกุฎี
12	UTG07S-09	ปลด	สับ		สตง.	SCADA	SF6 จุดแบ่งเขตบ้านสามเหลี่ยมฝั่งซ้าย
13	DIS ชด. DOA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เลยวัดหนองปรือ
14	UTG07S-09	สับ	ปลด		สตง.	SCADA	SF6 จุดแบ่งเขตบ้านสามเหลี่ยมฝั่งซ้าย
15	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG	-	ขนานบัส
16	แจ้งกฟภ.สพ.ให้ HL.22 KV ตัด DDEจุด A ตามผังแนบ ออกทั้ง 3 เฟสตั้งแต่ DIS เลยวัดหนองปรือ - จุดตัด DDE วงจร DOA09 ไม่มีโหลด						
17	หลังจาก HL.22 KV ตัด DDEจุด A ตามผังแนบ ออกทั้ง 3 เฟสเรียบร้อยแล้ว						
18	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	
19	DOA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA	-	
20	DOA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA	-	
21	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
22	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
23	UTG07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG	-	
24	UTG02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R หนองไฉ่
*** สิ้นสุด Switching วันที่ 12 มิ.ย.64 ***							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching ย้ายโหลดวัดที่ 13 มิ.ย.64						
2	UTG02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R หนองไฉ่
3	UTG02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG	-	
4	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
5	- ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ อุโมง รหัส UTG02YB-01 ให้โหลดเป็น 0 และ DOA 05YB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
6	DOA09S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.	SCADA	SF6	บ้านหนองกุฎี
7	UTG02YB-01	สับ	ปลด		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	UTG02YS-01	สับ	ปลด		UTG		-	ใบมิต 115 เควี
9	UTG02YS-02	สับ	ปลด		UTG		-	ใบมิต 115 เควี
10	DOA05YS-01	สับ	ปลด		DOA		-	ใบมิต 115 เควี
11	DOA05YS-02	สับ	ปลด		DOA		-	ใบมิต 115 เควี
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1(ระบบ 22 เควี)							
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2(ระบบ 22 เควี)							
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1(ระบบ 115 เควี)							
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2(ระบบ 115 เควี)							
17	UTG02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R	หนองไธสง
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***								
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
20	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1(ระบบ 22 เควี)							
21	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2(ระบบ 22 เควี)							
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1(ระบบ 115 เควี)							
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1(ระบบ 115 เควี)							
24	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-	-
25	DOA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-	-
26	DOA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-	-
27	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	-
28	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	-
29	UTG07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-	-
30	UTG02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R	หนองไธสง
31	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
32	DOA09S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.	SCADA	SF6	บ้านหนองกุฎี
33	UTG02YS-01	ปลด	สับ		UTG		-	ใบมิต 115 เควี
34	UTG02YS-02	ปลด	สับ		UTG		-	ใบมิต 115 เควี
35	DOA05YS-01	ปลด	สับ		DOA		-	ใบมิต 115 เควี
36	DOA05YS-02	ปลด	สับ		DOA		-	ใบมิต 115 เควี
37	UTG02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
38	แจ้งกฟพ.สพ.ให้ HL.22 KV จัม DDEจุด A ตามผังแนบ เข้าทั้ง 3 เฟสตั้งแต่ DIS เลยวัดหนองปรือ - จุดตัด DDE วงจร DOA09 ไม่มีโหลด							
39	หลังจาก HL.22 KV จัม DDEจุด A ตามผังแนบ เข้าทั้ง 3 เฟสเรียบร้อย							
40	- ย้ายโหลด DOA09 บางส่วนกลับจาก UTG02							
41	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		-	ขนานบัส
42	UTG07S-09	ปลด	สับ		สตง.		SF6	จุดแบ่งเขตบ้านสามเหลี่ยมฝั่งซ้าย
43	DIS ชค. DOA09	ปลด	สับ		สพ.		DIS	เลยวัดหนองปรือ
44	DOA09S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	บ้านหนองกุฎี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
45	UTG07S-09	สับ	ปลด		สดง.		SF6	จุดแบ่งเขตบ้านสามเหลี่ยมฝั่งซ้าย
46	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		-	ขนานบัส
47	UTG02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-	
48	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	-
49	DOA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-	-
50	DOA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-	-
51	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
52	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
53	UTG07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-	-
54	UTG02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R	หนองไถ่
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟภ. กฟจ. สท.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สท./รจก.กฟจ.สท.

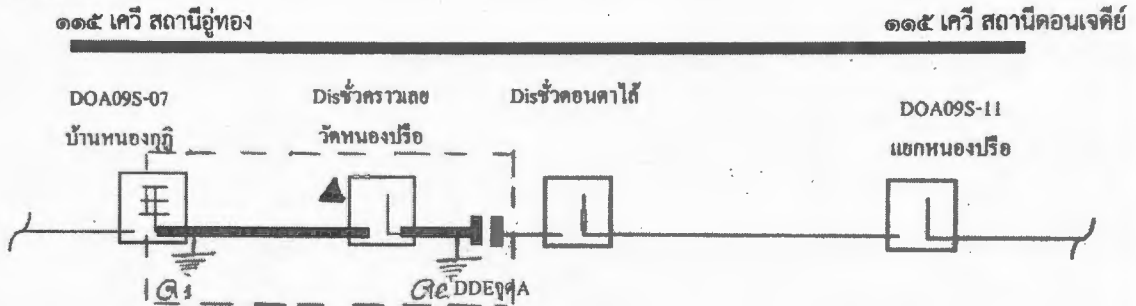
ถึง ผจก.กฟจ.สท.

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ด้วยในวันที่ 12, 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ...๒๕๖๔... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ .เลยวัดหนองปรือ - SF๖ DOA๐๙S-๐๗ .โดยมีรายละเอียดฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ..๙.. สถานีฯ ...คอนเจคต์... ตั้งแต่บริเวณ .เลยวัดหนองปรือ - SF๖ DOA๐๙S-๐๗ กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้.. นายปรีชา ทองระย้า ..พชง.กส.กฟจ.สท.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ... ๐๙๐-๑๔๓๕๑๑๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง หน.กส.กฟจ.สท..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.. ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงกลไกไลน์



ดับไฟระบบจำหน่าย ปรับปรุงระบบจำหน่ายF๙ คอนเจคต์ และขอดับไฟ ๑๕KV จากสถานีคอนเจคต์-สถานีอุทอง ในวันเวลาดังกล่าวด้วย

- ๑.ย้ายโหนดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหนดให้Hotlineสท.จะขอทำการตัดจุดA ในวันเสาร์ที่ ๑๒มิ.ย.๖๔
- ๓.วันที่๑๓มิ.ย.๖๔ ปลดSF๖ DOA๐๙S-๐๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐น.
- ๔.ตรวจสอบไฟดับ จุดที่มแก่ไฟฯ ซ็อคกราวด์ จุด๑ , จุด๒
- ๕.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)  
พชง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สท.

(นายฉลอง โพธิ์ทอง)  
รจก.(ท.)กฟจ.สท.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา  
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
