



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๓.....
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทอง.....
ชื่อผู้ส่ง นายฉลอง โพธิ์ทอง.....

Switching Deadline

วันที่ 17 มิ.ย. 64

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔.....
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓).....
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟล.สพ.....

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีคอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	9 คจ.	13/06/64	08.00	17.00	รีดถอนสายเปลือย185 ต.มม. และพาดสายSAC	DDEจุดA เลขทองบรีอ	SF6 DOA09S- 07 ทองกุฎี	โทร.๐๙๐-๑๔๓๕๑๑๔
๒.	9 คจ.	20/06/64	08.00	17.00	ขนาด 185 ต.มม.	DDEจุดB	SF6 DOA09S- 07 ทองกุฎี	นายปรีชา ทองระย้า
๓.	9 คจ.	27/06/64	08.00	17.00		DDEจุดB	DDEจุดC	

*หมายเหตุ ขอตัดไฟ 115 เควี สถานีคอนเจดีย์ - สถานีอุทอง ในวันเวลาดังกล่าวด้วย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฉนวนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พงษ.๖ (สข.) โทร. ๐๙๑-๘๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉลอง โพธิ์ทอง)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟล.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟล.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเคอร์ DOA09 จาก DDEจุด B ถึง DOA 9S-07
ในวันที่ 20 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 790/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย
ประสานงานการขอตัดไฟกับ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟล. ๒๓.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทอง)
๑๙ มิ.ย. ๖๔

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองงู - วัดหนองปรือ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มิ.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	790/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	16 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 2. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	UTG02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG	-	-
3	UTG02R-03	Normal	Nonreclosing		อทง.	R	R.บ้านหนองไธ้
4	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ตอนเจดีย์ รหัส DOA05YB-01 อยู่สถานะ ปลด						
5	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
6	DOA09S-07	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.	SF6	บ้านหนองงู
7	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ อู่ทอง รหัส UTG02YB-01 ให้ไหลดเป็น 0						
8	UTG02YB-01	ล๊ับ	ปลด		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	UTG02YS-01	ล๊ับ	ปลด		UTG	-	ใบมิต 115 เควี
10	UTG02YS-02	ล๊ับ	ปลด		UTG	-	ใบมิต 115 เควี
11	DOA05YS-01	ล๊ับ	ปลด		DOA	-	ใบมิต 115 เควี
12	DOA05YS-02	ล๊ับ	ปลด		DOA	-	ใบมิต 115 เควี
13	UTG02R-03	Nonreclosing	Normal		อทง.	R	R.บ้านหนองไธ้
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งกฟจ.สพ. ให้ Hotline 22 kV ตัด DDE จุด B (ตามผังแนบ) ออกทั้ง 3 เฟส แบบไม่มีไฟ						
16	หลัง Hotline 22 kV แจ้งกฟจ.สพ. ตัด DDE จุด B (ตามผังแนบ) ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
17	เมื่อพร้อมเชื่อม DDE จุด A						
18	DOA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA	-	-
19	แจ้งกฟจ.สพ. โหลดโหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง ระหว่าง DDE จุด A กับ DDE จุด B ออก						
20	หลังกฟจ.สพ. โหลดโหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง ระหว่าง DDE จุด A กับ DDE จุด B ออก แล้วเสร็จ						
21	แจ้งกฟจ.สพ. ให้ Hotline 22 kV เชื่อม DDE จุด A (ตามผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ (โดยวิธีฮอทไลน์)						
22	หลัง Hotline 22 kV แจ้งกฟจ.สพ. ตัด DDE จุด A (ตามผังแนบ) ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
23	DOA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA	-	-
24	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 (ระบบ 22 เควี)						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 (ระบบ 22 เควี)						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 (ระบบ 115 เควี)						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 (ระบบ 115 เควี)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	DOA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-	-
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***								
31	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
32	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1 (ระบบ 22 เควี)							
33	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2 (ระบบ 22 เควี)							
34	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1 (ระบบ 115 เควี)							
35	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2 (ระบบ 115 เควี)							
36	DOA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-	-
37	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
38	แจ้งกฟพ.สพ. ให้ Hotline 22 kV เชื่อม DDE จุด B (ตามผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส (ตั้งแต่ DOA09S-07 - DDE จุด B ไม่มีโหลด)							
39	หลัง Hotline 22 kV แจ้งกฟพ.สพ. เชื่อม DDE จุด B (ตามผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
40	UTG02YS-01	ปลด	สับ		UTG		-	ใบมิด 115 เควี
41	UTG02YS-02	ปลด	สับ		UTG		-	ใบมิด 115 เควี
42	DOA05YS-01	ปลด	สับ		DOA		-	ใบมิด 115 เควี
43	DOA05YS-02	ปลด	สับ		DOA		-	ใบมิด 115 เควี
44	UTG02YB-01	ปลด	สับคง "Off" Auto Reclose		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
45	แจ้งกฟพ.สพ. ให้ดำเนินการ <u>ปลดล๊อคคาน</u> SF6 รหัส DOA09S-07 บริเวณ บ้านหนองกุฎี							
46	DOA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-	-
47	UTG02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผอ.ผบ.กฟภ.สพ.

ถึง ผจก.กฟภ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

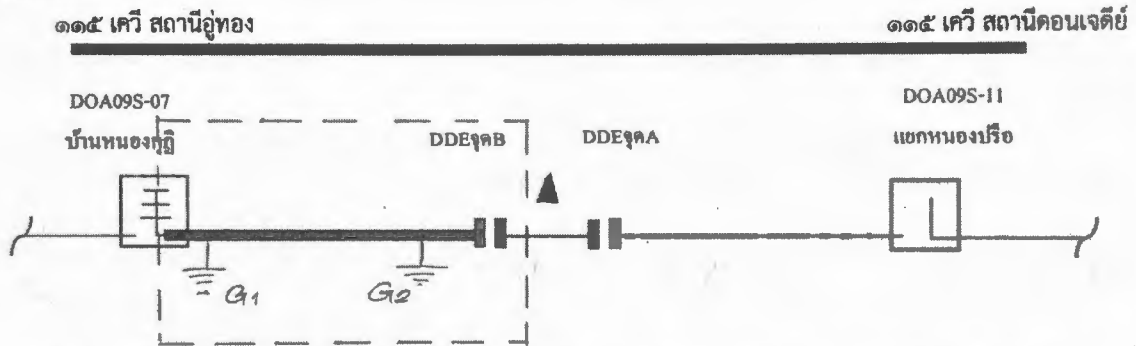
เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟภ.สพ./รจก.กฟภ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๐...เดือน..มิถุนายน...พ.ศ. ...๒๕๖๔... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟภ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ :DDEจุดB - SF๖ DOA๐๙S-๐๗ .โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์ ..๙.. สถานีฯ ...คอนเจตีย์... ตั้งแต่บริเวณ . DDEจุดB - SF๖ DOA๐๙S-๐๗
กฟภ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้.. นายปรีชา ทองระย้า ..พง.กส.กฟภ.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ... ๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง หน.กส.กฟภ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.. ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น



ดับไฟระบบจำหน่าย ปรับปรุงระบบจำหน่ายF๙ คอนเจตีย์ และขอดับไฟ ๑๕KV จากสถานีคอนเจตีย์-สถานีอุทอง ในวันเวลาดังกล่าวด้วย

- ๑.ย้ายโหลดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหลดให้HotLineสพ.จะขอทำการเชื่อมDDEจุดAและตัดเคดDDEจุดB ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐น.
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไข ข้อตกกรวด จุด๑ ,จุด๒
- ๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

Oh.
(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พง.๖(สข.) ผบ.กฟภ.สพ.

(นายฉลอง โพธิ์ทอง)
รจก.(ท.)กฟภ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐
