



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๓
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา
ชื่อผู้ส่ง นายฉลอง โพธิ์ทอง

Switching Deadline
วันที่ 23 มิถุนายน 64

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟภ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีคอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	9 คจ.	13/06/64	08.00	17.00	รื้อถอนสายเปลือย 185 ต.มม. และพาดสาย SAC	DDEจุดA เลขทองปรีอ	SF6 DOA09S-07 ทองกุฎี	โทร.๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔
๒.	9 คจ.	20/06/64	08.00	17.00	ขนาด 185 ต.มม.	DDEจุดB	SF6 DOA09S-07 ทองกุฎี	นายปรีชา ทองระย้า
๓.	9 คจ.	27/06/64	08.00	17.00		DDEจุดB	Dir.๑.อุทัย ทองกุฎี	

*หมายเหตุ ขอตัดไฟ 115 เควี สถานีคอนเจดีย์ - สถานีอุทอง ในวันเวลาดังกล่าวด้วย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฉนวนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พงษ.๒ (สข.) โทร. ๐๙๑-๘๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉลอง โพธิ์ทอง)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟภ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 3 พิดเคอร์ DDA จาก DDE ๑๑ B ถึง DDE ๑๑ C
ในวันที่ 27 มิถุนายน ๖๔ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 791/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อนันต์ อรรถพรพิพัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทนง ธนกุล สุทธิชัยรัตน์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ชั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DOA, UTG)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐7:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DOA09 และสายส่ง 115 kV บริเวณDDE.จุด B ถึง DIS.ชค.หนองกุฎี				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 มิ.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	รื้อถอนสายแรงสูง 185 เป็นสาย SAC		ตามใบขอปฏิบัติงาน	791/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	20 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายสถาพร,นายมงคล,นาคักดีสิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตติดต่อนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ DOA01YS-05 ABS.115 หน้าสถานีไฟฟ้าอุ้มทอง ให้เปิดวงจรโชว์ "OPEN"พร้อมล๊อคกุญแจ						
3	ตรวจสอบ DOA05YB-01 ให้ปลดโชว์ "OPEN"						
4	ตรวจสอบ DOA09S-07 SF6 บ้านหนองกุฎี ให้ปลดโชว์ "OFF" พร้อมล๊อคคานไว้						
5	UTG02YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		UTG		
6	DOA09VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		DOA		
7	UTG02R-03	Normal	Non-Reclosing		SCADA	RE	บ้านหนองไธ้
8	- ดับไฟไลน์ UTG02,DOA09 และสายส่ง 115 kV.เวลา 08.00 น.						
9	UTG02YB-01	สับ	ปลด		UTG		CB 115 KV.
10	UTG02YS-01	สับ	ปลด		UTG		ใบมิด 115 KV.
11	UTG02YS-02	สับ	ปลด		UTG		ใบมิด 115 KV.
12	DOA05YS-01	สับ	ปลด		DOA		ใบมิด 115 KV.
13	DOA05YS-02	สับ	ปลด		DOA		ใบมิด 115 KV.
14	DIS.ไลน์ UTG02	สับ	ปลด,ใช้โหดบาสเตอร์		รถสพ-		DIS หนองกุฎี
15	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการปลดโหดออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE.จุด B						
16	หลังจากกฟจ.สุพรรณบุรีทำการปลดโหดออกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย						
17	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE.จุด B ไลน์ DOA09 ได้						
18	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE.จุด B ไลน์ DOA09 เสร็จเรียบร้อย						
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.สุพรรณบุรีรับทราบ						
20	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการ Short Ground จุด G1						
22	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการ Short Ground จุด G2						
23	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
24	DOA09VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		DOA		
25	UTG02R-03	Non-Reclosing	Normal		SCADA		RE บ้านหนองไธ้
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
26	หลังจากกฟจ.สุพรรณบุรีปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
27	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
28	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
29	ตรวจสอบสวิตต์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตซ์						
30	ตรวจสอบ DOA09S-07 SF6 บ้านหนองกุฎี ให้ปลดโซล "OFF" พร้อมล๊อคคานไว้						
31	ตรวจสอบ DOA05YB-01 ให้ปลดโซล "OPEN"						
32	DOA09VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		DOA		
33	UTG02R-03	Normal	Non-Reclosing		SCADA		RE บ้านหนองไธ้
34	- จ่ายไฟไลน์ DOA09,UTG02 ปลดสายส่ง 115 kV.						
35	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจี้ม DDE.จุด B ไลน์ DOA09 ได้						
36	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจี้ม DDE.จุด B ไลน์ DOA09 เสร็จเรียบร้อย						
37	แจ้งกฟจ.สุพรรณบุรีทำการนำโหลดเข้าได้ทั้งหมด						
38	DIS.ไลน์ UTG02	ปลด	สับ		รถสฟ-		DIS หนองกุฎี
39	UTG02YS-01	ปลด	สับ		UTG		ใบมีด 115 kV.
40	UTG02YS-02	ปลด	สับ		UTG		ใบมีด 115 kV.
41	DOA05YS-01	ปลด	สับ		DOA		ใบมีด 115 kV.
42	DOA05YS-02	ปลด	สับ		DOA		ใบมีด 115 kV.
43	UTG02YB-01	ปลด	สับ,คงAuto Reclose"OFF"		UTG		CB 115 kV.
44	UTG02YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		UTG		
45	DOA09VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		DOA		
46	UTG02R-03	Non-Reclosing	Normal		SCADA		RE บ้านหนองไธ้
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ก.บ. ๖๗๖ กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-


วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๗...เดือน..มิถุนายน...พ.ศ. ...๒๕๖๔... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ .DDEจุดB - DDEจุดC .โดยมีรายละเอียดปิดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ปิดเคอร์ ..๙.. สถานีฯ ...คอนเจตีย์... ตั้งแต่บริเวณ . DDEจุดB - DDEจุดC

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้.. นายปรีชา ทองระย้า ..พขง.กส.กฟจ.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ... ๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิโกธ..ตำแหน่ง หน.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ... ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

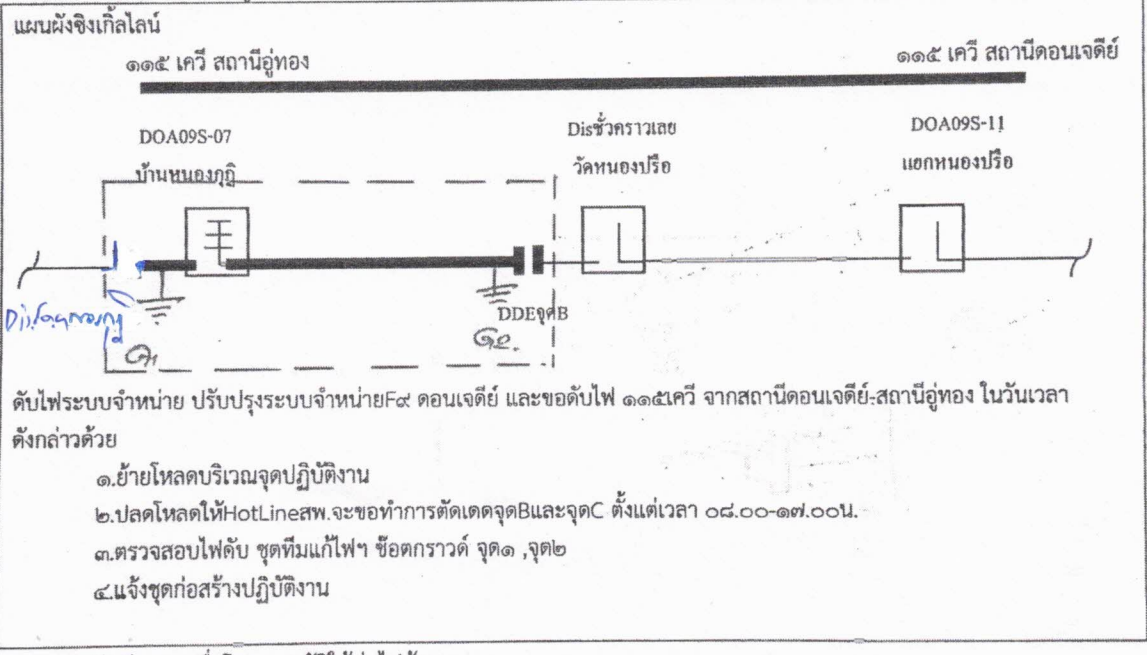

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พขง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

(นายฉลอง โพธิ์ทอง)
รจก.(ท.)กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
