

Switching Deadline
10 มิ.ย. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดช.(กบ.) ๖๖๖/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด่านช้าง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
F๘ ด่านช้าง	๑๔ มิ.ย. ๖๔	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อปิก เสาเข็มไลน์ บริเวณบ้านทุ่ง	DDE บ้านป่าเลา	ป่าขลุ่ย	นายอัสดา คงลัดดา โทร ๐๖๑-๙๙๖๙๙๓๙๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านทุ่ง,บ้านกกตาต,บ้านกกเชียง,บ้านห้วยตลาด,บ้านเขาตะเกียบทอง,บ้านหนอง,บ้านบ้านน้ำชี,

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัสดา คงลัดดา ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๖๑-๙๙๖๙๙๓๙๑ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน
มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กพท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA8 จาก DDE บ้านป่าเลา ถึง ป่าขลุ่ย
ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 795

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานผู้รับ 1 นาย อ.ว. โมกข์พันธ์ุ ประสานงานตรงต่อดับไฟกับ นายอัสดา คงลัดดา
๕ มิ.ย. ๖๔

กพท. อ.ก.ปบ. อ.ว.
(วงศ์ 7 แทน ผ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ. (คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. อ.๕.

อ.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน



ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลาน. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

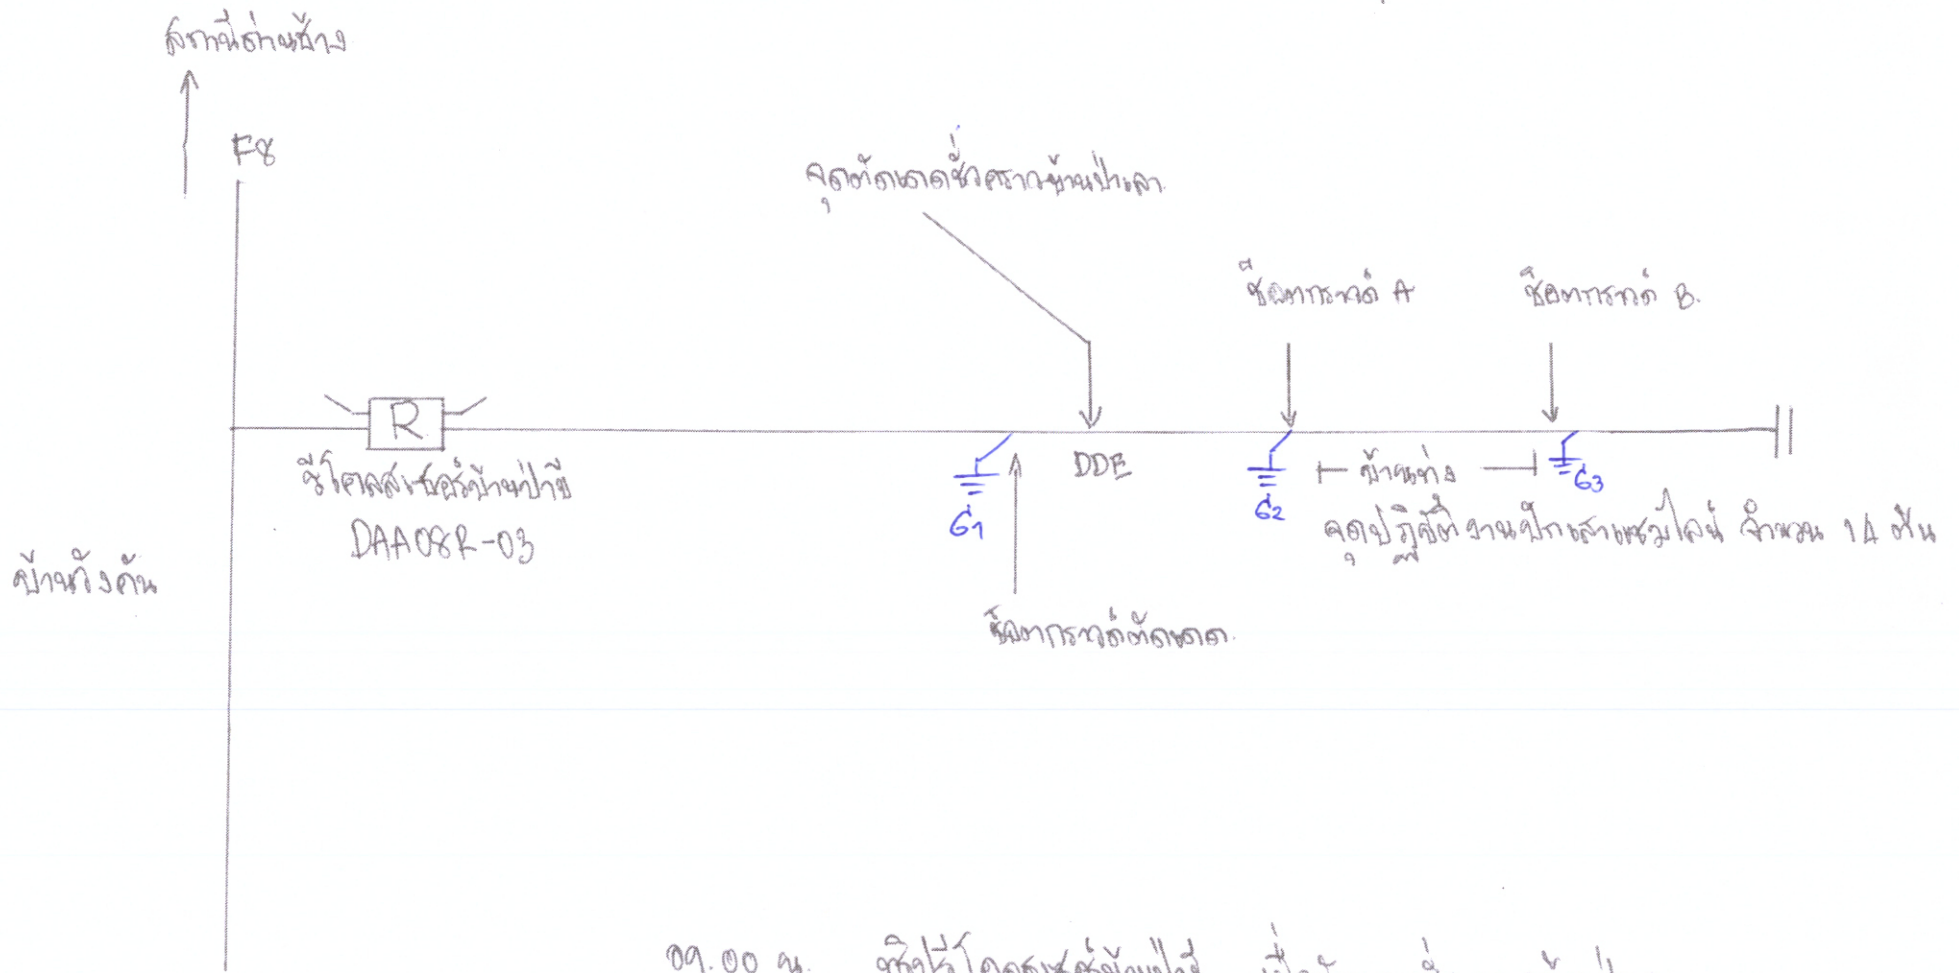
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านป่าซี - บ้านป่าเลา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 มิ.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	ปักเสาเข็มไลน์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 795/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 9 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการย้ายโหลด						
2	DAA08R-03	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ป่าซี
3	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
4	DAA08R-03	สับ	ปลด		ดช.		R ป่าซี
5	ให้ปลดใบมีดด้าน Load ของ DAA08R-03 (R. ป่าซี) ออกทั้ง 3 เฟส						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 (ชื่อ.....)						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 (ชื่อ.....)						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3 (ชื่อ.....)						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการตัด DDE บริเวณบ้านป่าเลา ออกทั้ง 3 เฟส						
10	หลังจากดำเนินการตัด DDE แล้วเสร็จ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1 (ชื่อ.....)						
12	ให้สับใบมีดด้าน Load ของ DAA08R-03 (R. ป่าซี) เข้าทั้ง 3 เฟส						
13	DAA08R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดช.		R ป่าซี
14	แจ้งการดับไฟ ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
15	DAA08R-03	Nonreclosing	Normal		ดช.		R ป่าซี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
17	DAA08R-03	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ป่าซี
18	DAA08R-03	สับ	ปลด		ดช.		R ป่าซี
19	ให้ปลดใบมีดด้าน Load ของ DAA08R-03 (R. ป่าซี) ออกทั้ง 3 เฟส						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 (ชื่อ.....)						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเชื่อม DDE บริเวณบ้านป่าเลา เข้าทั้ง 3 เฟส						
22	หลังจากดำเนินการเชื่อม DDE แล้วเสร็จ						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1 (ชื่อ.....)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2 (ชื่อ.....)						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3 (ชื่อ.....)						
26	ให้สับไบมัดด้าน Load ของ DAA08R-03 (R. ป่าซี) เข้าทั้ง 3 เฟส						
27	DAA08R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดช.		R ป่าซี
28	DAA08R-03	Nonreclosing	Normal		ดช.		R ป่าซี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังวงจรรับ อีพียู 14 สิงหาคม 2564



09.00 น. ติดตั้งตัวต้านทานรับสัญญาณ ECU ที่จุดตัดเอาต์พุตจากหน่วยประมวลผล
นำขดขั้วรับสัญญาณ อีพียู จุดตัดเอาต์พุต

ผู้ควบคุมงาน นายนิพนธ์ คงรัตน์
ผู้เขียนภาพ นายนิพนธ์ คงรัตน์
071-996991
