

Switching Deadline  
16 มิ.ย. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๓๗/๙ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายพุดชงค์ ภาทหลง

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย พีดเตอร์ 3  
สถานีไฟฟ้า เดิมบงวา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๓	๒๐ มิ.ย. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง บริเวณ Disชั่วคราว อรัญคอนกรีตถึง Disบางขวาง	Disชั่วคราว อรัญคอนกรีต	DBA35-06 บางขวาง	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๘๔๖๐๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑๕ เวกวีลิง ๑๓๗๕๐ เวกวีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๕๕๖๖ ครัวเรือน  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวานิช ไชจิตต์ ตำแหน่ง ช.ผ.ก. โทร ๐๘๙-๒๑๘๔๔๔๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ศ.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายพุดชงค์

(นายพุดชงค์ ภาทหลง)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พีดเตอร์ DBA03 จาก Dis บางขวาง ถึง DBA35-06

ในวันที่ 20 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 810/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พีดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สักดิ์สิทธิ์ เยี่ยมสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจก.กฟส.อ.สข. 15 มิ.ย. 64

ร.ท.พร อำนวยเกียรติ  
(๐๙๖.๗ 11๓๓ น.พ.ค.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.)  
เรียน ผ.จก. กฟส.อ.สข.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สะพานบางขวาง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มิ.ย. 64	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย DBA03 ตามใบขอปฏิบัติงาน 810/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 15 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 10.95 MW
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- โหลด 3.93 MW
4	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หน้าราชชมงคลฯ
5	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- โหลด 8.8 MW
6	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 4.32 MW
7	- ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPC03						
8	DBA03S-07	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
9	DBA02S-08	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 หมวดการทางฯ
10	DBA03S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS สะพานบางขวาง
11	DBA02S-08	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 หมวดการทางฯ
12	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
13	DIS ชค. DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS อรัญคอนกรีตา
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
17	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
18	DBA03VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DBA		-
19	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R หน้าราชชมงคลฯ
20	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
21	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
26	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
28	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคลฯ
29	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
30	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
31	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
32	DIS ชด. DBA03	ปลด	สับ		สช.		DIS อรัญคอนกรีตฯ
33	- ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนกลับจาก SPC03						
34	DBA02S-08	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 หมวดการทางฯ
35	DBA03S-06	ปลด	สับ		สช.		DIS สะพานบางขวาง
36	DBA03S-07	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
37	DBA02S-08	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 หมวดการทางฯ
38	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
39	DBA03VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DBA		-
40	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคลฯ
41	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
42	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย วันที่ 20 มิถุนายน 2564

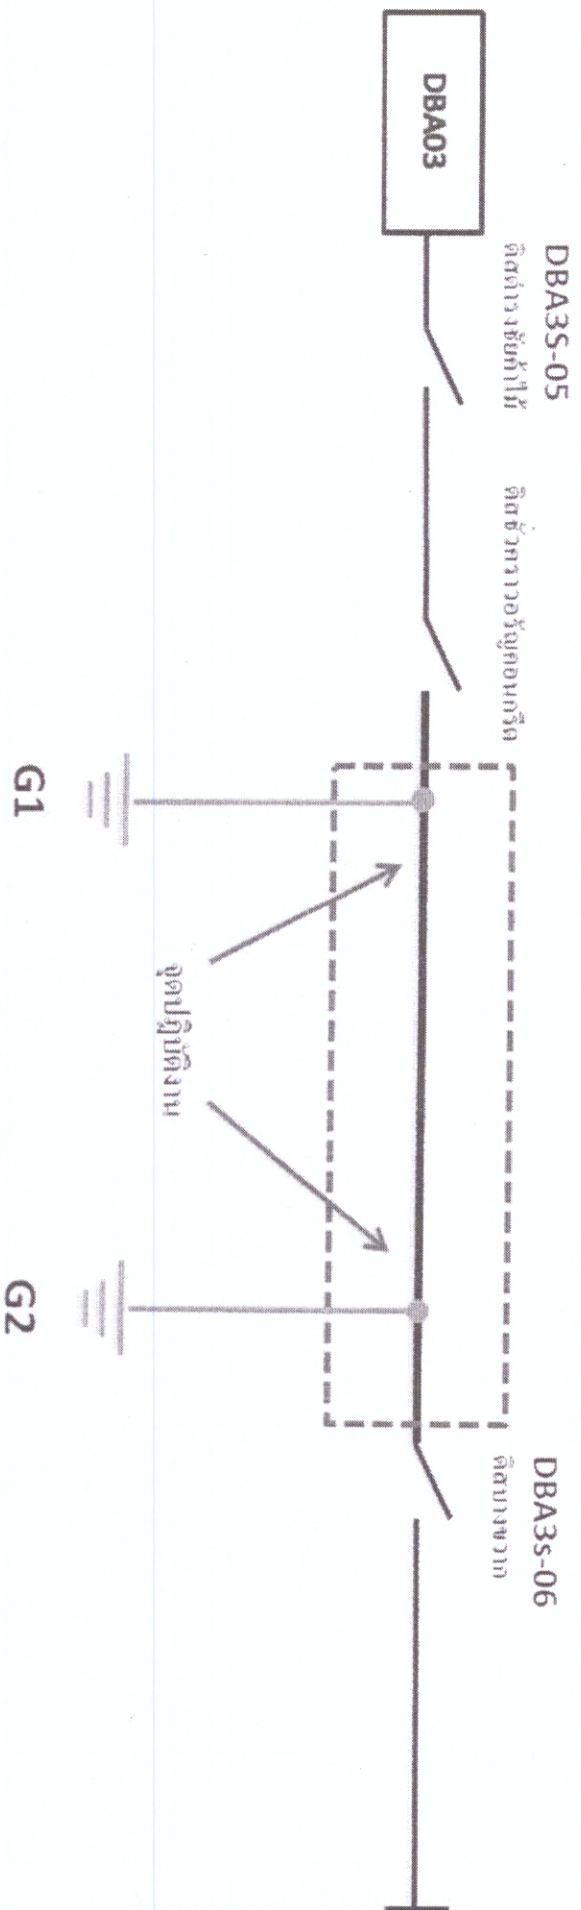

G1 ช็อคกราวด์ โดยชุดแม่ทัพ นาย วาณิช ไพรัตน์ ควบคุมงาน  
G2 ช็อคกราวด์ โดยชุดซ่อมย่อย นายอรุณพ แยมมนตรี ควบคุมงาน

Approved
