



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

17 มิ.ย. 67

วิญญขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท. ๗๖๕/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๑๘-๒๐ มิ.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายส่ง ๑๕๕ เควี บ้าน สระลงเรือ	SF แยกไฟสี่	ตีสชั่วคราววัดสระ ลงเรือ(ร้านเจ๊บุ)	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ว่าง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผจก.ป. โทร. ๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๕


๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG05 จาก SF แยกไฟสี่ ถึง Dis ชั่วคราว วัดสระลงเรือ
ในวันที่ 18-20 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 833/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย บุญทอง ผาเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ จะสอนตา ชำนาญเรือ


(นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล)
อ.ก. 4 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. พทท., กฟส. ก., กฟส. ทก.
อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกไผ่สี - หน้าวัดสระลงเรือ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18-20/6/2024	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง (115 kV)		ตามใบขอปฏิบัติงาน 833/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน			วันที่	15 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายธีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายโมฆ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		Load = 5.15 MW
5	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.		
6	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.		
7	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG09						
8	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		ขนานบัส
9	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลข.		DIS สี่แยกบ้านตลุงเหนือ
10	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		ขนานบัส
11	UTG05R-01	สับ	ปลด		หจก.		R สระลงเรือ
12	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
13	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS ชั่วคราวหน้าวัดสระลงเรือ
14	SF6 ชั่วคราวไลน์ UTG05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หจก.		SF6 ชั่วคราวติดตั้งใหม่แยกไผ่สี
15	ตรวจสอบ UTG05S-08 (SF6 แยกไผ่สี) อยู่สถานะ " OPEN+LOCK"						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทน รับทราบ						
17	แจ้ง กฟส.พทน ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
18	แจ้ง กฟส.พทน ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
19	เมื่อ กฟส.พทน ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
21	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
22	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
23	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
24	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
25	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
26	แจ้ง กฟส.พทน. ปลด Short Ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้ง กฟส.พทน. ปลด Short Ground จุด G2						
28	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
29	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
30	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
31	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
32	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.		
33	ย้ายโหลด UTG05 กลับจาก UTG09						
34	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	ปลด	สับ		หจก.		DIS ชั่วคราวหน้าวัดสละลงเรือ
35	SF6 ชั่วคราวไลน์ UTG05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		หจก.		SF6 ชั่วคราวติดตั้งใหม่แยกไฟสี่
36	UTG05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		หจก.		R สละลงเรือ
37	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		ขนานบัส
38	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS สี่แยกบ้านตลุงเหนือ
39	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		ขนานบัส
40	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
41	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
42	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
43	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.		
44	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.		
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผังวงจร

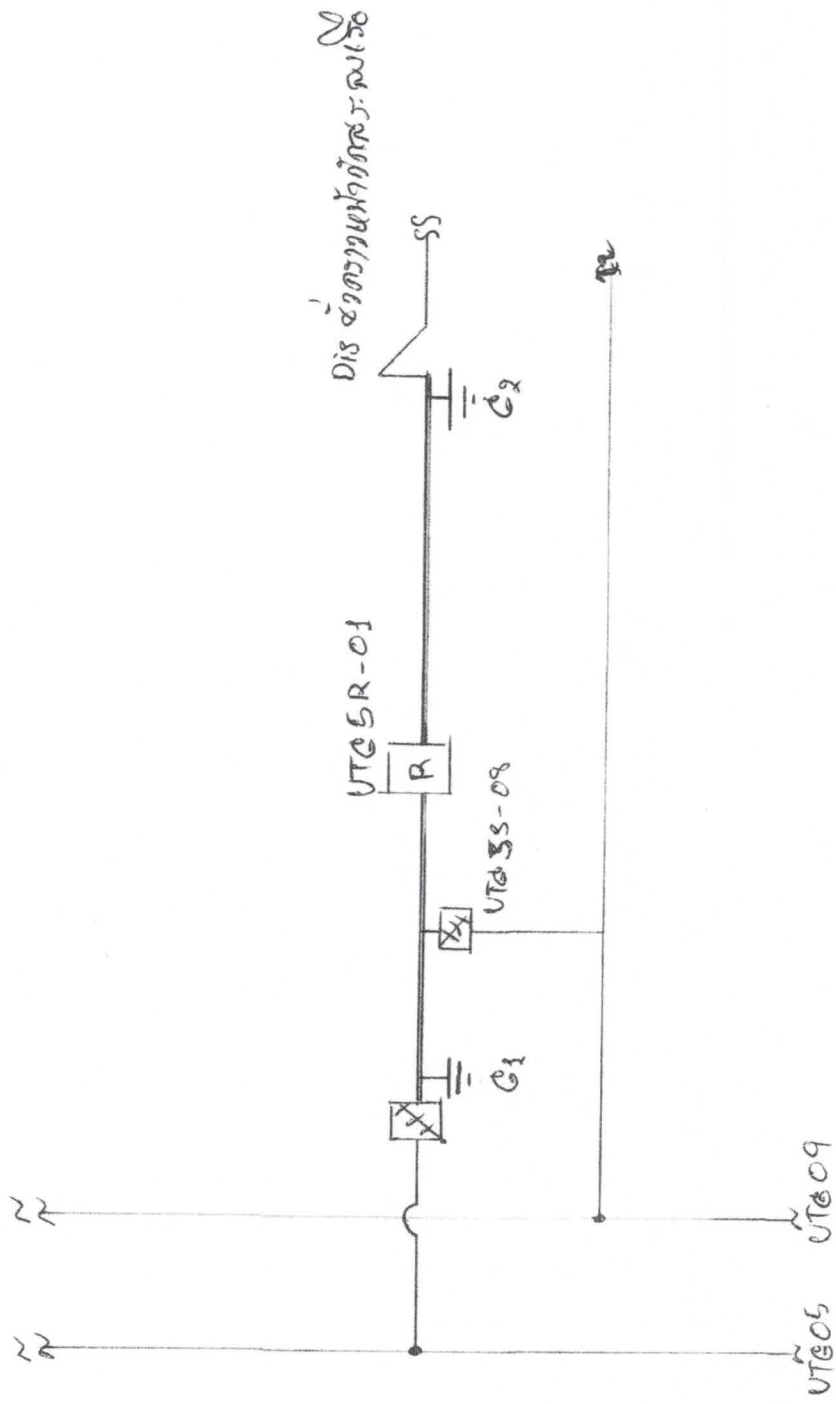

[Signature]
