



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Switching Deadline

15 มิ.ย.67

เลขที่ ก.๓ พทช.(ร.๑) ๑๖๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ นิลศิริสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายมานะ นิลศิริ

วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.(ระดับ ๓๓) ร.ช.ผ.จก.(ระดับ ๓๐) กฟส.พทช.

ด้วยกรณีนี้ อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา
ตามแผนผังสั่งเจปแนบด้วย ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY๐๘	๑๖ มิ.ย.๖๗	๐๘:๐๐	๑๗:๐๐	พาดสายอณูนิเยมเปลี่ยนขนาด ๔'๐๐ ค.ม.ม ระยะทาง ๓.๐๐ วงจร-กม.(เฟส A) งานก่อสร้างระบบสายส่ง ๓๓.๕ เควี WBS P-TDD02.1-I-PMNT0.0002 บริเวณ หน้า บ.ประปาไทยฯ-สะพานมอเคอร์เวย์	- Dis ชั่วคราว หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว ไก่มชชช	- Dis ชั่วคราว ปากซอยศรีกมล	นายวิวัฒน์ นาคณีย์ ๐๘๓-๙๙๙๙๙๗๘๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ: นายประวิทย์ นิลศิริสุวรรณมงคล ตำแหน่ง..... อ.ก.ป.บ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๙๓๓๒.....
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ท.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..นายมานะ นิลศิริ..) ตำแหน่ง ผ.จก.(ระดับ ๓๓) ร.ช.ผ.จก.(ระดับ ๓๐) กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนควบคุมการตัดไฟ (ผศฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัดเคอร์ 9408 จาก Dis ชั่วคราว หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว ไก่มชชช ถึง Dis ชั่วคราว ปากซอยศรีกมล
ในวันที่ 16 มิ.ย. ๖7 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 836/2567
พนักงานชื่อย่ นาย ๑๖ ศรีนิษฐ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ก.๓ ศาลายา โดยสวิตซ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. (คฟ. ก.๓) (คฟ. ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนผังไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ ๒ แผ่น

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และขจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวโก่มะระ - ปากซอยศรีกรมล (SLY08)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 มิ.ย. 67	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทท.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง 115kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 836/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร วันที่ 14 มิถุนายน 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	[Signature] วันที่ 14 มิถุนายน 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	[Signature] วันที่ 14 มิถุนายน 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวิวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิชัย,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
4	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
5	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	-
6	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	-
7	ย้ายโหลด SLY08 บางส่วนไปจ่ายจาก SLY04						
8	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY	-	ขนานบัส
9	SLY04S-05	ปลด	สับ		พทท.	-	SF6 คลองซอยบน
10	DIS ชค. SLY08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.	-	DIS ปากซอยศรีกรมล
11	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY	-	ขนานบัส
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น. (พื้นที่ไฟดับไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ สามารถปลดดับไฟก่อนเวลาประกาศดับไฟได้)						
10	DIS ชค. SLY08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.	-	DIS หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวโก่มะระ
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.พทท รับทราบ						
17	แจ้งกฟส.พทท ทำการทดสอบไฟอ่อน หากไม่พบไฟอ่อน						
15	แจ้งกฟส.พทท ข้อตกลงจุด จุด G1 พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
16	แจ้งกฟส.พทท ข้อตกลงจุด จุด G2 พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
17	เมื่อกฟส.พทท ทำการ Short Ground ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
18	แจ้งกฟส.พทท ปฏิบัติงานได้						
19	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-
20	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-
21	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-
22	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อกฟส.พทท ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยทุกชุด พร้อมจ่ายไฟ						
24	แจ้งกฟส.พทท ปลด Ground จุด G1						
25	แจ้งกฟส.พทท ปลด Ground จุด G2						
26	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
27	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
29	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
10	DIS ชค. SLY08	ปลด	สับ		พทจ.		DIS หน้ารันทันก้วยเดี่ยวไก่อะระ
32	ย้ายโหลด SLY08 บางส่วนกลับจาก SLY04						
33	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		- ขนานบัส
10	DIS ชค. SLY08	ปลด	สับ		พทจ.		DIS ปากขอยศรีกรมล
35	SLY04S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทจ.		SF6 คลองขอยบน
36	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		- ขนานบัส
37	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
38	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
39	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
40	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ควบคุมงาน ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล
เลขที่ ก.ศ พทท.(กส.) ๘๐๙ วันที่ ๑๑ มี.ย. ๖๗
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้า
บางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ตามอนุมัติที่ กรพ.ก(อส.๓ก)๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้างระบบ
สายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒
(พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.1-PMNT0.0002 โครงการ 6001159272 (TL-C-E) โดยมี
นายวิวัฒน์ นาคลัมย์ พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓) เป็นช่างควบคุมงาน ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงาน
ดังนี้

- พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๔๐๐ ต.มม. ระยะทาง ๑.๐๐๐ วงจร-กม. (๑ เฟส)

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ KV.
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟส.พุทธมณฑล ดำเนินการดังนี้

กฟส.พุทธมณฑล

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ
- ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ ปุ่ม PT ถึง มอเตอร์เวย์ ระบบจำหน่าย ๒๒ KV.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

- นพ.ปบ. เพ็ชรภาพแจ้ :ดำเนินการต่อไป

(นายมานอน นวนนื้อ)
ผจก. (ระดับ ๑๑) รช.ผจก. (ระดับ ๓๐)
กฟส.พุทธมณฑล

(นายวิวัฒน์ นาคลัมย์)
พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓)
ผู้ควบคุมงาน

ส่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี CUT&TURN (สพฟ.บางเลน - สพฟ.ศาลายา) - สพฟ.บางเลน ๒(พุทธมณฑล ๓) (WBS P-TDD๐๒.๑-I-PMNT๐.๐๐๐๒).....
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน แนวถนน ศาลายา-บางภาษี ซอออก (ตั้งแต่ หน้า บ.ประปาไทย จก. - สะพานมอเตอร์เวย์ -
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น.จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น..
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..... นายจรเดช นิยมศิริ
 ตำแหน่ง..... รจก.(ท).ภฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๖๒-๑๔๙๓๕๖๑.....
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายวิวัฒน์...นาคลมัย.....
 ตำแหน่ง..... พชง.๖..ผกร.กรย.(ก.๓)..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑.....
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว
 ชุดงาน ผกร.กรย.(ก.๓)

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
 ชื่อ ..นายปราโมทย์ เบลูจทรัพย์.....ตำแหน่ง..... ชม.ปบ.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดแก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำราวด์ชั่วคราวจุดที่๑..... G1 G2 ผู้รับผิดชอบ..... ชุดแก๊ไฟฟ้าขัดข้อง ผบป.
 จุดที่๒ ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๓.....
 ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔..... ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก พชง.๖ ผกร.กรย.(ก.๓) ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗พร้อมแผนผัง Switching
 ไม่อนุมัติ เหตุผล.....
 อนุมัติ ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก พชง.๖ ผกร.กรย.(ก.๓) ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๐๓/๒๕๖๗, ลว. ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๗
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... น.ส.จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง นทน.(จป.ว) ๕ กฟส.พุทธมณฑล


๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ
 แจ้ง จำนวน..... ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
 จัดประชุมวันที่..... ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม กฟส.พุทธมณฑล
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม พช.ปบ. , ชม.ปบ. , จป.ว. , พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... จะชี้แจงในวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)
 จัดชี้แจงวันที่..... วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง

C3 Safety CAP 01

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

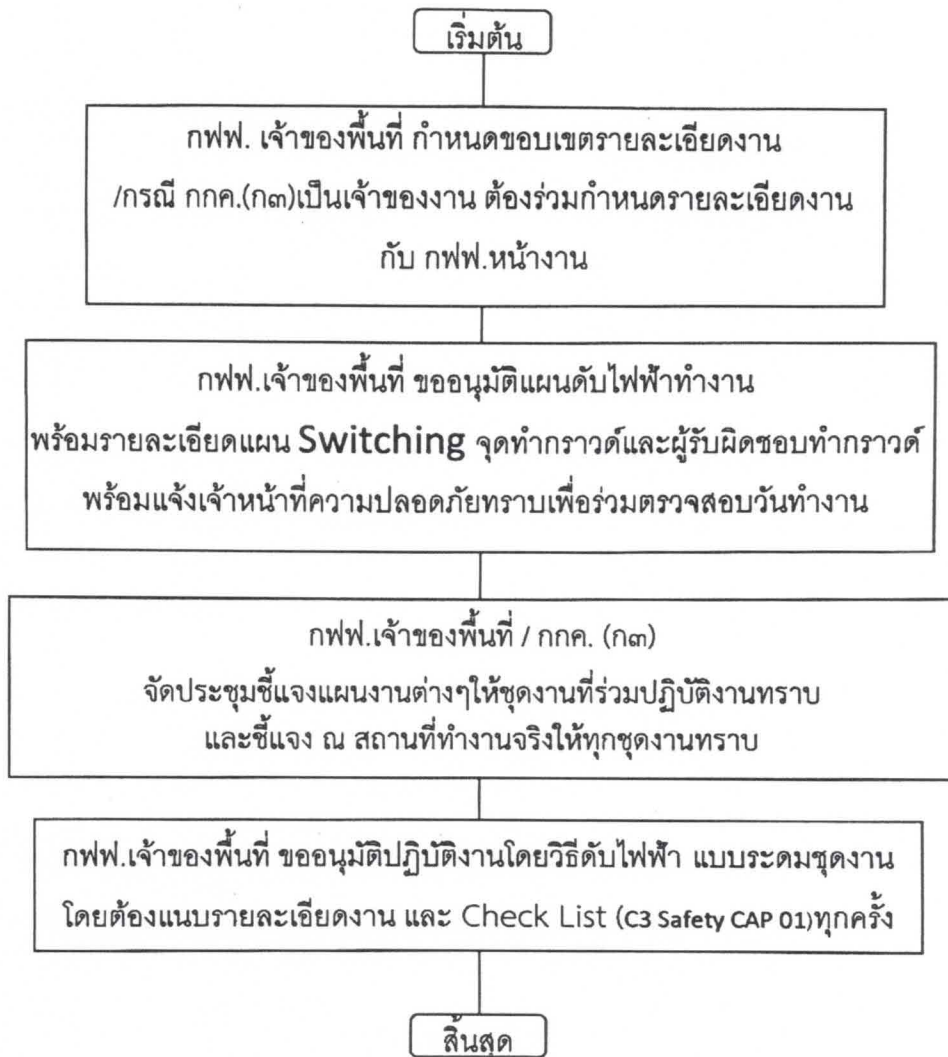





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.พทุมณฑล ถึง ผจก.กฟส.พทุมณฑล
เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๐๙๔ /๒๕๖๗ วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า
เรียน ผจก.กฟส.พทุมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผกร.กรย.(ก.๓) ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี CUT&TURN (สฟฟ.บางเลน - สฟฟ.ศาลายา) - สฟฟ.บางเลน ๒ (พทุมณฑล ๓) WBS P-TDD๐๒.๑-I-PMNT๐.๐๐๐๒ (ตั้งแต่ หน้า บ.ประปาไทย จก. - สะพานมอเตอร์เวย์) ซึ่งจะดำเนินการพาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๔๐๐ ต.มม. ระยะทาง ๑.๐๐๐ วงจร-กม. (เฟส A) โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการฯ จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พทุมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป


(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)
ชม.ปบ.กฟส.พทุมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายมานอน นวนน้อ)
ผจก. (ระดับ ๑๑) รช.ผจก. (ระดับ ๑๐)
กฟส.พทุมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
โทร ๑๕๙๕๕
