



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
R PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

21/06/67

เลขที่ ก.๓.พทน. ๔๖๒ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธ์นันท์ พงษ์วิฑูรธรรมชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๒๒-๒๒ มิ.ย.๖๗ 22,24-26	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายส่ง ๑๑๕ เควี บ้าน สระลงเรือ	ดิสชั่วคราว หน้าห้องแถว วัดสระลงเรือ	ดิสชั่วคราว บ้านห้วยลึก	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ขณ.กป. โทร. ๐๘๔-๓๑๖๒๑๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ UTG05 จาก วัดสระลงเรือ ถึง บ้านห้วยลึก
ในวันที่ 22, 24-26 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 862/67
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ เล.อ.ช.ธา ชำนาญเรือ

(นายอนุชา ชำนาญเรือ)
๑๙.๖.๖๗ น.พ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.พนมทวน
อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี _____)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าห้องแถววัดสระลงเรือ - บ้านห้วยลึก		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22,24-26มิ.ย. 67	เวลา	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พท.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง 115 kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 862/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่ 20 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง (ดับเข้า - จ่ายเย็น ทุกวัน)						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.		R สระลงเรือ
5	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.	SCADA	R ตะลุงเหนือ
6	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG09						
7	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		ขนานบัส
8	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลข.		DIS สี่แยกบ้านตะลุงเหนือ
9	Dis ชั่วคราว UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS บ้านห้วยลึก
10	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
12	Dis ชั่วคราว UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS ห้องแถวหน้าวัดสระลงเรือ
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พท. รับทราบ						
14	แจ้ง กฟส.พท. ให้ Test ไฟอ่อน หากไม่พบไฟอ่อนให้ Short Ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟส.พท. ให้ Test ไฟอ่อน หากไม่พบไฟอ่อนให้ Short Ground จุด G2 พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe						
16	เมื่อ กฟส.พท. ทำการ Test ไฟอ่อน และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
18	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
19	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
20	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.		R สระลงเรือ
21	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		ลข.	SCADA	R ตะลุงเหนือ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
23	แจ้ง กฟส.พท. ปลด Short Ground จุด G1						
24	แจ้ง กฟส.พท. ปลด Short Ground จุด G2						
25	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
26	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
28	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.		R สระลงเรือ
29	UTG09R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		ลข.	SCADA	R ตะลุงเหนือ
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	Dis ชั่วคราว UTG05	ปลด	สับ		หจก.		DIS ห้องแถวหน้าวัดสระลงเรือ
32	ย้ายโหลด UTG05 กลับจาก UTG09						
33	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		ขนานบัส
34	Dis ชั่วคราว UTG05	ปลด	สับ		หจก.		DIS บ้านห้วยลึก
35	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS สี่แยกบ้านตะลุงเหนือ
36	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		ขนานบัส
37	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
38	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
39	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.		R สระลงเรือ
40	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.	SCADA	R ตะลุงเหนือ
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผังโดยสังเขป

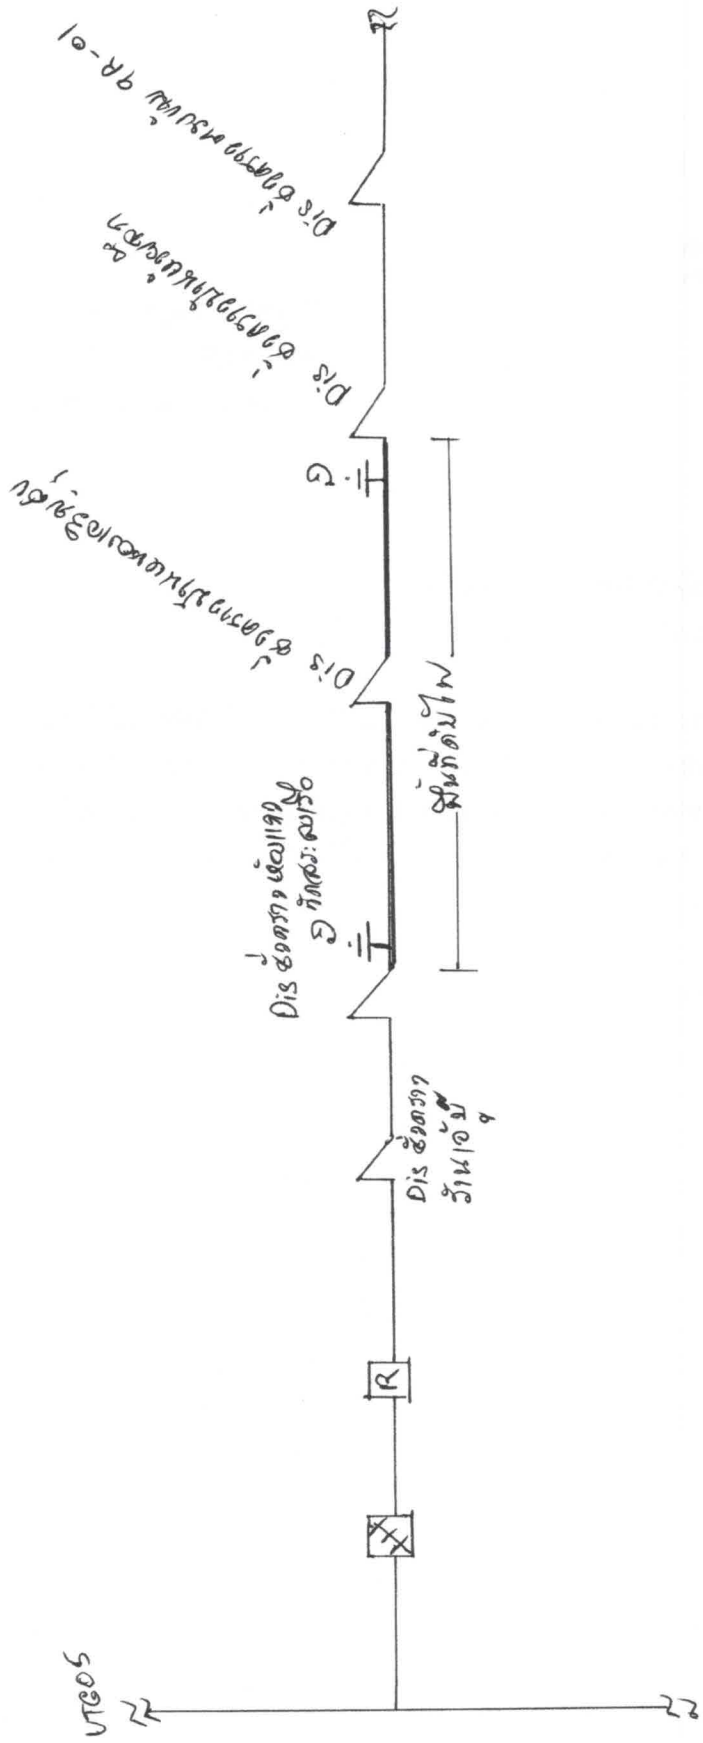

Qm

(นายอนุชา ชำนาญเรือ)
สม.ก.ป.ส.อ.พทน.
