



Switching Deadline

26 มิ.ย. 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖..... วันที่.....๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล..... ตำแหน่ง.....อก.ปบ.(ก.๓).....
 ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา..... ตำแหน่ง.....รจก.(ท.) กฟจ.สพ.....

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขอุปกรณ์ด้านแรงสูงต้น SFB ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑
 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๕ สพ.	๒๙/๐๖/๖๗	๐๙.๐๐	๑๑.๐๐	ตัดเคเบิ้ลแรงสูงรองรับงานขยาย สะพาน ก่อน SFB SPA๐๕S-๐๕	SPA๐๕S-๐๕	DDE จุด A	โทร.๐๘๑-๕๓๕๗๘๘๔ นายโชติระวี แสงสว่างโชติ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พทง.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๕๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา...)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท.) กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPA05 จาก SPA05S-05 ถึง DDE จุด A

ในวันที่ 29 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 866/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัทรา วัฒนคุณทด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางธนากร สุวรรณประทีป

สุภัทรา

(นางสาวสุภัทรา วัฒนคุณทด)

วศก.5 แทน ทว.คพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....!.....แผ่น

แผนผังแนบ.....!.....แผ่น

คคฟ..... (สถานี..... -.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. สพ.

อก.บช.(ก.๓),..... อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที่ 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ชลประทานโพธิ์พระยา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 มิ.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 11.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ตัด DDE เพื่อรองรับงานขยายสะพาน ตามใบขอปฏิบัติงาน 866/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 21 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายอนุสรณ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing		สพ.		
3	ตรวจสอบ SF6 SPA05S-05 ชลประทานอยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
4	แจ้งชุด HL ให้ทำการตัด DDE จุด A แยกออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟฟ้า)						
5	เมื่อชุด HL ให้ทำการตัด DDE จุด A แยกออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบแล้วเสร็จ						
6	แจ้งพื้นไฟดับให้ชุดปฏิบัติงาน กฟจ.สพ. รับทราบ						
7	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟจ.สพ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟจ.สพ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
9	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟจ.สพ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1 และ G2 แล้วเสร็จ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อยแล้ว แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
11	SPA05R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
12	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
13	เมื่อพร้อมจ่ายไฟคืนสภาพปกติ						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟจ.สพ. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟจ.สพ. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟจ.สพ. ทำการปลด Short Ground จุด G1 และ G2 แล้วเสร็จ						
17	แจ้งชุด HL ให้ทำการเชื่อม DDE จุด A เข้าสนิททั้ง 3 เฟส						
18	แจ้งชุด HL ให้ทำการเชื่อม DDE จุด A เข้าสนิททั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
19	SPA05R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๙...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...SF๖ชลประทานโพธิ์พระยา ...เพื่อ...งานก่อสร้างสะพาน สถานีสุพรรณบุรี...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ..๕.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี ... ตั้งแต่บริเวณ ..SF๖ชลประทานโพธิ์พระยา

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายโชติระวี แสงสว่างโชติ ตำแหน่ง พชง. ผกส.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ...๐๘๑-๔๓๔๗๘๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายพิบูล ปานขำ ..ตำแหน่ง ชผ.ปบ.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ..๐๘๘-๒๗๕๓๖๔๐...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

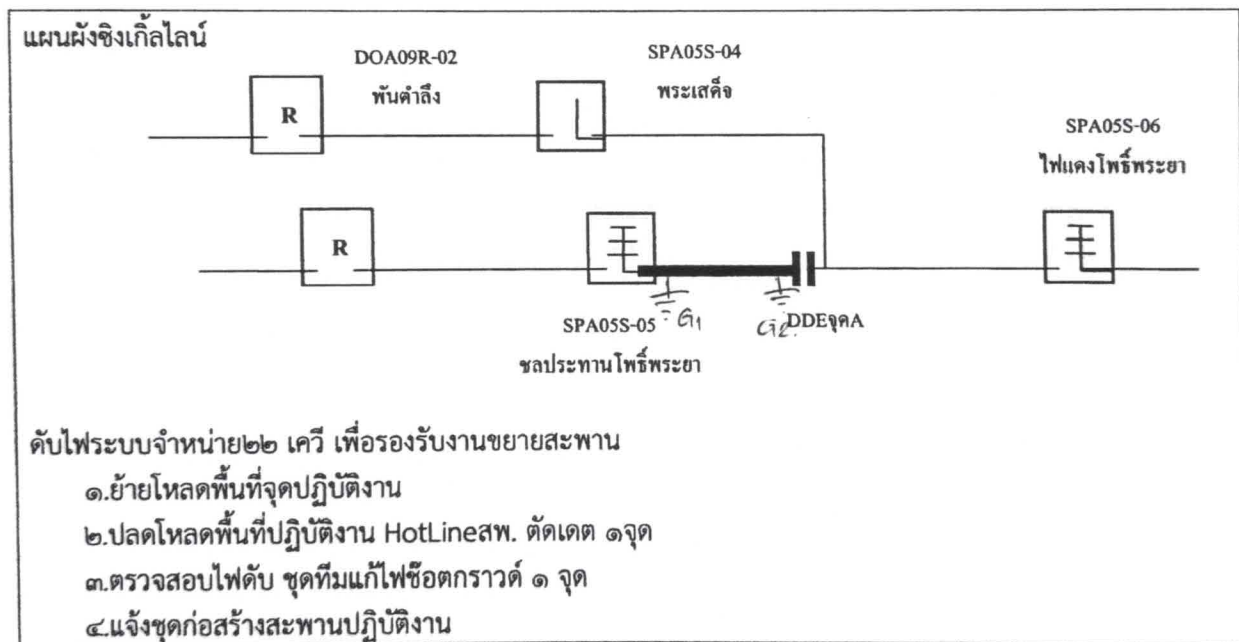

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผบ.ปบ.กฟจ.สพ.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐

