



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ ลข. ๖๐๙/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย แก้วสมนึก

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ลข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ลข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... เลขวิทยุ..... ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	UTG๐๕F	๒,๓,๔,๕ ก.ค. ๒๕๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายระบบจำหน่าย ๑๑๕ เกรียวงานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เกรียว บ้านตลุงเหนือ	โหม่ต้วคราว หน้าบ่อม ตำรวจ 4 แยก ตลุงเหนือ ผัง UTG05F	โหม่ต้วคราว บ้านกรอกกระโพธิ์ กพย.ทกจ.	นายสุรกิจ วันจิ๋ว โทร ๐๙๙-๖๒๐๓๙๓๓๓
๒	UTG๐๕F	๖ ก.ค. ๒๕๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายระบบจำหน่าย ๑๑๕ เกรียวงานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เกรียว บ้านตลุงเหนือ	SF6 LWA55-07	โหม่ต้วคราว ผังตรงข้ามจรงรุ่งเรืองวัสดุ	นายสุรกิจ วันจิ๋ว โทร ๐๙๙-๖๒๐๓๙๓๓๓
๓	UTG๐๙F	๖ ก.ค. ๒๕๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายระบบจำหน่าย ๑๑๕ เกรียวงานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เกรียว บ้านตลุงเหนือ ** บ.ธนชีวะทรัพย์ หยุดขนานการขายไฟ **	โหม่ต้วคราว ก่อนสี่แยกตลุงเหนือ ผัง UTG09F	โหม่ต้วคราว หน้าร้านจรงรุ่งเรืองวัสดุ	นายสุรกิจ วันจิ๋ว โทร ๐๙๙-๖๒๐๓๙๓๓๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านตลุงเหนือ บ้านรางคลอง บ้านตรอกช่องลม

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ตำแหน่ง ชผ.กบ. โทร ๐๘๔-๗๒๗๗๘๒๑

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย แก้วสมนึก)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ลข.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG05 จาก SF6 LWA55-07 ถึง บัส ๖๓. ฝั่งตรงข้ามจรงรุ่งเรืองวัสดุ
ในวันที่ 6 กค 67 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 894/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ UTG09 จาก บัส ๖๓. หน้าร้านจรงรุ่งเรืองวัสดุ
ในวันที่ 6 กค 67 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมชาย แก้วสมนึก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย

.....
(นายสมชาย แก้วสมนึก)
๐๙๖-๖๒๗๗๘๒๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ลพ., กฟผ.-นท.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

คคพ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น


แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านตลุงเหนือ,บ้านรางคลอง,บ้านตรอกช่องลม (UTG05,09)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ก.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 894/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 30 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรัสวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามภา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมโ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
กฟส.ลช.แจ้งโรงไฟฟ้าสระลงเรือ (UTG09) หยุดขนานไฟ							
กฟส.ลช.แจ้ง บริษัท ธนาชีวทรัพย์ จำกัด (UTG09) หยุดขนานไฟ							
1	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
2	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
3	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
4	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
5	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing		หจก.	R	R.สระลงเรือ
6	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing		หจก.	-	R.ไผ่สี
7	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	-
8	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA	-	-
9	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	-
10	LWA04R-01	Normal	Nonreclosing		ลช.	R.	แยกบ้านโบลต์เก่า
11	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วนไปรับไฟจาก LWA05						
12	UTG05S-07	ปลด	สับ		ลช.	SF6	บ้านหนองประดู่
13	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG	-	ขนานบัส
14	UTG09S-07	ปลด	สับ		ลช.	DIS	บ.หนองปรือ
15	DIS ชค.ไลน์UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลช.	DIS	บ้านตลุงเหนือ
16	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG	-	ขนานบัส
17	UTG05S-07	สับ	ปลด		ลช.	SF6	บ้านหนองประดู่
18	ดับไฟย้ายโหลด UTG09 บางส่วนไปรับไฟจาก LWA10						
19	กฟส.ลช.แจ้ง บริษัท ธนาชีวทรัพย์ จำกัด ทำการปลดโหลดภายในออกเพื่อเตรียมดับไฟย้ายโหลด						
20	เมื่อ กฟส.ลช.แจ้ง บริษัท ธนาชีวทรัพย์ จำกัด ทำการปลดโหลดภายในออกเรียบร้อยแล้ว						
21	DIS ชค.ไลน์UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลช.	DIS	ธนาชีวทรัพย์
22	D/F ไลน์ LWA10	ปลด	สับ		ลช.	D/F	เนตรบุญฟาร์ม
23	กฟส.ลช.แจ้ง บริษัท ธนาชีวทรัพย์ จำกัด ทำการขนานไฟได้ปกติ						
24	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
25	DIS ชค.ไลน์UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลช.	DIS	หน้าร้านวัสดุก่อสร้าง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	DIS ชค.ไลน์UTG05	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS	ฝั่งตรงข้ามร้านวัสดุก่อสร้าง
27	แจ้ง Hotline ทำการตัด DDE บริเวณหลัง DIS ชค.ธนาชีวทรัพย์ ออกทั้ง 3 เฟส							
28	เมื่อ Hotline ทำการตัด DDE บริเวณหลัง DIS ชค.ธนาชีวทรัพย์ ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
29	แจ้งพื้นที่เฝ้าให้ กฟส.ลข.รับทราบ							
30	แจ้งชุดทำงาน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1							
31	แจ้งชุดทำงาน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2							
32	แจ้งชุดทำงาน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G3							
33	แจ้งชุดทำงาน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G4							
34	แจ้งชุดทำงาน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G5							
35	แจ้งสถานะเฝ้าให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
36	แจ้ง กฟส.ลข.ปฏิบัติงานได้							
37	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
38	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
39	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
40	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
41	UTG05R-01	Nonreclosing	Normal		ทกจ.		R	R.สระลงเร็ว
42	UTG09R-01	Nonreclosing	Normal		ทกจ.		-	R.ไผ่สี
43	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	-
44	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-	-
45	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
46	LWA04R-01	Nonreclosing	Normal		ลข.		R.	แยกบ้านโบสถ์เก่า
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
47	เมื่อชุด กฟส.ลข.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
48	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	-
49	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	-
50	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	-
51	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	-
52	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing		ทกจ.		R	R.สระลงเร็ว
53	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing		ทกจ.		-	R.ไผ่สี
54	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-	-
55	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-	-
56	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		-	-
57	LWA04R-01	Normal	Nonreclosing		ลข.		R.	แยกบ้านโบสถ์เก่า
58	แจ้งชุดทำงาน ให้ทำการปลด Shortground จุด G1							
59	แจ้งชุดทำงาน ให้ทำการปลด Shortground จุด G2							
60	แจ้งชุดทำงาน ให้ทำการปลด Shortground จุด G3							
61	แจ้งชุดทำงาน ให้ทำการปลด Shortground จุด G4							
62	แจ้งชุดทำงาน ให้ทำการปลด Shortground จุด G5							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ	
63	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
64	DIS ชด.ไลน์UTG05	ปลด	ล๊ับ		ลข.		DIS	ฝั่งตรงข้ามร้านวัสดุก่อสร้าง
65	DIS ชด.ไลน์UTG09	ปลด	ล๊ับ		ลข.		DIS	หน้าร้านวัสดุก่อสร้าง
66	แจ้ง Hotline ทำการเชื่อม DDE บริเวณหลัง DIS ชด.ธนาชีวทรัพย์ เข้าทั้ง 3 เฟส							
67	เมื่อ Hotline ทำการเชื่อม DDE บริเวณหลัง DIS ชด.ธนาชีวทรัพย์ เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
68	เมื่อพร้อมดับไฟย้ายโหลด UTG09 บางส่วนกลับจาก LWA10							
69	กฟส.ลข.แจ้ง บริษัท ธนาชีวทรัพย์ จำกัด ทำการปลดโหลดภายในออกเพื่อเตรียมดับไฟย้ายโหลด							
70	เมื่อ กฟส.ลข.แจ้ง บริษัท ธนาชีวทรัพย์ จำกัด ทำการปลดโหลดภายในออกเรียบร้อยแล้ว							
71	D/F ไลน์ LWA10	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		D/F	เนตรบุญฟาร์ม
72	DIS ชด.ไลน์UTG09	ปลด	ล๊ับ		ลข.		DIS	ธนาชีวทรัพย์
73	กฟส.ลข.แจ้ง บริษัท ธนาชีวทรัพย์ จำกัด ทำการขนานไฟได้ปกติ							
74	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วนกลับจาก LWA05							
75	UTG05S-07	ปลด	ล๊ับ		ลข.		SF6	บ้านหนองประดู่
76	UTGBVB-01	ปลด	ล๊ับ		UTG		-	ขนานบัส
77	DIS ชด.ไลน์UTG09	ปลด	ล๊ับ		ลข.		DIS	บ้านตลุงเหนือ
78	UTG09S-07	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS	บ.หนองปรือ
79	UTGBVB-01	ล๊ับ	ปลด		UTG		-	ขนานบัส
80	UTG05S-07	ล๊ับ	ปลด		ลข.		SF6	บ้านหนองประดู่
81	กฟส.ลข.แจ้งโรงไฟฟ้าสระลงเรือ (UTG09) ขนานไฟเข้ากับระบบ PEA ได้							
82	กฟส.ลข.แจ้ง บริษัท ธนาชีวทรัพย์ จำกัด (UTG09) ขนานไฟเข้ากับระบบ PEA ได้							
83	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
84	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
85	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
86	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
87	UTG05R-01	Nonreclosing	Normal		ทกจ.		R	R.สระลงเรือ
88	UTG09R-01	Nonreclosing	Normal		ทกจ.		-	R.ไผ่สี
89	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	-
90	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-	-
91	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
92	LWA04R-01	Nonreclosing	Normal		ลข.		R.	แยกบ้านโบริสเก่า
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

6669 0064 878 2-5 N.M. 2567

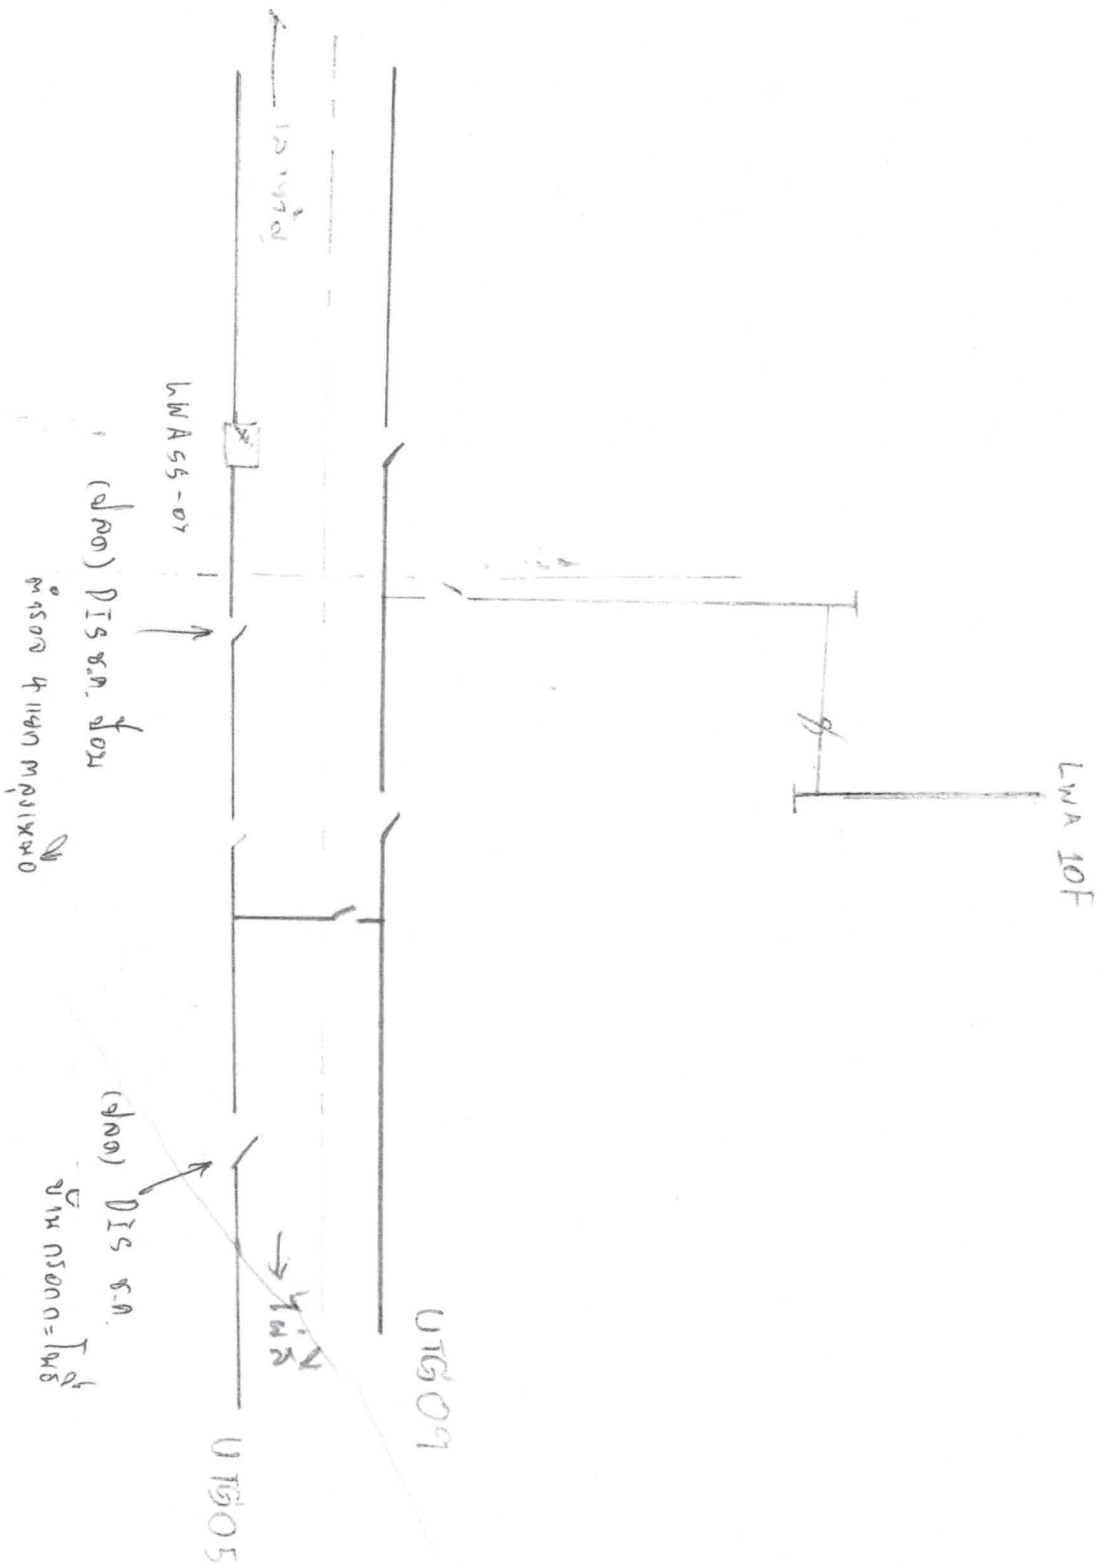

66992 67161 2209 6 P.P. 2567

