



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ /๐๕๖๓
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทิว
ชื่อผู้ส่ง นายฉลอง ไทสิทธิ์ทอง

Switching deadline
14 ก.ค. 64

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)กฟภ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณสะพานข้ามแยกไผ่ขวางขาเข้า
สุพรรณฯ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน	
๑.	2,4 สท.	11/07/64	08.00	17.00	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ ตัดไฟระบบ 22kV. เพื่อก่อสร้าง รื้อถอนและปักเสา-พาดสาย 185 ต.มม. ระยะทาง 2.5 กม. Dis SPA04S-05 - SPA02S-07	DDE นายเงาะ	DDE สามแยก ไทรโพธิ์	โทร.๐๙๐๑๔๓๕๑๑๔ นายปรีชา ทองระย้า	
หมายเหตุ ปัจจุบันในจุดนี้ได้ตัดเคเบิลไว้เรียบร้อยแล้ว						SPA02S-06	SPA02S-07		
๒.	2,4 สท.	18/07/64	08.00	17.00		DDE กต A DDE กต B	SPA2S-06 SPA2S-05 SPA4S-05		
๓.	2,4 สท.	25/07/64	08.00	17.00		SPA02S-06	SPA02S-07		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง ทชช.๗ (สช.) โทร. ๐๘๙๖-๐๐๙๖๕๕๘๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉลอง ไทสิทธิ์ทอง.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท.)กฟภ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 2 พิดเคอร์ SPA2/4 จาก DDE กต B ส่วนตอน ถึง SPA2S-05, SPA4S-05
ในวันที่ 18 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 901

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภ.ปบ.(ก.๓) ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

รศทพร ตันตโกศลกรกิจ
(อภ.๗ แทน ผค.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. สท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกโพธิ์พระยา			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปักเสาพาดสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 901/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการย้ายโหลด						
2	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
3	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing		สพ.		R หัวเกาะ
4	ย้ายโหลด SPA2 ฝาก SPA4						
5	SPA02S-07	ปลด	สับ		สพ.		DIS ประปาโพธิ์พระยา
6	SPA02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ตรงข้ามวัดวรจันทร์
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการโอนโหลดหม้อแปลงในระบบออกทั้ง 3 เฟส (มีโหลดหม้อแปลงผู้ใช้ไฟในไลน์ SPA2)						
9	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการตัด DDE จุด A ในไลน์ SPA2 บริเวณร้านโก๋อบฟาง ออกทั้ง 3 เฟส						
10	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการตัด DDE จุด B ในไลน์ SPA4 บริเวณสวนหย่อม ออกทั้ง 3 เฟส						
11	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ดำเนินการทั้ง 2 จุด แล้วเสร็จ						
12	ตรวจสอบ SPA02S-05 (SF6.ร้านพอเพียง) และ SPA04S-05 (SF6.ทนายเงาะ) อยู่สถานะ OPEN พร้อมล๊อคคาน						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 (ชื่อ.....)						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 (ชื่อ.....)						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3 (ชื่อ.....)						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4 (ชื่อ.....)						
17	แจ้งการดับไฟ ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
18	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
19	SPA02R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.		R หัวเกาะ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
21	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
22	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing		สพ.		R หัวเกาะ
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1 (ชื่อ.....)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2 (ชื่อ.....)						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3 (ชื่อ.....)						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4 (ชื่อ.....)						
27	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
28	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE จุด A ในไลน์ SPA2 บริเวณร้านไก่อบฟาง เข้าทั้ง 3 เฟส						
29	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE จุด B ในไลน์ SPA4 บริเวณสวนหย่อม เข้าทั้ง 3 เฟส						
30	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ดำเนินการทั้ง 2 จุด แล้วเสร็จ						
31	ย้ายโหลด SPA2 คืนจาก SPA4						
32	SPA02S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS ตรงข้ามวัดวรจันทร์
33	SPA02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ประปาโพธิ์พระยา
34	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
35	SPA02R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.		R หัวเกาะ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วยในวันที่...๑๘...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๔... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... SPA๐๒S-๐๕ - SPA๐๒S-๐๗...เพื่อ...รื้อถอนบักเสาและพาดสาย...โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้


ปิดเตอร์ ..๒.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. SPA๐๒S-๐๕ - SPA๐๒S-๐๗

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า...ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..

๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิโกร...ตำแหน่ง ผ.กส.กฟจ.สพ...เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..

๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

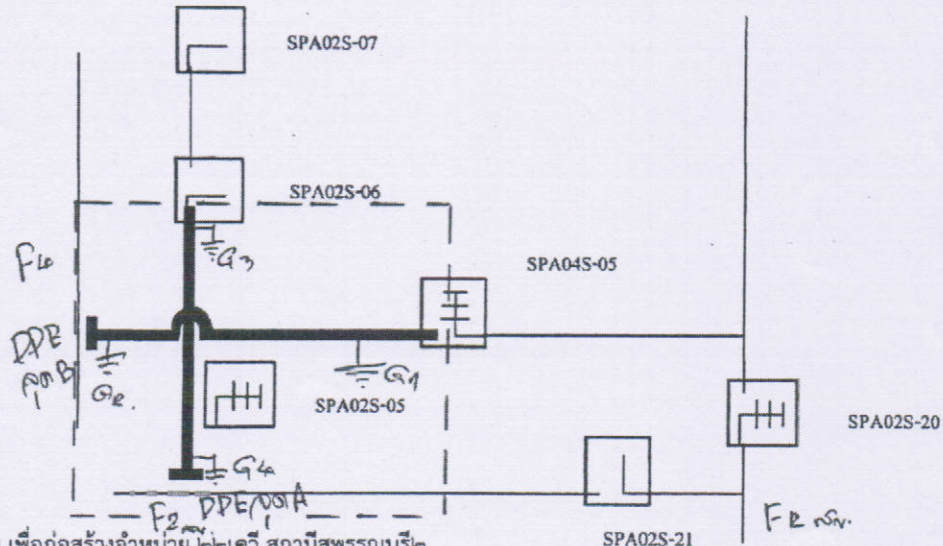

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างจำหน่าย ๒๒เควี สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหลดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
๒. ปลดโหลด ให้HotLineสพ.ปลดจุดจัมตึงข้ามถนน ๒จุด ปฏิบัติงาน เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อครหาจุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายฉลอง โพธิทอง)

รจก.(ท.)กฟจ.สพ.

(นายธนากร สุวรรณปรทีป)
พงง.๖(สข.)ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
