



Switching Deadline
วันที่ 8 ก.ค. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ๖๒๖๙๕๐๐๓ ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....ปิดเสาตรงข้ามสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี.....สถานีไฟฟ้า
กาญจนบุรี ๑.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F5 / กจ.	9 ก.ค.64	09.00	16.00	ปิดเสาตรงข้ามสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี	Diss ชั่วคราวข้าม ม.ราชภัฏกาญจนบุรี	DIS KCA 5S-09 ตรงข้ามวัดถ้ำประทุน	นายณรงค์ฤทธิ์ ปานอู๋ โทร 081-4318162
๒.	F3 / กจ.	9 ก.ค.64	09.00	16.00	ปิดเสาตรงข้ามสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี	SF6 KCA 3S-10 สะพานลอยหน้าราชภัฏ	SF6 KCA 3S-12 วัดเขื่อนสนธิ	นายณรงค์ฤทธิ์ ปานอู๋ โทร 081-4318162

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณหน้าราชภัฏกาญจนบุรี ถึง ตรงข้ามวัดถ้ำประทุน
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณรงค์ฤทธิ์ ปานอู๋.....ตำแหน่ง พงษ.๗ โทร 081-4318162.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....)
ตำแหน่ง นายณภูมิตร กิริพรรค
รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ.
- ๕ ก.ค. ๒๕๖๔

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ พิดเดอร์ KCA 5 จาก DIS ชั่วคราวข้าม ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ถึง KCA 5S-09
ในวันที่ 9 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๙๐๗/๖๔
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ พิดเดอร์ KCA 3 จาก KCA 3S-10 ถึง KCA 3S-12
ในวันที่ 9 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พหิต ภูษรินทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเสกสรรค์ พิทักษ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กจ.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเสกสรรค์ พิทักษ์)
ผจก. กฟจ. กจ.
๒๕๖๔-๗๖๖๖๖-๐๗

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ กาญจนบุรี3				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.กจ.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 907/2564		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริเนียม			วันที่	7 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง(ดับไฟย้ายโหลดเวลา06.00น.วันที่ 9ก.ค.64)						
2	KCA05R-02	Normal	Nonreclosing		กจ.		R บ้านพุเลียบ
3	KCA10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.		R บ้านหนองบัว
4	ย้ายโหลด KCA05 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA10						
5	KCA05R-02	สับ	ปลด		กจ.		R บ้านพุเลียบ
6	แจ้งกฟภ.กจ.ปลดใบมีดด้านออนไลน์KCA05R-02 R.บ้านพุเลียบ ออกทั้ง3เฟส						
7	KCA10F-13	ปลด	สับ		กจ.		D/F สะพานลาดหญ้า
8	KCA10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.		R บ้านหนองบัว
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
9	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- L=3.05MW.
10	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- L=-0.76MW.
11	ย้ายโหลด KCA03 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA05						
12	KCA03S-15	ปลด	สับ		กจ.		DIS รหัสพิชญธานี
13	KCA03S-13	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 หน้าบี่มหลอด
14	ย้ายโหลด KCA05 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA05(อาศัยไลน์KCA03)						
15	KCA03S-24	ปลด	สับ		กจ.		SF6 หมวดการทางบ้านเก่า
16	KCA05S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ตรงข้ามวัดถ้ำประทุน
17	เมื่อพร้อมดับไฟ						
18	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ช่างม.ราชภัฏกาญจนบุรี
19	KCA03S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 สะพานลอยหน้าราชภัฏกาญฯ
20	ตรวจสอบ SF6 KCA03S-12 หน้าวัดเย็นสนธิ อยู่สถานะ OFF ให้ล๊อคคาน						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
26	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-

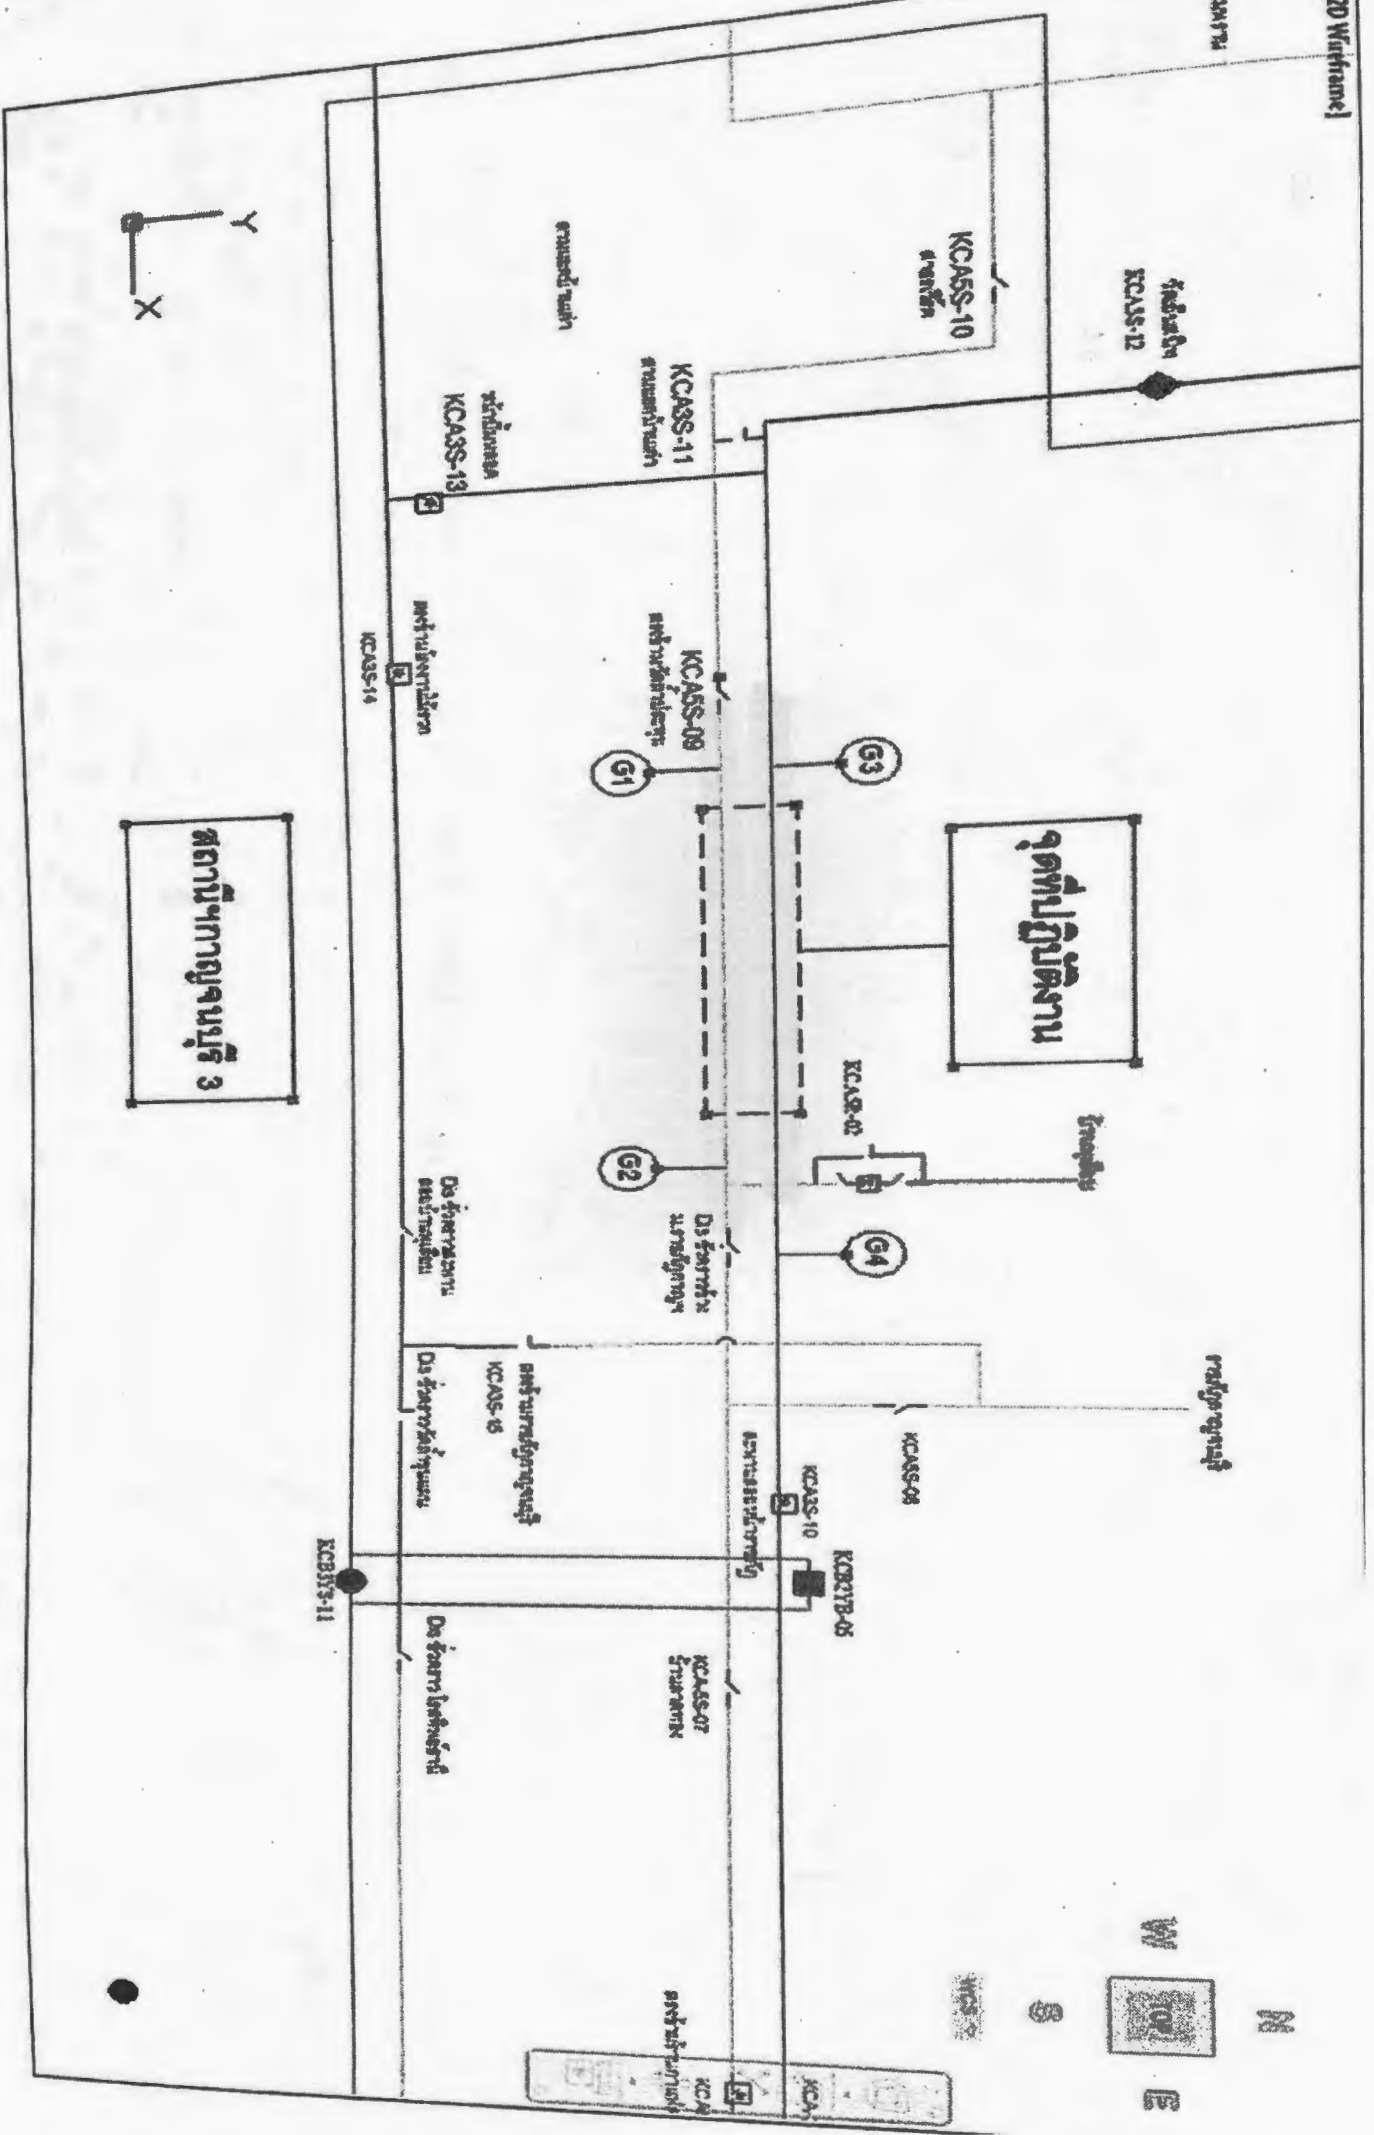

สถานีอากาศอุณหภูมิ 3

จุดพบปะผู้ติดตาม





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.กจ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้า

ถึง ผจก.กฟจ.กจ.

วันที่ 29 มิถุนายน 2564

เรียน ผจก.กฟจ.กจ./ผ.กส.กฟจ.กจ. *คป.ป.*

ด้วย แผนก่อสร้าง มีความจำเป็นที่จะต้องดับไฟปฏิบัติงาน สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 จ.กาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยดับกระแสไฟระบบ 22 KV ระยะเวลาการดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ทั้งนี้ได้ทำการแนบแผนผังพื้นที่ในการดับไฟ RN11-A03/620007 ช่างควบคุมงาน การดับไฟในครั้งนี้ นายณรงค์ฤทธิ์ ปานอุรัง เบอร์โทรศัพท์ 081-4318162

สาเหตุที่ทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้

ดังกล่าว

- | | | |
|---------------------------------|---------|-----|
| 1. ปักเสา.ขนาด 14.30 เมตร | จำนวน 3 | ต้น |
| 2. แต่งเสาขนาด 14.30 เมตร | จำนวน 3 | ต้น |
| 3. ติดอุปกรณ์หัวเสา | จำนวน 3 | ชุด |
| 4. ตั้งกายตัน DE เสา 14.30 เมตร | จำนวน 1 | ต้น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(Signature)
(นายณรงค์ฤทธิ์ ปานอุรัง)
พช.ก. ผกส.กฟจ.กจ.

*ขอทราบ สถานะของงาน ดับไฟ
ขอ. ปิดระบบดับไฟ
ขอทราบ สถานะการดับไฟ ดับกระแสไฟ
ขอทราบ สถานะการดับไฟ*

(Signature)
ผ.กส.กฟจ.กจ.
คป.ป.

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน...ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ถนนหมายเลข 323 (กาญจนบุรี-ไทรโยค)

WBS: P-TDD01.1-I-KCID0.0001อนุมัติเลขที่...ก.3 กวว.(вр.)-421/2562...ถว. 21. มี.ค.2562.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..ปักเสาขนาด 14.30ม.ต่อสตัด,แต่งเสา,ติดอุปกรณ์หัวเสา

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน...วันที่ 9 กรกฎาคม 2564.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... ผกส.กฟจ.กจ.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ.....นายณัฐมิตร ศิริพรรค.....

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) กฟจ. กาญจนบุรี..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-5721477.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก นายณรงศ์ฤทธิ์ ปานอรุ้ง ตำแหน่ง..พงง.7 กฟจ.กจ. เบอร์โทรศัพท์มือถือ.081-431-8162.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว กฟส. ในสังกัด. ทีมชุดงาน. ผกส.กฟจ.กจ.....

1. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า(เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อ...นายสมปอง กำจรกิตติคุณ.....ตำแหน่ง. ทผ.ปบ.กฟจ.กจ.....เบอร์โทรศัพท์มือถือ. 081-944-2459.....

2. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า.....ชุดงานแก่ไฟ. ชุดแก่กระแสฟ้าขัดข้อง..... กฟจ.กจ.....

3. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกรวดชั่วคราวจุดที่.....1,..2.....ผู้รับผิดชอบ ชุดแก่กระแสฟ้าขัดข้อง.....

4. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้าตามบันทึกที่ ก.3/กจ(บห.)-...../2564 อยู่ระหว่างการอนุมัติ.....โดยมีผลการอนุมัติดังนี้

ไม่อนุมัติ เหตุผล

อนุมัติ ตามบันทึกที่...ก.3/กจ(บห.)-..... /2564.....

5. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามบันทึกที่ ก.3/กจ(บห.)-..... /2564 อยู่ระหว่างการอนุมัติ.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ น.ส.บุษบา คุณาสันติกาญจน์.....ตำแหน่ง นทน.6 จป.กฟจ.กจ.....

6. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน.....ราย ในพื้นที่ดับไฟทั้งหมดมีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไฟหรือไม่.....

7. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่.....สถานที่ประชุม

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

8. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....

จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่.....รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

