

10/07/67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป)๕๙๘/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์วิสาสุวรรณิชล

ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน

วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ชั้นแปรกปร๑ ตามแผนผัง  
ส่งแบบแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.9 สถานี ด่านช้าง	15-16 ก.ค. 2567	09.00	17.00	ดับไฟเพื่อย้ายแนว ระบบจำหน่ายบ้าน ปรักประตุ	DDE หน้า วัดหนองผือ	LWA02S-08 บ้านปรักประตุ	นายศักดิ์ดา นรสิงห์ พงษ.๔ กฟส.อ.ด่านช้าง เบอร์โทร.๐๘๓- ๐๒๑๑๒๒๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตติณวิโชค ตำแหน่ง ผจก.ป.....โทร๐๕๘-๕๖๓๕๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DAA09 จาก DDE หน้าวัดหนองผือถึง LWA2S-08

ในวันที่ 15-16 ก.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 909/67

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ น.ส. สุภัทรา วงศ์บุญจก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนาเดช กิตติณวิโชค

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

วศก.๔ 1 ก.ค. นพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๑๕.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |   |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | บ้านปรักประตุ - หน้าวัดหนองผือ  |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 15-16 ก.ค. 67   | ระหว่าง  | 09.00 น. ถึง 17.00 น.   |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.ดช.   | งานที่ทำ | ย้ายแนวระบบจำหน่ายบ้านปรักประตุ ตามใบขอปฏิบัติงาน 909/67  |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นางสาวสุภัสชา วงศ์บุญมาก  |          | วันที่ 2 กรกฎาคม 2567   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |          | วันที่ 2 กรกฎาคม 2567   |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 2 กรกฎาคม 2567   |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |   |          | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, วรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA09R-03	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ปลักประตุ
3	เปลี่ยนทางย้ายโหลด DAA09						
4	DAA09S-16	ปลด	สับ		ดช.		DIS บ้านดงเสลา
5	DAA09S-22	สับ	ปลด, ล็อคคาน		SAA		SF6 บ้านปลักประตุ
6	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
7	แจ้งให้ กฟส.ดช. ทำการไลน์โหลดหลังจุดตัด DDE หน้าวัดหนองผือ ไปทาง LWU02S-08						
8	เมื่อ กฟส.ดช. ทำการไลน์โหลดแล้วเสร็จ						
9	แจ้งให้ชุด HL ทำการตัด DDE หน้าวัดหนองผือ แยกออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ						
10	เมื่อชุด HL ทำการตัด DDE หน้าวัดหนองผือ แยกออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กฟส.ดช. รับทราบ						
12	แจ้งชุดทำงาน กฟส.ดช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งชุดทำงาน กฟส.ดช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
14	เมื่อ กฟส.ดช. ทำการลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
15	DAA09R-03	Nonreclosing	Normal		ดช.		R ปลักประตุ
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
18	DAA09R-03	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ปลักประตุ
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	แจ้งชุดทำงาน กฟส.ดช. ทำการปลด Short Ground จุด G1 และ G2						
21	เมื่อชุดทำงาน กฟส.ดช. ทำการปลด Short Ground จุด G1 และ G2 แล้วเสร็จ						
22	แจ้งชุด HL ทำการเชื่อม DDE หน้าวัดหนองผือ เข้าสนิททั้ง 3 เฟส						
23	แจ้งชุด HL ทำการเชื่อม DDE หน้าวัดหนองผือ เข้าสนิททั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
24	ย้ายโหลด DAA09 กลับสภาพปกติ						
25	DAA09S-22	ปลด, ล็อคคาน	สับ		SAA		SF6 บ้านปลักประตุ
26	DAA09S-16	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS บ้านดงเสลา
27	DAA09R-03	Nonreclosing	Normal		ดช.		R ปลักประตุ
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							

แผนผังพอสังเขปงานย้ายแนวบ้านปรักประตู 15 - 16 กรกฎาคม 2567 09.00-17.00 น.  
( ก่อหน้าไฟฟ้า )

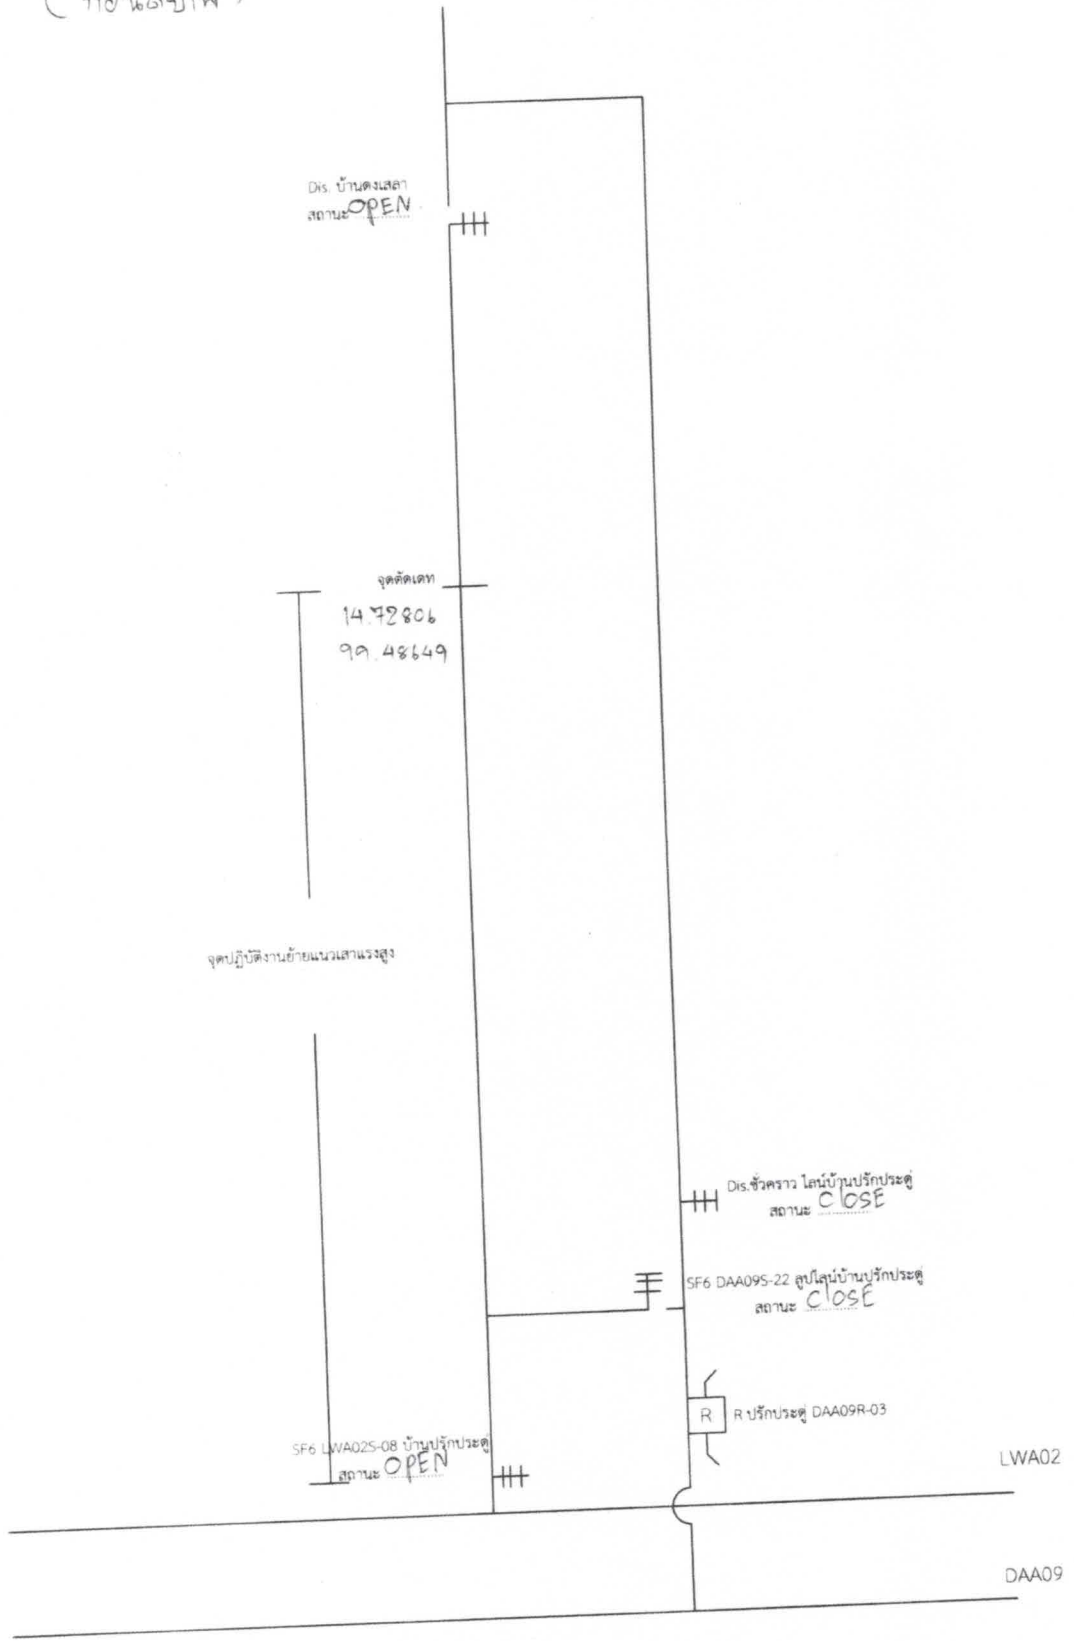

แผนผังพอสังเขปงานย้ายแนวบ้านปรักประตู้ 15 - 16 กรกฎาคม 2567 09.00-17.00 น.  
C หลังชุดขั้วไฟ

