



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

ส่งทางสารบรรณเลขที่รอนกส

วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔

Switching Deadline

วันที่ ๙ มิ.ย. ๖๔

เลขที่ ก.๓.สค.ปบ. ๓๑๗๐ /๒๕๖๔
 ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
 ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แนนเหนือ

วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า กฟภ.สค.ชั้น๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
THS๑๓	๑๑ ก.ค.๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	รื้อถอน SF๖ รหัส THS๑๓S-๐๕ และต่อ ตรง เนื่องจาก SF๖ Low Gas บริเวณ บ.อยู่ยง อุตสาหกรรม	THS๑๓S-๐๒ ปากช.กระเบื้อง -สีลา 1๕๐ ม.แนวสาย ใหม่	THS๑๓S-๐๓ ในปากชอย และ ปลายสาย	นายธีรพัฒน์ สุทธิสา โทร.๐๘๙-๑๑๐๑๔๙๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)บริเวณ ชอย ๑๖ นวางสวน.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอำนาจ เวียนทองตำแหน่ง ท.ผ.ปบ.โทร. ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐.....

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายมาโนช แนนเหนือ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.สค.ชั้น๑.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ THS13 จาก THS13S-02 ถึง THS13S-03 , ปลายสาย THS13S-03
- ในวันที่ 11 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 912
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
- ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
- ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
- ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
- ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....


พนักงานศูนย์ฯ นาย อภสรวิทย์ เก่งหงู ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอำนาจ เก่งหงู

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓๑.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายอภสรวิทย์ เก่งหงู)
วอภ. ๓๓-๓๓๓.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

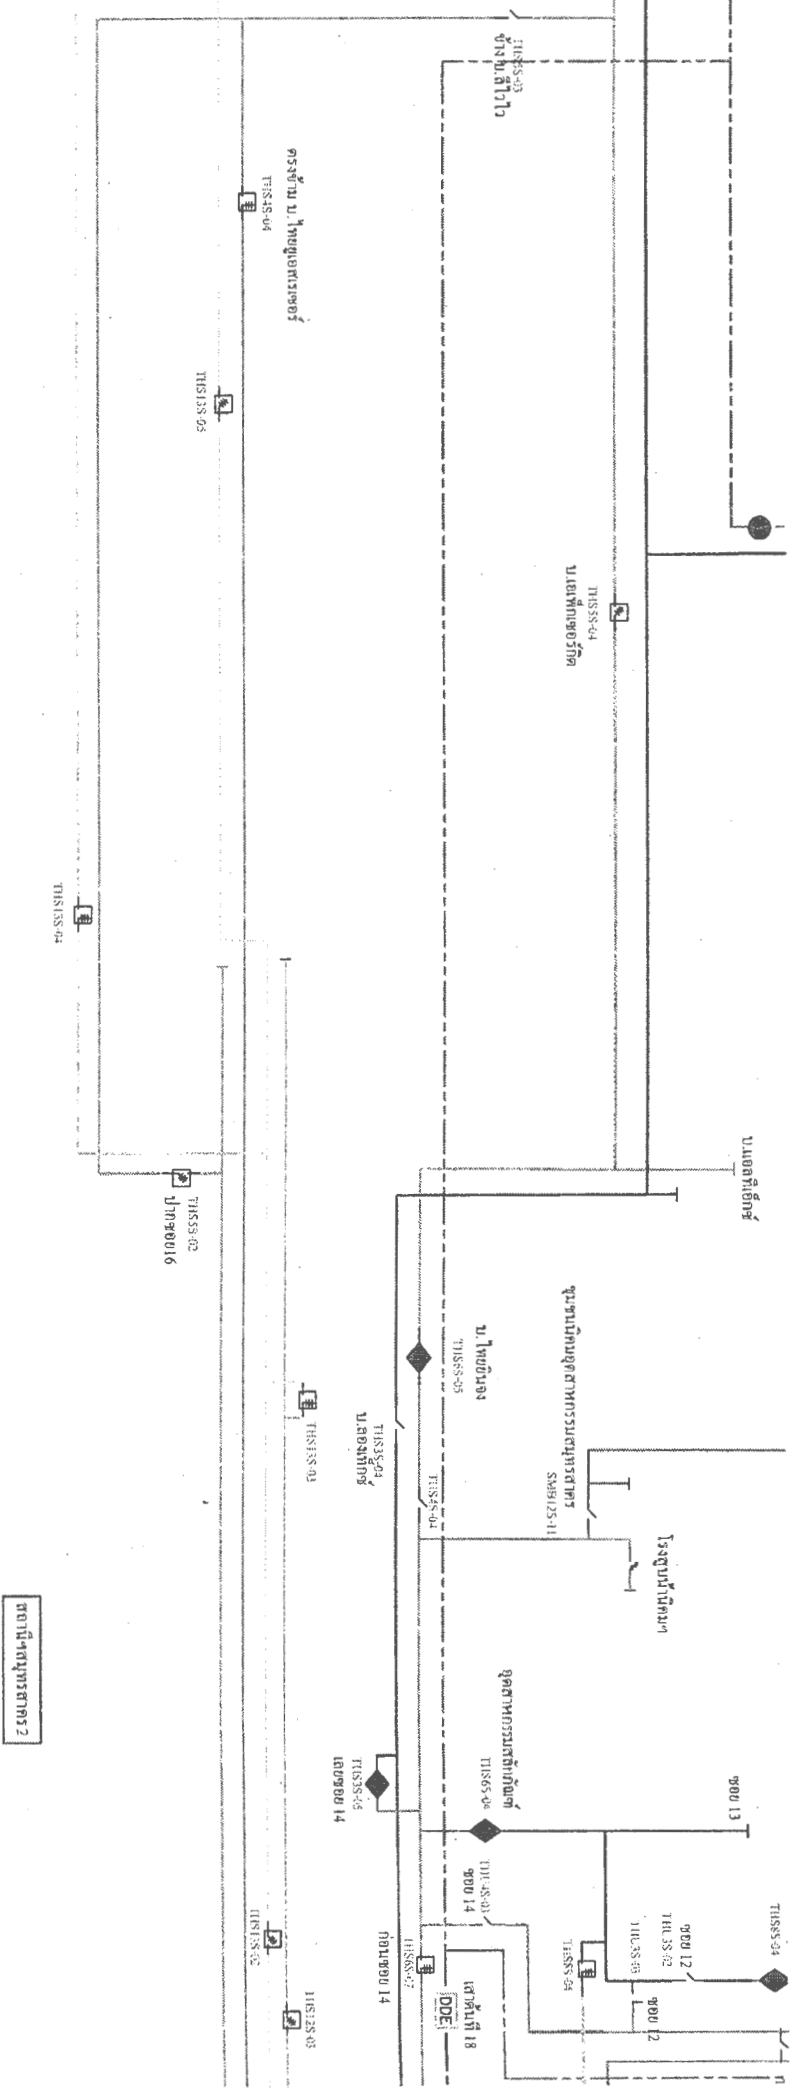

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

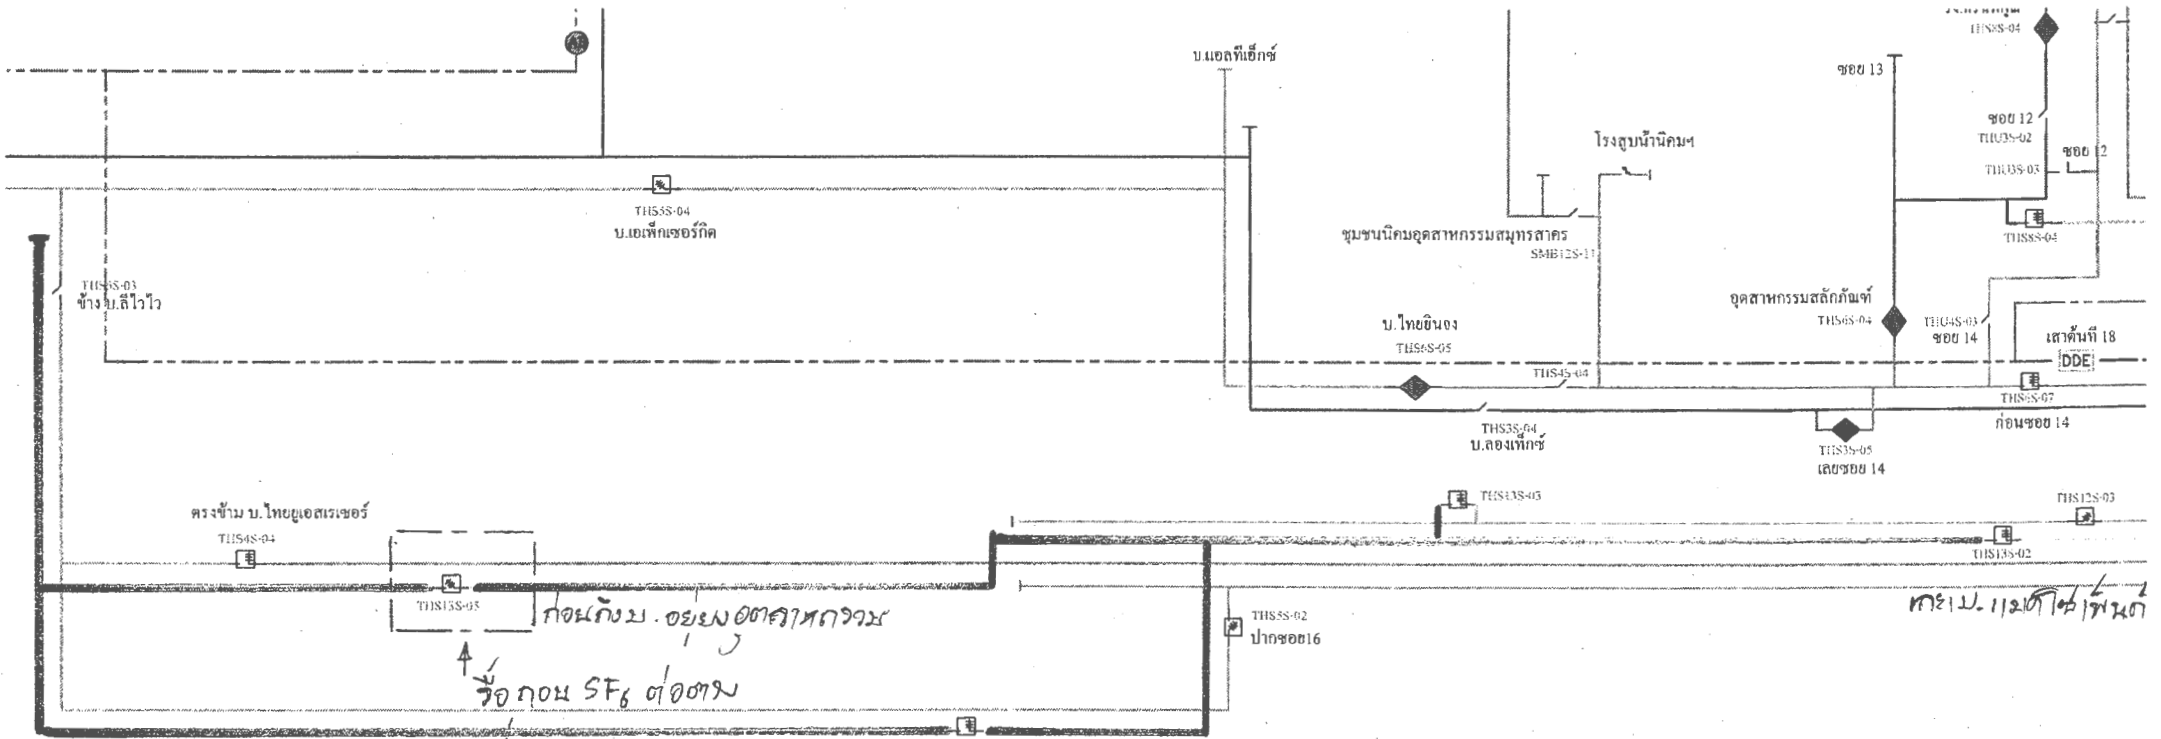
1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ซ.16 บางส่วน (วงจร THS13)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	15.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	รี้อถอน SF6 รหัส THS13S-04	ตามใบขอปฏิบัติงาน	912/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	8 กรกฎาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 กรกฎาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 กรกฎาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเกษมศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	กฟจ.สค.ดำเนินการรี้อถอน รี้อถอน SF6 รหัส THS13S-04 ก่อนถึง บ.อยู่ยงอุตสาหกรรม ด้วยวิธี Hot Line (ไม่มี Shot Ground)						
3	THS13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 09.00 น.						
5	THS13S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 เลย บ.แมคโซเฟ้นท์
6	แจ้ง กฟจ.สค. ตรวจสอบ SF6 รหัส THS12S-03 ปากซอย 16 อยู่สถานะ "OPEN" พร้อม "ล็อคคาน"						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
8	THS13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
10	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	THS13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
12	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
13	THS13S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 เลย บ.แมคโซเฟ้นท์
14	THS13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

สถานีควบคุมจราจร



การนำจ่ายไฟต่อบัสบาร์เดิม



ก่อนถึงบ. อยู่ยอดอาคารถาวร
 ↑
 รั้วก่อน SF₆ ต่อด่าน
 ฝั่งทาก Low gas
 ใต้รั้ว ซัดยอดอาคาร
 ทางเข้า
 9 ม. จาก ซัดยอด 16

สถานีสมุทรสาคร 2

กรณี 11.2.21 ใต้รั้วต้นตอ
