



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

5 ก.ค. 67

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๓๓๑๑ /๒๕๖๗

วันที่ - ๑ ก.ค. ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ตำแหน่ง ออ.ปน.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค

ด้วยการไฟฟ้า.....กฟส.สค.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV แนวถนนสวนส้มตั้งแต่ปากซอยพัฒนา ถึง CT แบ่งแดน สมุทรสาคร/บ้านแพ้ว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMZ๐๒	๗ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV แนวถนนสวน ส้มตั้งแต่ปากซอยพัฒนา ถึง CT แบ่งแดน สมุทรสาคร/บ้านแพ้ว	SMB๑๒S-๑๓ ก่อนปากซอย พัฒนา	BAL๐๕S-๐๖ ในซอยพัฒนา	นายนิทัศน์ เตชะ วันโต โทร. ๐๘๑๕๕๒๓๐๕๕
๒	SMZ๐๒	๗ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๒S-๑๓ ก่อนปากซอย พัฒนา	KTE๐๒S-๐๘ แยกวัดเกาะ	
๓	KTE๐๓	๗ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ KV หน้าโสกถนนการ ช่าง	KTE๒S-๐๘ ปากทางวัดเกาะ	
๔	SMZ๐๓	๗ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ KV ก่อนปากซอย พัฒนา	KTE๐๒S-๑๒ แยกวัดเกาะ	
๕	KTE๐๒	๗ ก.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราว ก่อนปากทางวัด อำแพง	KTE๐๒S-๑๒ ปากทางวัดเกาะ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ แนวถนนสวนส้มตั้งแต่ปากซอยพัฒนา ถึง CT แบ่งแดน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจิรวัดน์ บุญพร้อม.....ตำแหน่ง.....พชง.๖.....โทร.....๐๘๖-๓๘๓๒๐๕๐.....

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมี)โอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....


(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SMZ02 จาก SMB12S-13 ถึง BAL5S-06
ในวันที่ 7 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 912/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ SMZ02 จาก SMB12S-13 ถึง KTE2S-08
ในวันที่ 7 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ KTE03 จาก ODE หน่วยโกลนนครถึง KTE2S-08
ในวันที่ 7 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พัดเตอร์ SMZ03 จาก ODE หน่วยโกลนนครถึง KTE2S-12
ในวันที่ 7 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พัดเตอร์ KTE02 จาก บิรจักรการช่างนครถึง KTE2S-12
ในวันที่ 7 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นพิต ราชบุรีนิคม ประสานงานการขอดับไฟกับ ทนายวิวัฒน์ บุญอ่อน


(นายวิวัฒน์ บุญอ่อน)
จก.๔ 11คน นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓๐๑, กฟภ. นคร.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ..... 2แผ่น



ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนสวนส้ม				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	7 ก.ค. 67 17.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 912/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม				วันที่ 2 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 2 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 2 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน 2. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMZ02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		-
3	SMZ03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		-
4	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
5	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
6	SMB12S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ก่อนปากซอยพัฒนา (SMZ02)
7	DIS ชั่วคราว (KTE02)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ก่อนปากทางวัดอำแพง (KTE02)
8	แจ้งกฟส.สค. โหลด โหลด บริเวณแยกวัดเกาะ-หน้าโสมการช่าง (KTE03)						
9	เมื่อกฟส.สค. โหลด โหลด บริเวณแยกวัดเกาะ-หน้าโสมการช่าง (KTE03) แล้วเสร็จ						
10	แจ้งกฟส.สค. โหลด โหลด บริเวณก่อนปากซอยพัฒนา (SMZ03)						
11	เมื่อกฟส.สค. โหลด โหลด บริเวณก่อนปากซอยพัฒนา (SMZ03) แล้วเสร็จ						
12	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าตัดเดท บริเวณหน้าโสมการช่าง (KTE03) ตามผังแนบ						
13	เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้าตัดเดท บริเวณหน้าโสมการช่าง (KTE03) ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
14	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าตัดเดท บริเวณก่อนปากซอยพัฒนา (SMZ03) ตามผังแนบ						
15	เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้าตัดเดท บริเวณก่อนปากซอยพัฒนา (SMZ03) ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
21	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
22	SMZ02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ		-
23	SMZ03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ		-
24	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
25	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
26	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
27	SMZ02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		-
28	SMZ03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		-
29	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
30	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

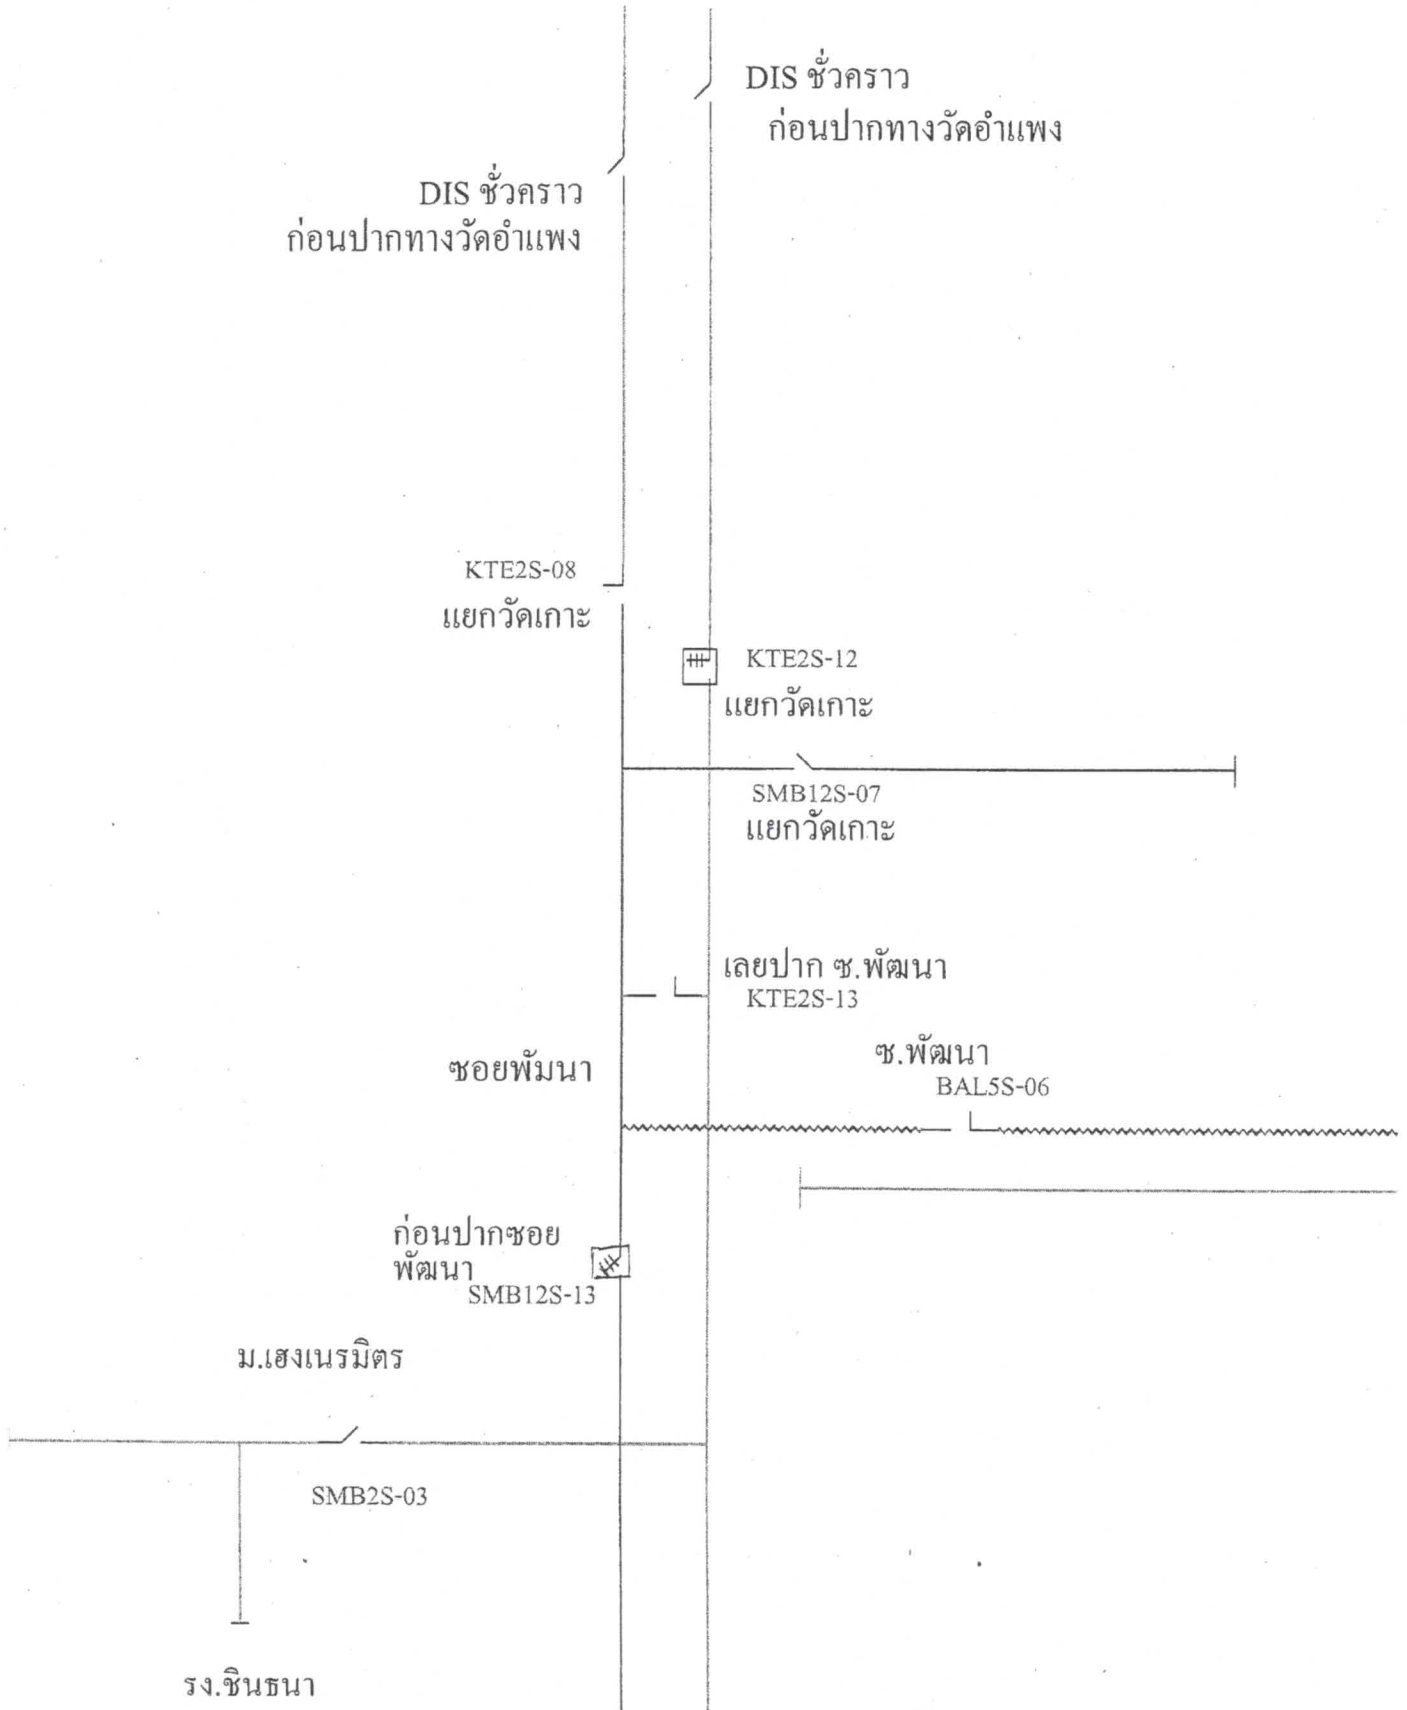

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

KTE3 KTE2

DIS ชั่วคราว
ก่อนปากทางวัดอำแพง

DIS ชั่วคราว
ก่อนปากทางวัดอำแพง

ตัดดีเบรกโดยวิธีฮอทไลน์
กระแส 22 kV หน้า โสภณการช่าง

G3

G4

KTE2S-08
แยกวัดเกาะ

KTE2S-12
แยกวัดเกาะ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

SMB12S-07
แยกวัดเกาะ

เลขปาก ช.พัฒนา
KTE2S-13

ซอยพัฒนา

ช.พัฒนา
BAL5S-06

G1

G2

ก่อนปากซอย
พัฒนา
SMB12S-13

จุดตัดดีเบรกโดยวิธีฮอทไลน์
กระแส 22 kV ก่อนปากซอยพัฒนา

ม.เฮงเนรมิตร

SMB2S-03

รง.ชินชนา

SMB2S-02 SMB2S-03

