



Switching Deadline
วันที่ 14 ก.ค. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ๒๐๓ กบ.ป.บ. ๒๕๑ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์จันทร์
ชื่อผู้ส่ง นายสมมติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง สก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ศรีประจันต์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง หลังรีโกลสเซอร์ตงซีเหล็ก หมู่ที่ ๗ ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPC01 หลังรีโกลสเซอร์ SPC01R-01 รวมทรัพย์สินตงซีเหล็ก	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง เป็นสายเคเบิล SAC ๑๘๕ ค.ม.ม.	DIS ชั่วคราว ก่อนถึงศาลเจ้าพ่อต้นแค	DIS ชั่วคราว ตลาดนัดก่อนถึงสะพานจองชัย	นายจิระยุทธ อาจศิริ โทร.๐๘๗-๑๕๗-๗๕๐๕
๒.	SPC01 หลังรีโกลสเซอร์ SPC01R-01 รวมทรัพย์สินตงซีเหล็ก	๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง เป็นสายเคเบิล SAC ๑๘๕ ค.ม.ม.	DIS ชั่วคราว ก่อนถึงศาลเจ้าพ่อต้นแค	SF6 DBA03S-11 บ้านวังหว้า	นายจิระยุทธ อาจศิริ โทร.๐๘๗-๑๕๗-๗๕๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟฟ้าดับ) มีหลอดยูไอไฟ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิระยุทธ อาจศิริ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ศรีประจันต์ โทร. ๐๘๗-๑๕๗-๗๕๐๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสงของ กฟส. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง

(นายสมมติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผกฟ.) ๓๗๕.๓
เรียน สก.บ.บ.(ก.๓)

ผกฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SPC01 จาก Dis ๖๐.๐๐๐๖๕๗๕๗๕ Dis ๖๐.๐๐๐๖๕๗๕๗๕
ในวันที่ 17-๑-๒๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 913/๒

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย กฤษณะ วัฒนศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒๐๗:๒๒๗ ๒๐๗:๒๒๗

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.ศรีประจันต์

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสมมติ ยศศักดิ์ศรี)
สก.บ.บ.(ก.๓) ๒๕๑/๒๕๖๔

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผกฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน สก.บ.บ.(ก.๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ศาลเจ้าพ่อต้นแค - ตลาดนัดก่อนสะพานจองชัย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศปจ.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	913/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักนตรสาคร			วันที่	9 กรกฎาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 กรกฎาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 กรกฎาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	Load = 10.54 MW
3	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	Load = 3.02 MW
4	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	Load = 4.80 MW
5	SPC01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.	R	รวมทรัพย์สินถาวรดึงขึ้นเหล็ก
6	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load = 11.16 MW
7	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load = 2.01 MW
8	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ SPC01						
9	SPC01S-11	ปลด	สับ		ศปจ.	DIS	หน้าวัดปุ้เจ้า
10	SPC01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.	DIS	หน้าป้อมตำรวจบ้านกล้วย
11	ย้ายโหลด SPC01 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA03						
12	DBA03S-07	ปลด	สับ		สข.	SCADA SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
13	DBA03S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สข.	SF6	ร้านเทเลวิซ
14	Dis ชค. SPC01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.	DIS	ตลาดนัดก่อนถึงสะพานจองชัย
15	DBA03S-07	สับ	ปลด		สข.	SCADA SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
16	เมื่อพร้อมดับไฟ						
17	Dis ชค. SPC01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.	DIS	ศาลเจ้าพ่อต้นแค
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
21	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	-
22	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	-
23	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	-
24	SPC01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.	R	รวมทรัพย์สินถาวรดึงขึ้นเหล็ก
25	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
27	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้							
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
28	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1							
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2							
31	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-	
32	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	
33	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	
34	SPC01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.		R	รวมทรัพย์สินถาวรตั้งขึ้นเหล็ก
35	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
36	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	
37	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
38	Dis ชค. SPC01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS	ศาลเจ้าพ่อต้นแค
39	ย้ายโหลด SPC01 บางส่วนกลับจาก DBA03							
40	DBA03S-07	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
41	Dis ชค. SPC01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS	ตลาดนัดก่อนถึงสะพานจองชัย
42	DBA03S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		SF6	ร้านเทเลวิซ
43	DBA03S-07	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
44	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ SPC01 คิน							
45	SPC01S-10	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS	หน้าป้อมตำรวจบ้านกล้วย
46	SPC01S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS	หน้าวัดปู่เจ้า
47	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	-
48	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
49	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
50	SPC01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.		R	รวมทรัพย์สินถาวรตั้งขึ้นเหล็ก
51	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
52	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ดับไฟเพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นสายเคเบิล 185 SAC

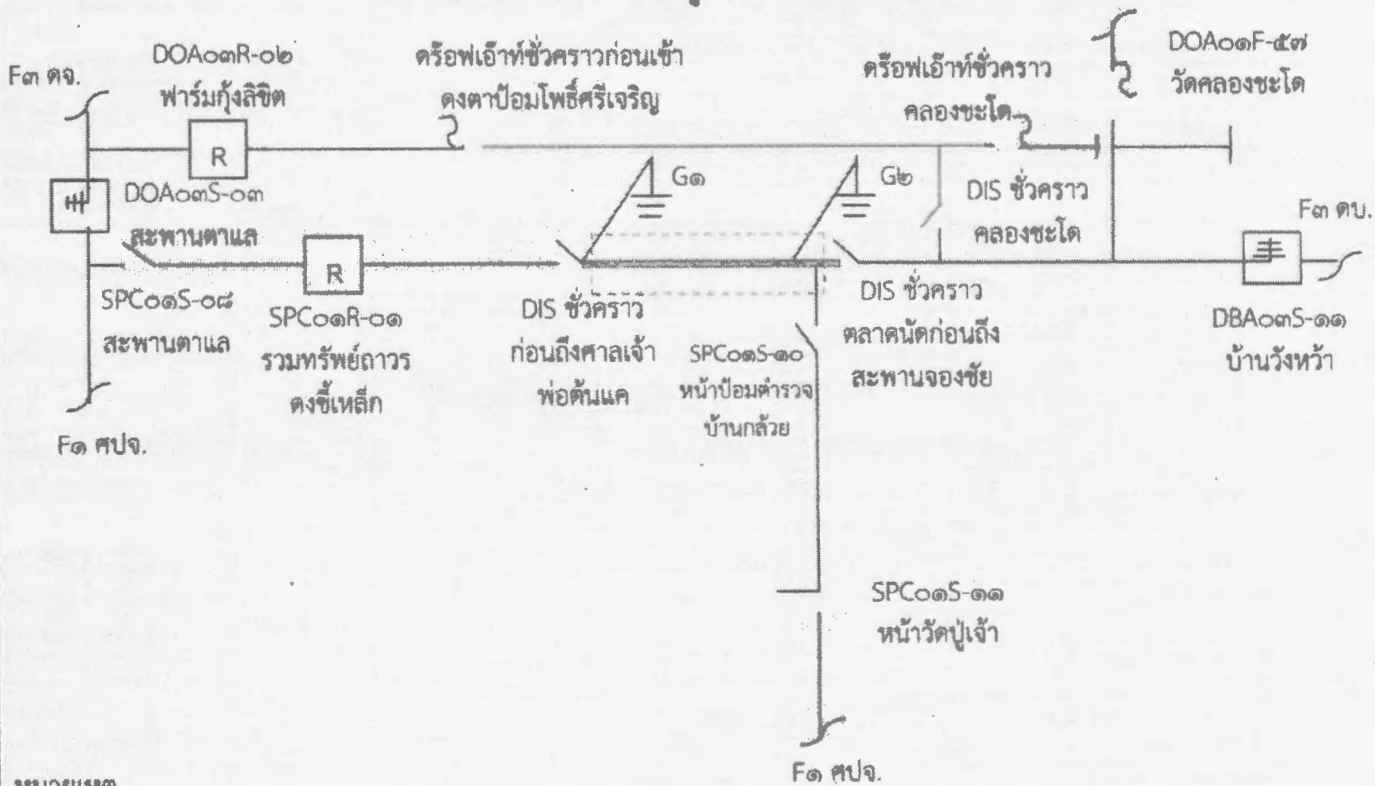

หมายเหตุ

๑. ดับไฟเพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากสายเปลือยเป็นสายเคเบิล ๑๘๕ SAC
๒. วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๓. ตั้ง F๑ คบ.อยู่ Manual
๔. จ่าย DIS SPC๐๑S-๑๑ หน้าวัดปู่เจ้า
๕. ปลด DIS SPC๐๑S-๑๐ หน้าบ่อมตารวจบ้านกล้วย
๖. ตั้งรีโคลสเซอร์ SPC๐๑R-๐๑ ดงซีเหล็ก อยู่ Nonrecloseing ตั้ง F๓ คบ.อยู่ Manual
๗. จ่าย SF๖ DBA๐๑S-๑๑ บ้านวังหว้า
๘. ปลด DIS ชั่วคราวตลาดนัดก่อนถึงสะพานจองชัย
๙. ปลด DIS ชั่วคราวก่อนถึงศาลเจ้าพ่อต้นแค
๑๐. จั้ม ซ็อกกราวด์ G๑ , G๒
๑๑. แจ้งช่างดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงได้
๑๒. ตั้ง F๑ คบ.อยู่ AUTO
๑๓. ตั้งรีโคลสเซอร์ SPC๐๑R-๐๑ ดงซีเหล็ก อยู่ Normal ตั้ง F๓ คบ.อยู่ AUTO
๑๔. งานแล้วเสร็จ
๑๕. ตั้งรีโคลสเซอร์ SPC๐๑R-๐๑ ดงซีเหล็ก อยู่ Nonrecloseing
๑๖. ปลด ซ็อกกราวด์ G๑ , G๒
๑๗. จ่าย DIS ชั่วคราวก่อนถึงศาลเจ้าพ่อต้นแค
๑๘. ตั้งรีโคลสเซอร์ SPC๐๑R-๐๑ ดงซีเหล็ก อยู่ Normal
๑๙. เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
