



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยขอตัดไฟ

Switching Deadline

17/07/67

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 02289
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิสุวรรณ์ชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยัตเส็ง

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงท้ายซอยหมอศรี ตามแผนผัง
สังเขบนับ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OY1๐๕	๒๑ ก.ค.๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ท้ายซอยหมอศรี	OY1๕S-๐๖	-Disชค.หมอศรี ช.๘ - OY1๕S-๐๗ -ปลายสาย	นายนพดล ปักษาทอง ๐๘๘-๙๔๖๒๖๕๙
๒	OY1๐๗					Disชค. ซอยรุ่ง๙	-OY1๕S-๐7 -ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ใน ซอยหมอศรี ตั้งแต่หมอศรี ช.๘ - ท้ายซอย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat : Long :
๓.๒ สิ้นสุด Lat : Long :

ลงชื่อ (นายพิชา ตันยัตเส็ง)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ OY15 จาก OY15S-06 ถึง Disชค. หมอศรี ช.๘, OY15S-07, ปลายสาย
ในวันที่ 21 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 931/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ OY1 จาก Disชค. ซอยรุ่ง๙ ถึง OY15S-07, ปลายสาย
ในวันที่ 21 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิธนา ลิ้มศรีโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกนิม
2 ก.ค. 67

(นายวิธนา ลิ้มศรีโพธิ์แก้ว)
ท.ก.๖ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สพร.
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน
แผนผังแนบ 2 แผน

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)



ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | ท้ายซอยหมอศรี | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 21-ก.ค.-67 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กพอ.สพร. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 931/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว | | วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิรวัดณ์,วัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ ติดตั้ง DIS ชค. บริเวณข้าง OYI05S-07 และเปลี่ยนวงจรการจ่ายไฟให้บริษัท TPBI							
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
3	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
4	ย้ายโหลด OYI05 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก OYI07						
5	OYI05S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 บ้านพักผู้สูงอายุ
6	DIS ชค. OYI05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชค. หมอศรีซอย 8
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	OYI05S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ท้ายซอยคานะโบ
9	DIS ชค. OYI07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชค. ซอยรุ่น 9
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
14	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
15	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
สิ้นสุด Switching แรก							
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
17	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
18	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
21	ตรวจสอบ DIS ชค. บริเวณข้าง OYI05S-07 (ติดตั้งใหม่) อยู่สถานะ "เปิดออกจากกันทั้งสามเฟส"						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	OY105S-06	ปลด	สับ		สพร.		DIS ทำยชอยคานะโป้
24	OY105S-07	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าโรงทำตะกร้อ
25	DIS ชค. OY105	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชค. หมอศรีชอย 8
26	OY105VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
27	OY107VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานีคอมใหม่ 1

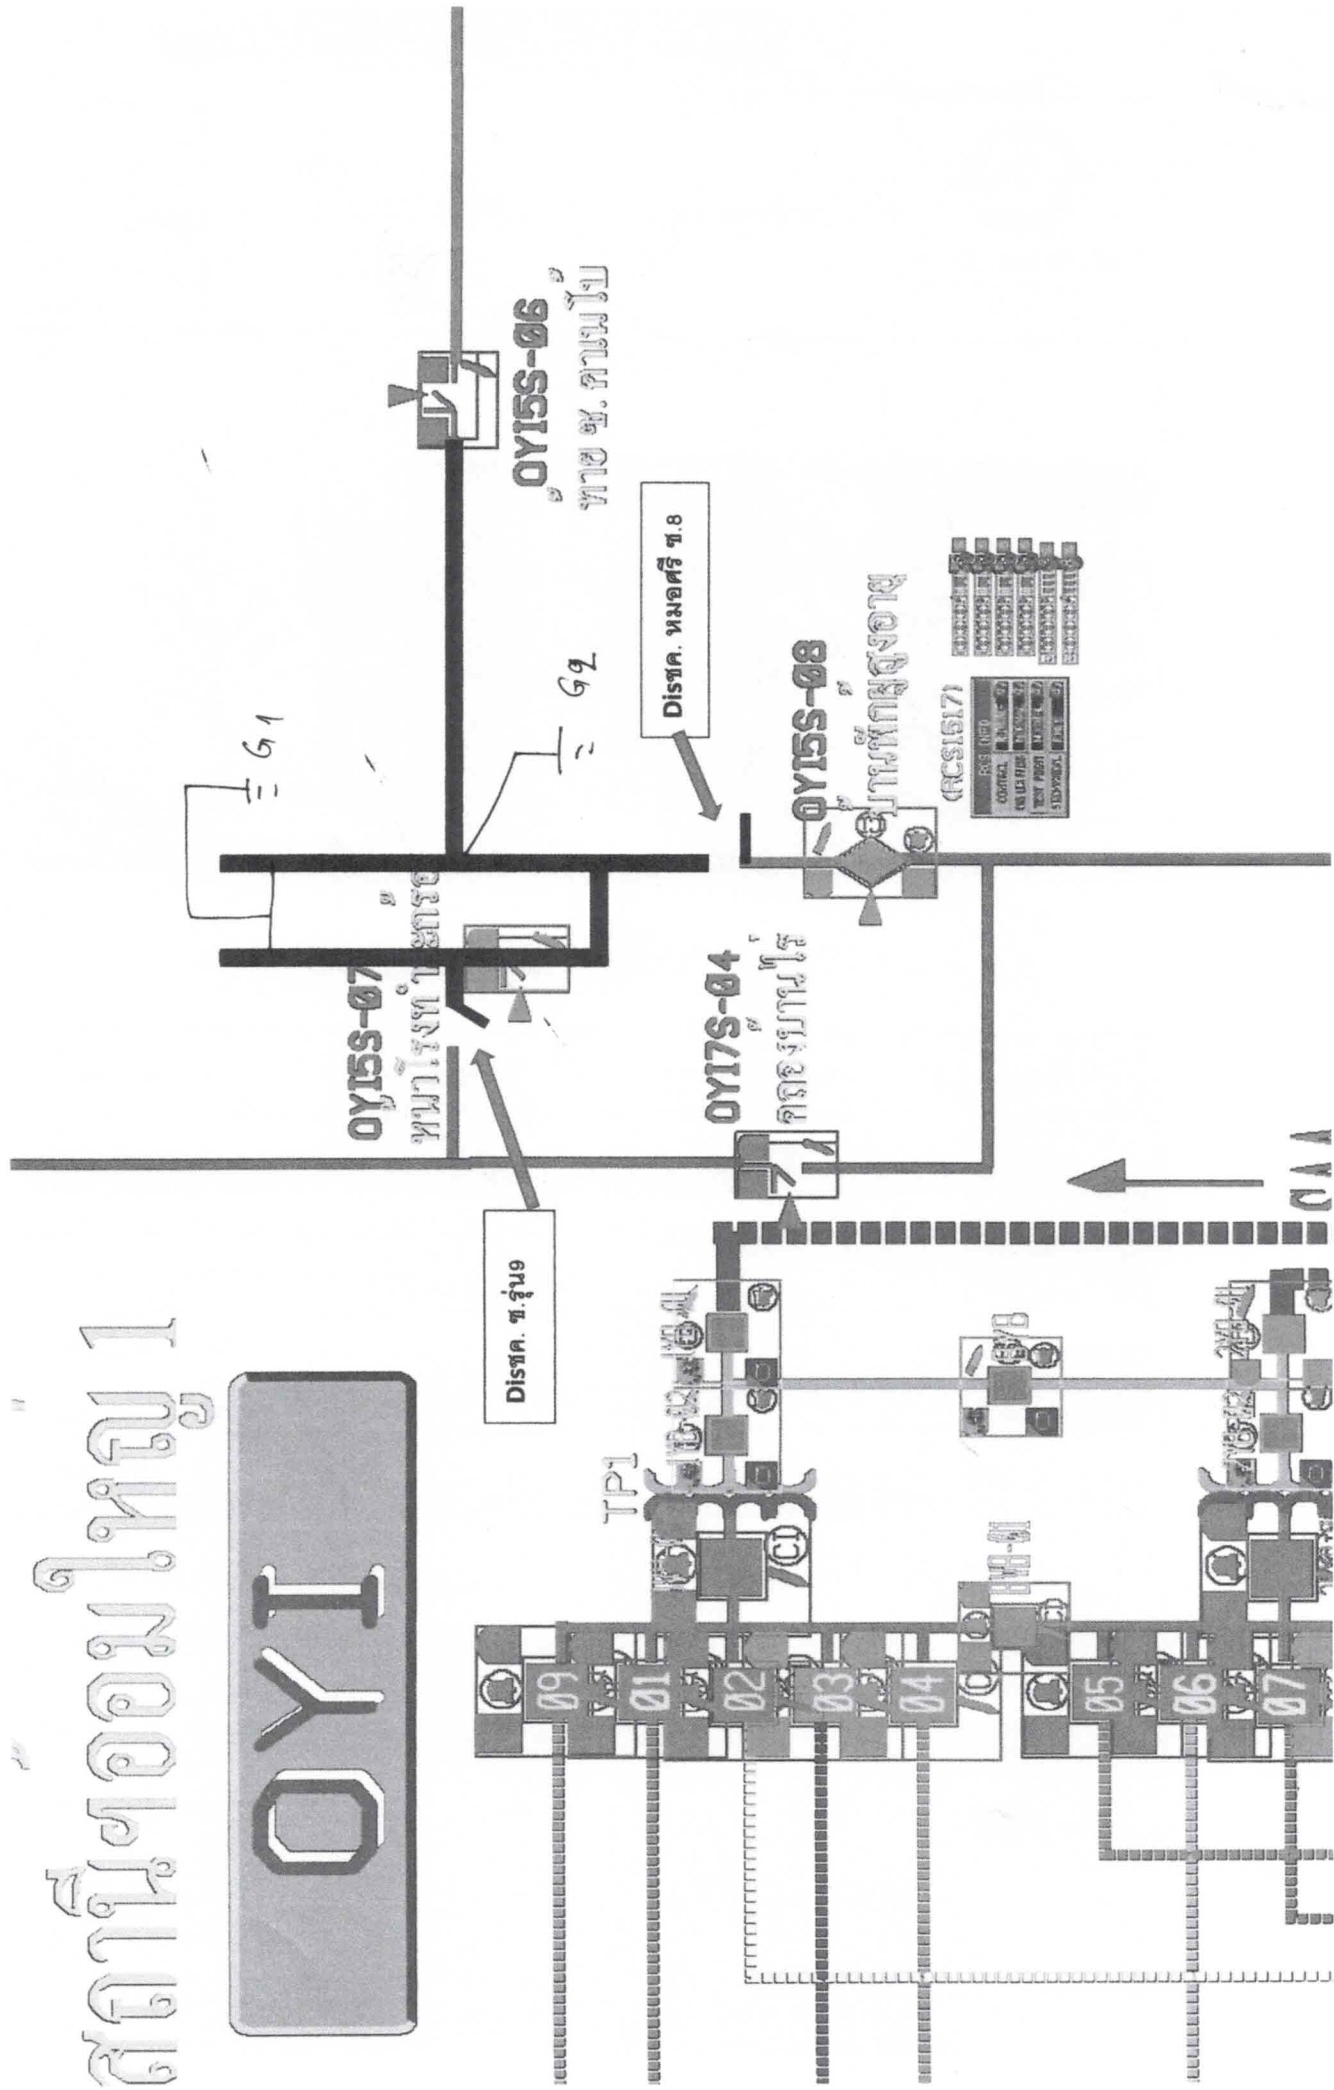

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
ท้ายซอยหมอศรี(หลังท่า)

สถานีคอมพิวเตอร์ 1

