



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 14 ก.ค. 64

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๑๗๗๖/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักคพงศ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บั๊กเสาดำเนินแรงสูงบริเวณหมู่ ๔ ต.สวนหลวง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๕ KTA	๑๘ ก.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อให้ ผจก.กทบ. ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บั๊กเสาดำเนิน บริเวณหมู่ที่ ๔ ต.สวนหลวง	DIS KTA ๕S-๐๕	DIS KTA ๕S-๐๘	นายเติมศักดิ์ วิริยพรสวัสดิ์ พงษ.๗ ผจก.กทบ. โทร. ๐๘๖-๓๕๓๖๑๔๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานจำนวน ๑๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ผ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTA 05 จาก DIS KTA 5S-05 ถึง DIS KTA 5S-08
ในวันที่ 18 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 932/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย

สำหรับผู้อนุมัติ

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)
รจก. (ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ.

แผนผังแนบ 2 แผ่น

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ผจก. (สถานีฯ)

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ


นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้ว

เสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน หมู่ 4 ตำบลสวนหลวง (KTA05)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18 ก.ค. 64 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.ดบ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 932/64
 ปักเสาใต้ไลน์ 115kV
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสุธี ศรีเพ็ชร วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นาย (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- Load 2.87 MW
3	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
4	KTA05S-05	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS หมู่บ้าน พฤษภลดา
5	ตรวจสอบ KTA05S-07 อยู่ตำแหน่ง <u>ปลด</u> , <u>ล็อกคาน</u>						
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
8	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
9	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
10	แจ้ง กฟอ.ดบ ปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
11	เมื่อ กฟอ.ดบ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
13	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
14	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ เวลา 08.00 น.						
16	KTA05S-05	ปลด	สับ		กทบ.		DIS หมู่บ้าน พฤษภลดา
17	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณหมู่ที่ 4 ต.สวนหลวง
 เพื่อให้ ผศ.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี บีกเสาแรงสูงขนาด 12.20 เมตร ได้โดย
 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.
 WBS: I-63-I-KTN64.MS.2002
 (ตามอนุมัติ ก.3 กทบ.(ปบ.)- 102 ลว. 22 ต.ค. 2563)

หมายเหตุ

มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจำนวน 15 ราย

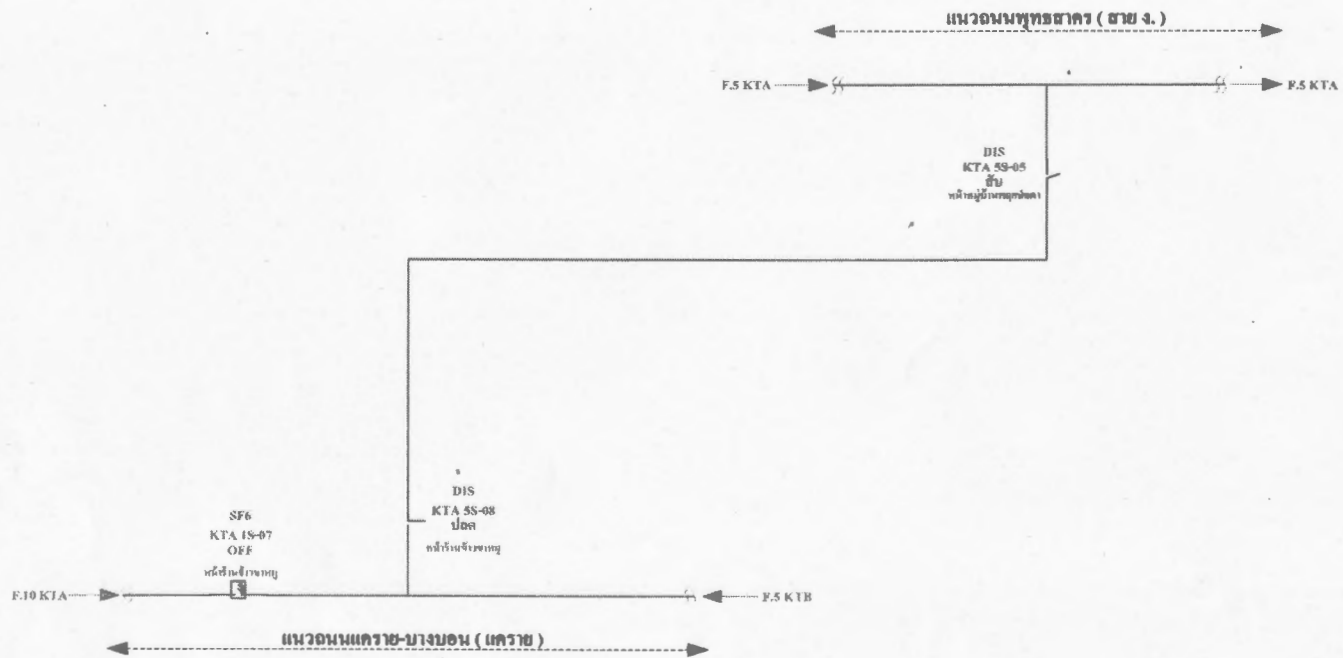

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณหมู่ที่ 4 ต.สวนหลวง
 เพื่อให้ ผศ.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ปีกเสาแรงสูงขนาด 12.20 เมตร ได้โดย
 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.
 WBS: I-63-I-KTN64.MS.2002
 (ตามอนุมัติ ก.3 กทบ.(ป.บ.)-102 ลว. 22 ต.ค. 2563)

หมายเหตุ

มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจำนวน 15 ราย

▼
 วงจรไลน์เฟสเคอร์ 5 กทบ.1 เส้นที่บดดับไฟปฏิบัติงาน

จุด Shot Ground (G.1 - G.2)

