

Switching Deadline

13 มิ.ย. 66



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.๓.สปจ. (ก.๓) ๖๓๒ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธอนันท์ ธีรสุวรรณรงค์
ชื่อผู้ส่ง นายไกรสร พวงทอม

วันที่ .. ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง .. อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง .. ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์

ด้วย กฟส.อ.ศรีประจันต์ ขอตัดไฟเพื่อแก้ไขลูกถ้วยแขวนและสายแรงสูงอาร์คชำรุด บริเวณวัดน้อยขมภู ต.มดแดง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPC๐๓	๑๔ มิ.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	แก้ไขสายแรงสูงอาร์คชำรุด บริเวณวัดน้อยขมภู	จุดตัด DDE (F๓)	Dis ศาลาแม่พระ SPC๓S-๐๓	นายจิระยุทธ อางศิริ โทร.๐๘๗-๑๕๗-๗๖๐๕
๒.	SPC๐๔	๑๔ มิ.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	แก้ไขสายแรงสูงอาร์คชำรุด บริเวณวัดน้อยขมภู	จุดตัด DDE (F๔)	DIS ชค. วัดน้อยขมภู	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)..... หม้อแปลง กฟส. ๕ เครื่อง หม้อแปลงผู้ใช้ไฟ ๒ เครื่อง

ผู้ประสานงานการดับไฟ..... นายธวัช เขียวขำ..... ตำแหน่ง..... พชง.๖ ผก.กฟส.อ.ศรีประจันต์..... โทร. ๐๖๕-๘๗๘-๘๕๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายไกรสร พวงทอม)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์

สำหรับแผนกควบคุมการตัดไฟ (ผคฟ) กฟท.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ในวันที่ 14 มิ.ย. 66 อนุมัติตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SPC๐3 จาก DDE ถึง SPC3S-๐3
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 14.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 940/66
ในวันที่ 14 มิ.ย. 66 อนุมัติตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ SPC๐4 จาก DDE ถึง DU ๕๓. ล้อหม้อของแม่

พนักงาน นาย มนัส ทอดน้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางธนัช ไชยวาท

(Signature)
(นายนิกร โพธิ์พงษ์)
จุดก-4 แทน นพคพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๕๓๒

อ.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.(๒)

อนุมัติ และแจ้ง จป. ตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวัดน้อยชมภู-จุดตัดเตส		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 มิ.ย. 66	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศบจ.	งานที่ทำ	แก้ไขสายแรงสูงอาร์กชำรุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 940/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนเฑาะ ทงย้อย		วันที่ 11 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
3	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		
4	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		
5	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
7	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงรวมการกีฬา
8	-ย้ายโหลด SPC03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPA05						
9	SPA05S-06	ปลด	สับ		รถ ศบจ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
10	SPA04S-07	ปลด	สับ		รถ สพ.	SF6	สวนยอมแยกโพธิ์พระยา
11	SPC03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ศบจ.	DIS	ศาลาแดงพระ
12	-ย้ายโหลด SPC04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPA04						
13	SPC04S-06	ปลด	สับ		รถ ศบจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธิ์ประมุข
14	Dis ชค. SPC04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ศบจ.	DIS	วัดน้อยชมภู
15	SPA04S-06	สับ	ปลด		รถ ศบจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธิ์ประมุข
16	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
17	แจ้งช่าง กฟส.ศบจ. โหลดโหลดหม้อแปลง ในไลน์ SPC 03,04VB-01 ออกทั้งหมด						
18	หลังจาก กฟส.ศบจ. โหลดโหลดหม้อแปลง ในไลน์ SPC 03,04VB-01 ออกทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย						
19	แจ้งชุด Hotline 115 เควี ตัด DDE SPC 03,04VB-01 ออกทั้ง 3 เฟสตามผังแนบได้ ตัดเตสแบบมีไฟ						
20	หลังจากชุด Hotline 115 เควี ตัด DDE SPC 03,04VB-01 ออกทั้ง 3 เฟสตามผังแนบเสร็จเรียบร้อย						
21	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
22	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
23	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
24	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
25	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
26	หลังจาก กฟส.ศบจ. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
27	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
29	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
30	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
31	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
32	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
33	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
34	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
35	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
36	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
37	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3						
38	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G4						
39	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
40	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		
41	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		
42	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
43	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
44	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
45	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
46	แจ้งชุด Hotline 115 เควี จัม DDE SPC 03,04VB-01 เข้าทั้ง 3 เฟสตามผังแนบได้ จัมเดสแบบมีไฟ						
47	หลังจากชุด Hotline 115 เควี จัม DDE SPC 03,04VB-01 เข้าทั้ง 3 เฟสตามผังแนบเสร็จเรียบร้อย						
48	แจ้งช่าง กฟส.ศปจ. นำโหลดหม้อแปลง ในไลน์ SPC 03,04VB-01 เข้าทั้งหมด						
49	หลังจาก กฟส.ศปจ.นำโหลดหม้อแปลง ในไลน์ SPC 03,04VB-01 เข้าทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย						
50	-ย้ายโหลด SPC04 บางส่วนกลับจาก SPA04						
51	SPC04S-06	ปลด	สับ		รถ ศปจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธิประมุข
52	Dis ชค. SPC04	ปลด	สับ		รถ ศปจ.		DIS วัดน้อยชมภู
53	SPC04S-06	สับ	ปลด		รถ ศปจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธิประมุข
54	-ย้ายโหลด SPC03 บางส่วนกลับจาก SPA05						
55	SPC03S-03	ปลด	สับ		รถ ศปจ.		DIS ศาลาแพงพระ
56	SPA05S-06	สับ	ปลด		รถ ศปจ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
57	SPA04S-07	สับ	ปลด		รถ สพ.		SF6 สวนย่อมแยกโพธิ์พระยา
58	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
59	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
60	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
61	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
62	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
63	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

**แผนดับไฟ แก้ไขลูกถ้วยแขวนและสายแรงสูงอาร์คชำรุดบริเวณวัดน้อยชมพู
ในไลน์ F3,F4 ศรีประจันต์**

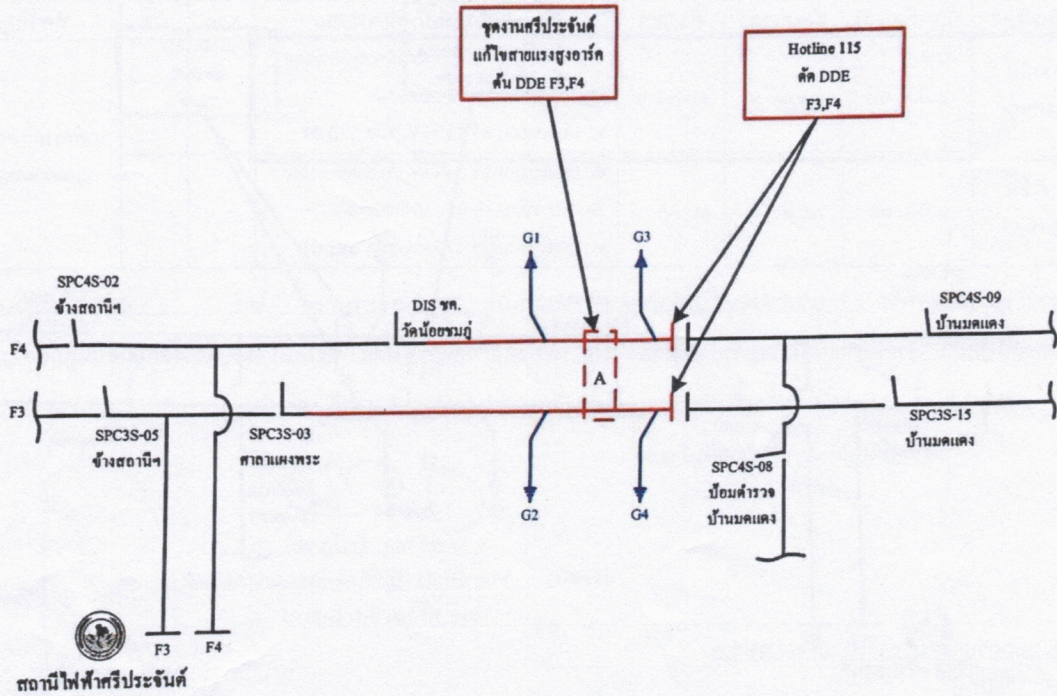

หมายเหตุ

ดับไฟแก้ไขสายแรงสูงอาร์คชำรุดในไลน์ F3,F4 ศรีประจันต์ จุด A

1. วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น.
2. ดับไฟจาก จุดตัด DDE F3 - DIS SPC3S-03 ศาลาแม่พระ
3. ดับไฟจาก จุดตัด DDE F4 - DIS ชก.วัดน้อยชมพู
