



Switching Deadline

14 มิ.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นญช. ๓๗๕ / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ

วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.นญช. ขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาหมอนไลน์ รองรับการจ่ายไฟ พีดเดอร์ ๗ สถานีเลขวัญ LWA07

ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DAA06	๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ชุดขอทไลน์กระเช้า สุปรรณบุรี ปลดสายตัด DDE ต้นปักทางเข้า รีโครส เซอร์ วัตดองเงิน (ติดตั้งใหม่) แยกหนองอีพัง วงจร DAA๐๖ สถานีไฟฟ้า ตำบลช้าง	เสาต้น DDE ต้นปักทางเข้า รีโครส เซอร์ วัตดองเงิน (ติดตั้งใหม่) แยกหนองอีพัง วงจร DAA๐๖ สถานีไฟฟ้า ตำบลช้าง	SE6-ทัพตาแพน รหัส DAA06S-08 วงจร DAA06 สถานีไฟฟ้า ตำบลช้าง	นายศุภลักษณ์ อังศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสำเร็จ แก้วเรือง ตำแหน่ง ทผ.กป โทร. ๐๘๐๒๖๕๓๐๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.นญช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ PAA 6 จาก DDE ปักหมอนไลน์ถึง DAA๐๖-๐๘

ในวันที่ 19 มิ.ย.๖๖ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 942/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศิต กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผคค.ต.ม. (แก้ว ธีรธง)

7 มิ.ย.๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อ.นญช.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

สภ.ท.อ.นญช.อ.นญช.
นายสภ.ท.อ.นญช.อ.นญช.
วอ.ค.๗ ประจวบจันทน์

ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว


- ๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

วันที่

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากทางวัดกองเงิน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 มิ.ย.66	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นญช.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	942/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	8 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
3	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing		นญช.		R วัดกองเงิน
4	ให้ตรวจสอบ SF6 DAA6S-08 ทัดตาแทน ให้อยู่สถานะ OFF และล๊อคคาน						
5	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
6	DAA06R-03	สับ	ปลด		นญช.		R วัดกองเงิน
7	DIS.Load DAA06R-03	สับ	ปลด		นญช.		DIS Load DAA6R-03
8	แจ้งหน่วยงานทำการปลดโหลดหม้อแปลงออกทั้งหมด ก่อนทำการตัด DDE						
9	หลังจากหน่วยงานทำการปลดโหลดหม้อแปลงออกทั้งหมด เรียบร้อยแล้ว						
10	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE บริเวณปากทางวัดกองเงิน ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
11	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE บริเวณปากทางวัดกองเงิน ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
13	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
15	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
17	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
19	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
20	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
21	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE บริเวณปากทางวัดกองเงิน เข้าทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
24	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE บริเวณปากทางวัดกองเงิน แล้วเสร็จ						
25	จ่ายไฟ Recloser DAA6R-03						
26	DIS.Load DAA06R-03	ปลด	สับ		นญช.		DIS Load DAA6R-03
27	DAA06R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		นญช.		R วัดกองเงิน
28	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
29	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		นญช.		R วัดกองเงิน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาเข็มไล่น้ำรองรับการจ่ายไฟเฟดเดอร์ 7 (LWA07) สถานีเตาขี้ฉุ
วันจันทร์ ที่ 19 มิ.ย. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

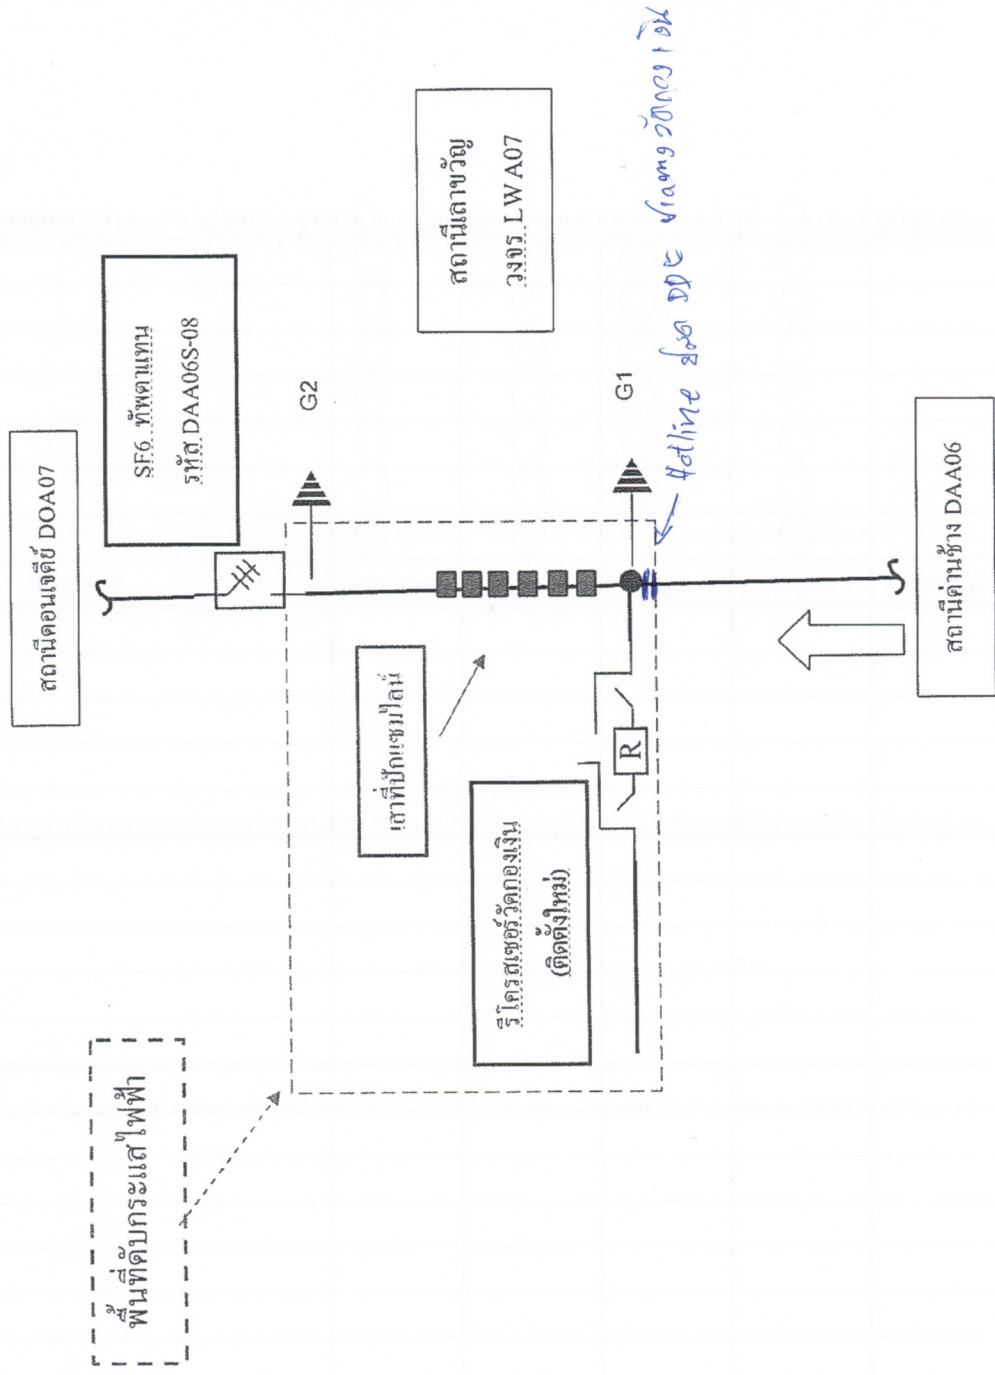

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงานแล้วเสร็จเวลา ย้ายหลอดกลับสภาพเดิม
บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน
