



การไฟฟ้านครหลวง
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

12 ก.ค. 67

เลขที่ ก.๓ บพล.(บป) ๕๗๑ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนรินทร์ เข้มทอง
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.บป.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า สาขาบ่อพลอย ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาเข็มไลน์ แก๊สเสาส่งแรงสูงเอนเอียง บ้านหนองเตียน ม.๖ ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ๑

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๑ ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑ สถานี บ่อพลอย 1	๑๗ ก.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๓๐ น.	ปักเสาเข็ม ไลน์ บ้าน หนองเตียน ม.๖ ต.บ่อ พลอย	จุดตัด DDE ใกล้แยกวัด หนองเตียน หลัง R บ้าน บึงหัวหวาน BOU๐๕R- ๐๑	สุดระบบ จำหน่าย	นายวิษณุ มีผล พชง.๖(สข) ผบป. กฟอ.บพล. โทร.๐๘๒- ๒๕๒๕๖๘๘

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพงษ์ ตำแหน่ง พชง.๗ (สข) โทร.๐๘๔-๒๕๖๙๔๒๔

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายวิษณุ มีผล ตำแหน่ง พชง.๖(ปฟ) ผบป. โทร.๐๘๒-๒๕๒๕๖๘๘

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบ
ก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนรินทร์ เข้มทอง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บ่อพลอย

- ๕ ก.ค. ๒๕๖๗

สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง
กรุงเทพฯ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ 1 จาก DOE 11 กษาปณพูน 1 ถึง 12:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 946/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นามาน ประสานงานขอดับไฟกับ ทวีวิมล มีดล

นายศุภสวัสดิ์ เกียงผอง 20 ก. 5 11 กชนพ.๑๗.

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไปจนกว่างาน จะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DDE ไกล่แยกวัดหนองเตียน ถึง สุดไลน์ (BOP05)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ค. 67	เวลา	08.30 น. ถึง เวลา 12.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บพล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 946/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายฉวีวัฒน์ นายวิรัชร์,นายพิชชา,นายวัฒนา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโช,วรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกัษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต,นายพีรภัทร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOP05R-01	Normal	Nonreclosing		บพล.		R บ้านบึงหัวแหวน
3	- ดับไฟ 08.30น. ดับไฟตัด DDE						
4	BOP05R-01	สับ	ปลด		บพล.	SCADA	R บ้านบึงหัวแหวน
5	SW.LOAD	สับ	ปลด		บพล.		R บ้านบึงหัวแหวน
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.บพล. รับทราบ						
7	แจ้งให้ กฟส.บพล. ทำการทดสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด						
8	ทำการ Short ground จุด G1						
9	ทำการ Short ground จุด G2						
10	ทำการ Short ground จุด G3						
11	แจ้ง กฟส.บพล. ลง WESAFE ปฏิบัติงานทำงานได้						
12	แจ้ง กฟส.บพล.ตัด DDE BOP05 ไกล่แยกวัดหนองเตียน ออกจากกันทั้งสามเฟส						
13	หลังจาก กฟส.บพล. ตัด DDE BOP05 ไกล่แยกวัดหนองเตียน ออกจากกันทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
14	แจ้งให้ กฟส.บพล. ทำการปลด Short ground จุด G2						
15	ตรวจสอบหน้างานพร้อมรับไฟจ่ายไฟไปถึง DDE ไกล่แยกวัดหนองเตียน						
16	SW.LOAD	ปลด	สับ		บพล.		R บ้านบึงหัวแหวน
17	BOP05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพล.	SCADA	R บ้านบึงหัวแหวน
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.บพล. รับทราบ						
19	แจ้ง กฟส.บพล. ลง WESAFE ปฏิบัติงานทำงานได้						
20	BOP05R-01	Nonreclosing	Normal				R บ้านบึงหัวแหวน
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อ กฟส.บพล. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
22	BOP05R-01	Normal	Nonreclosing				R บ้านบึงหัวแหวน
23	- ดับไฟ เชื่อม DDE						
24	BOP05R-01	สับ	ปลด		บพล.	SCADA	R บ้านบึงหัวแหวน
25	SW.LOAD	สับ	ปลด		บพล.		R บ้านบึงหัวแหวน
26	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.บพล. รับทราบ						
27	แจ้งให้ กฟส.บพล. ทำการ Short ground จุด G2						
28	แจ้ง กฟส.บพล.เชื่อม DDE BOP05 ไกล่แยกวัดหนองเตียน เข้าทั้งสามเฟส						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	หลังจาก กฟส.บพล.เชื่อม DDE BOP05 ไกล่แยกวัดหนองเตียน เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
30	ทำการปลด Short ground จุด G1						
31	ทำการปลด Short ground จุด G2						
32	ทำการปลด Short ground จุด G3						
33	- จ่ายไฟ						
34	SW.LOAD	ปลด	สับ		บพล.		R บ้านบึงหัวแหวน
35	BOP05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพล.	SCADA	R บ้านบึงหัวแหวน
36	BOP05R-01	Nonreclosing	Normal				R บ้านบึงหัวแหวน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

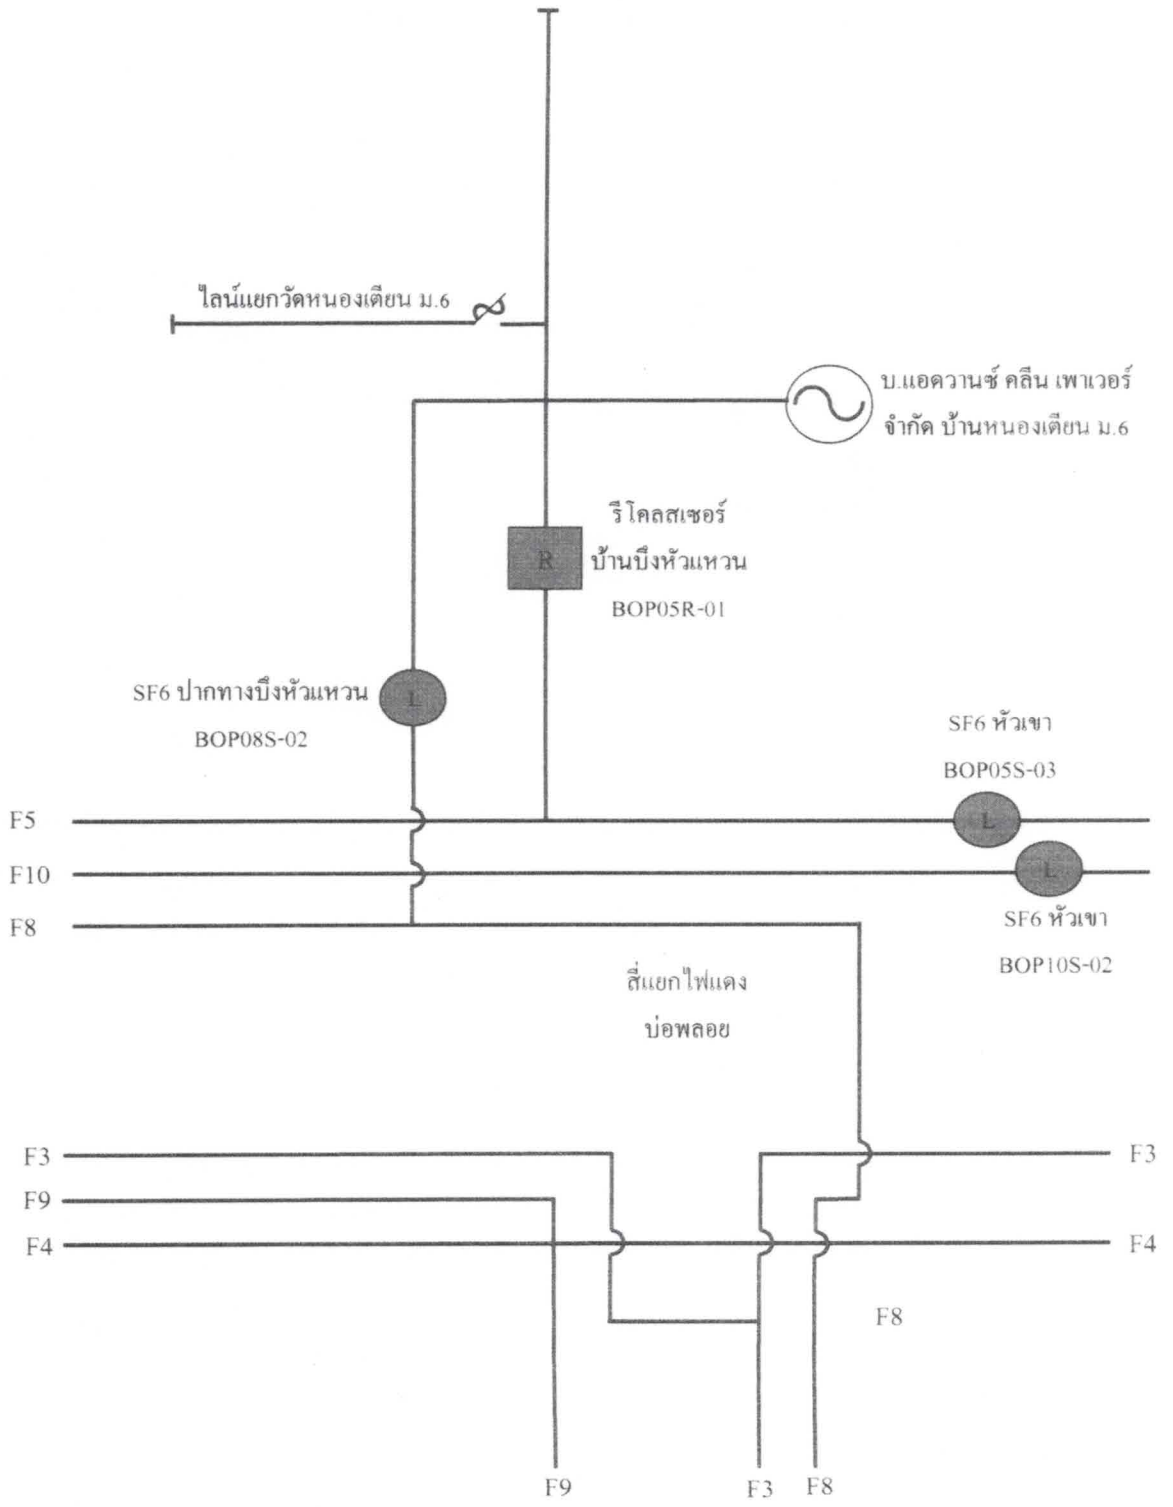

Handwritten mark

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

