



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

16 มิ.ย. 66

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล. ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชฯ ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอน ปักเสาและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๒ บริเวณแผนผังป่วน
เส้นเสียบึง-Disลานตากข้าวสามเหลี่ยม ตามแผนผังส่งเซเปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๐ สท.๒	๑๗/๐๖/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนปักเสา และพาดสาย เส้นเสียบึง	DDE จุด A	DOA๐๙5-๐๙	โทร.๐๘๑-๖๑๕๕๑๖๕ นายธนัช มาลัยวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สท.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชฯ)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SPB10 จาก DOA๐95-๐9 ถึง DDE จุด A
ในวันที่ 17 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา ๐8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 961/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวรรณ แก้วจันทน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนากร สุวรรณประทีป
13 มิ.ย. 66

(นาย จิรวรรณ แก้วจันทน์)

รจก. 5 บกท. ๒๕-คพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. - (สถานี -)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. สท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแพล้นปูนเส้นเลี้ยงเมือง-DIS ลานตากข้าวสามเหลี่ยม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 มิ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปักเสา พาดสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 961/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 15 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
4	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการไล่นโหดตั้งแต่ DOA09S-09 ลานตากข้าวสามเหลี่ยม ถึง DDE จุด A เลยแพล้นปูนมันคงดี						
5	เมื่อ กฟจ.สพ. ทำการไล่นโหดตั้งแต่ DOA09S-09 ลานตากข้าวสามเหลี่ยม ถึง DDE จุด A เลยแพล้นปูนมันคงดีแล้วเสร็จ						
6	แจ้ง Hot Line ทำการปลด DDE จุด A เลยแพล้นปูนมันคงดี						
7	เมื่อ Hot Line ทำการปลด DDE จุด A เลยแพล้นปูนมันคงดีแล้วเสร็จ						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
13	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
15	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
18	แจ้ง Hot Line ทำการเชื่อม DDE จุด A เลยแพล้นปูนมันคงดี						
19	เมื่อ Hot Line ทำการเชื่อม DDE จุด A เลยแพล้นปูนมันคงดีแล้วเสร็จ						
20	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการนำโหดตั้งแต่ DOA09S-09 ลานตากข้าวสามเหลี่ยม ถึง DDE จุด A เลยแพล้นปูนมันคงดีเข้า						
21	เมื่อ กฟจ.สพ. ทำการนำโหดตั้งแต่ DOA09S-09 ลานตากข้าวสามเหลี่ยม ถึง DDE จุด A เลยแพล้นปูนมันคงดีเข้าแล้วเสร็จ						
22	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปป.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.


ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ด้วยในวันที่...๑๗...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...แพลันปูนเส้นเลี้ยงเมือง-ลานตากข้าวสามเหลี่ยม ...เพื่อ...รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี ๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ..๑๐.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี ๒... ตั้งแต่บริเวณ ..แพลันปูนเส้นเลี้ยงเมือง-ลานตากข้าวสามเหลี่ยม

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นาย ตำแหน่ง ผกส.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ...๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔..เป็นผู้ควบคุมงาน และให้..นายวรพล สุทธิไกร ..ตำแหน่ง ผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟ เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

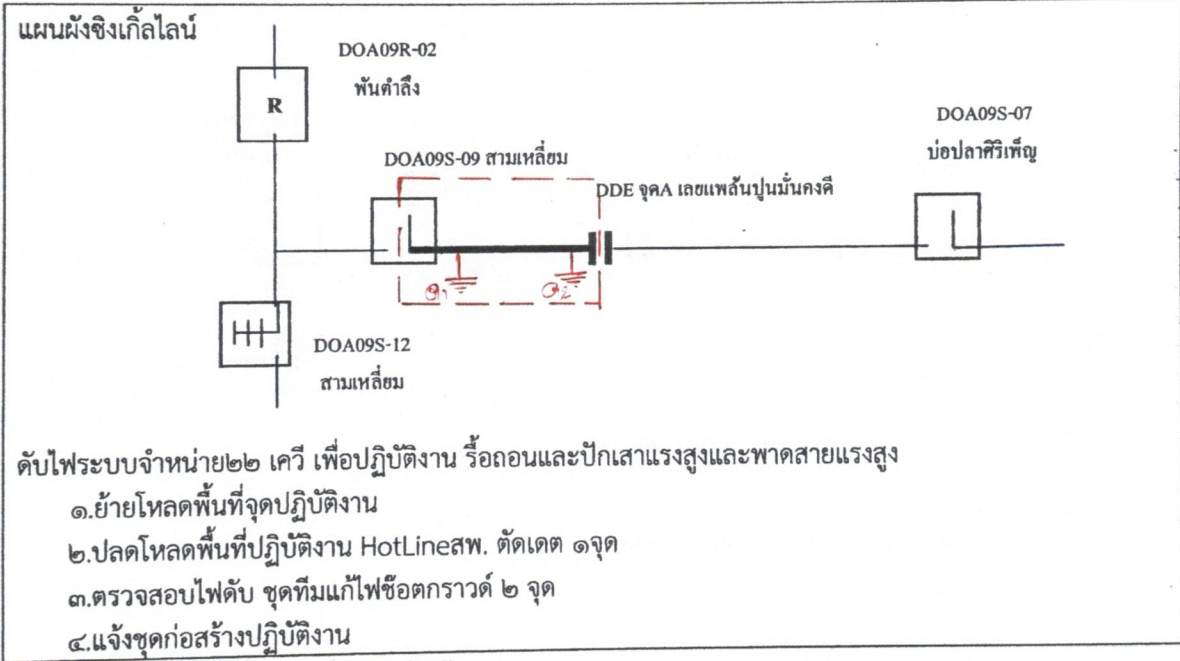

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

Shw

(นายธนาคาร สุวรรณประทีป)
พงษ.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐

Sw
