



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21 มิ.ย. 66

เลขที่ ..... /๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายประพนธ์ จิตต์มันการ

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	ไฟฟ้าดับจาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๒	๒๓ มิ.ย. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ปป. ระบบจำหน่ายแรงสูง (พาดสายแรงสูงและถอน เสา) ช่างวัดบ้านถ้ำ ถึง หน้า สถานีวังหีบ	Dis ชั่วคราว สถานี วังหีบ	ปลายสายระบบ จำหน่ายTMA๐๗F- ๐๒สถานีวังหีบ	นายจิราวัฒน์ พักอ่อน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ช่างวัดบ้านถ้ำถึงDisชั่วคราวสถานีวังหีบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนนทวุฒิ อื้อวิสัย ตำแหน่ง พชง.๓ ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง โทร ๐๙๖-๓๕๔๑๖๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประพนธ์ จิตต์มันการ.)

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖



สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร



อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ TMA02 จาก DMA 105-06 Drop ทั้งวัดชั้นถัด  
ในวันที่ 23 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 965/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พีรภัทร โพรวิพันธุ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายหนันทวัฒน์ ชูอวัณ

(นายพีรภัทร โพรวิพันธุ์)  
ชุดก.4 11กข นผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟส.ทฆง  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผน  
แผนผังแนบ 1 แผน  
ผจฟ. - (สถานีฯ - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ช่วงข้างวัดบ้านถ้ำถึงสุสานวังหีบ (TMA02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 มิ.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	23 มิ.ย. 66	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทมจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	965/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	13 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน						
		ดำเนินการ						
1	งานที่ทำ 1.ปรับปรุงระบบจำหน่าย							
2	2.รื้อถอนต่อตรง Drop ข้างวัดบ้านถ้ำ							
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
4	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			TMA	-	
5	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
6	DMA10S-06	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)			ทมจ.		DIS สุสานวังหีบ
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ทมจ. รับทราบ							
8	แจ้ง กฟส.ทมจ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
9	แจ้ง กฟส.ทมจ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
10	แจ้งให้ กฟส.ทมจ. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
11	แจ้ง กฟส.ทมจ. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
12	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			TMA	-	
13	****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****							
14	เมื่อ กฟส.ทมจ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
15	แจ้ง กฟส.ทมจ. ปลด Short ground จุด G1							
16	แจ้ง กฟส.ทมจ. ปลด Short ground จุด G2							
17	TMA07R-01	Normal	Nonreclosing			ทมจ.		R ห้วยน้ำโจน
18	แจ้ง กฟส.ทมจ. ทำการไลน์ไหลดช่วง Drop ข้างวัดบ้านถ้ำถึง DIS สุสานวังหีบ DMA10S-06							
19	เมื่อ กฟส.ทมจ. ทำการไลน์ไหลดช่วง Drop ข้างวัดบ้านถ้ำถึง DIS สุสานวังหีบ DMA10S-06 แล้วเสร็จ							
20	แจ้งชุด Hotline ทำการรื้อถอนต่อตรง Drop ข้างวัดบ้านถ้ำ							
21	เมื่อชุด Hotline ทำการรื้อถอนต่อตรง Drop ข้างวัดบ้านถ้ำ แล้วเสร็จ							
22	TMA07R-01	Nonreclosing	Normal			ทมจ.		R ห้วยน้ำโจน
23	****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****							



แผนผังงานดับไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงสูงแบบมีแผนเพื่อทำการปรับปรุงในเคเบิลวงจรเฟสเดออร์ 2 สถานีท่าม่วง 2

ตั้งแต่ **Diss** หัวตรวจสถานีหีบ ถึง **TMA07F-02** รางวัดบ้านถ้ำ

ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

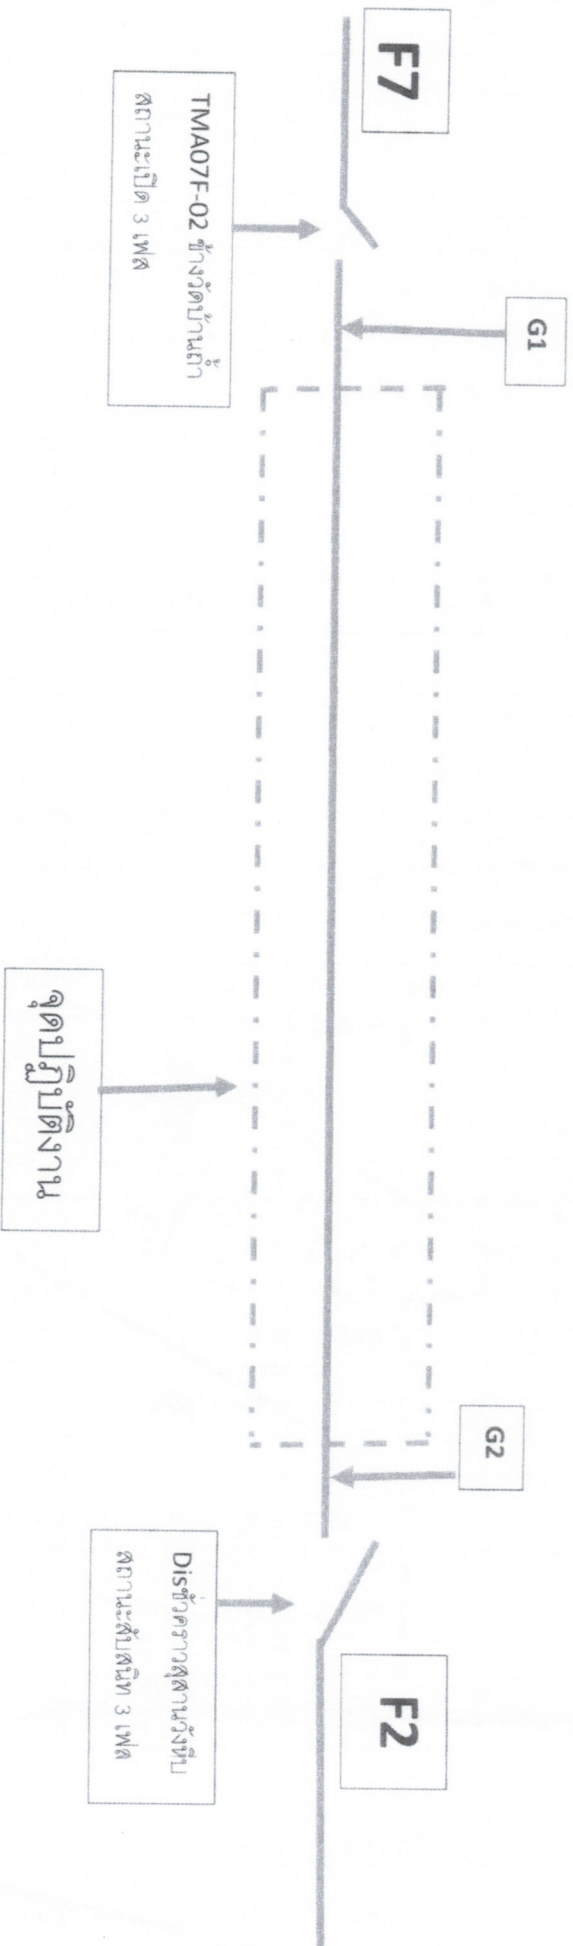

G จุดช้อดตรวจวัด
