



# วิทย์ขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปป) ๗๖๐๗ /๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัชรินทร์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายนรินทร์ เข้มทอง  
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย ตัดไฟเพื่อขยายเขต-ปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ได้ไลน์เมน F๑  
สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ๒ ถึง SF๖ สีแยกหนองปรือ BOU๐๑S-๐๕ ช่วงที่ ๑-๓

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒ (ชั่วคราว) ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์                | วัน/เดือน/<br>ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่<br>ปฏิบัติ   | จาก                  | ถึง                                 | ผู้ควบคุมงาน                                       |
|-----|-------------------------|------------------|-------------|----------|---|----------------------|-------------------------------------|--|
| ๑   | ๑ สถานี<br>บ่อพลอย<br>๒ | ๑๗ มิ.ย.<br>๖๖   | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๗.๐๐ น. | ขยายเขต<br>ปรับปรุงระบบ<br>จำหน่าย ๒๒<br>KV ช่วง<br>สฟฟ.บพล.๒<br>ถึง สีแยกหนอง<br>ปรือ(ช่วงที่ ๑-<br>๓) | F๑ สฟฟ.บ่อ<br>พลอย ๒ | SF๖ สีแยกหนอง<br>ปรือ BOU๐๑S-<br>๐๕ | นายธีรวัช นิมวัน<br>ชม.กส.<br>โทร.๐๖๓-๑๙๕-<br>๖๔๕๒ |

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพงษ์ ตำแหน่ง พชง.๗ (สข) โทร.๐๘๕-๒๔๖๙๙๕๒๔...  
ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ตำแหน่ง ชม.ปน โทร.๐๘๕-๗๒๗๗๘๒๑...

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบ  
ก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายนรินทร์ เข้มทอง)

ผจก.กฟอ.บ่อพลอย

ตำแหน่ง.....

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) อพท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ BOU1 จาก BOU1NB-01 ถึง BOU1J-05  
 ในวันที่ 17 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 16-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 966/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายวรรณพงษ์ นกมล ประสานงานขอดับไฟกับ

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟอ-นพ., กฟน-นพ.,

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

นายศุภสวัสดิ์ เทียงพดุง  
 อต.๕ แทน ผคฟ.

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 2 แผ่น  
 แผ่นผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ  
 ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไปจนกว่างาน  
 จะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง


|                        |   |   |  |
|------------------------|---|---|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | BOU01VB-01 ถึง BOU01S-05(SF6 สีแยกหนองปรือ) |   |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 1 มิ.ย. 66                                  | ระหว่าง                                       | 08.00 น. ถึง 17.00 น.  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟอ.บพล.                                    | งานที่ทำ                                      | ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22kV ได้เมนไลน์ BOU01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 966/66 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย |   | นายวรรณพงษ์ นกเทศ                             | วันที่ 15 มิถุนายน 2566  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   | <u>นิคม</u>                                   | วันที่ 15 มิถุนายน 2566  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |   | วันที่ 15 มิถุนายน 2566  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1.  | นายสกลพร, นายพชชา, นายวีรวัชร, นายอมร         | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)  |
|                        | 2.  | นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)  |
|                        | 3.  | นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช   | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)  |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ          |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|-------------------|
| 1   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง                                 |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 2   | BOU01VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | BOU          |            | CB                |
| 3   | BOU02VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | BOU          |            | CB                |
| 4   | - ย้ายโหลด BOU01 บางส่วนไปรับไฟจาก BOU02   |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 5   | BOU01S-07  | ปลด                                  | สับ                |      | หปร.         |            | SF6 บ้านหนองขอน   |
| 6   | BOU01S-05  | สับ                                  | ปลด, ล็อกคาน       |      | หปร.         |            | SF6 สีแยกหนองปรือ |
| 7   | - เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.   |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 8   | BOU01VB-01   | สับ                                  | ปลด                |      | BOU          |            | CB BOU01          |
| 9   | BOU01S-01  | สับ                                  | ปลด                |      | หปร.         |            | Pothead F.1       |
| 10  | แจ้งกฟย.หปร.ตรวจสอบ BOU01S-02 และ BOU01S-03 ให้อยู่ตำแหน่ง OFF และ ล็อกคาน         |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 11  | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.บพล. ทราบ   |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 12  | แจ้งกฟอ.บพล. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1                             |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 13  | แจ้งกฟอ.บพล. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2                             |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 14  | แจ้งกฟอ.บพล. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3                             |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 15  | เมื่อกฟอ.บพล. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 16  | แจ้งกฟอ.บพล. ปฏิบัติงานได้   |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 17  | BOU02VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | BOU          |            | CB                |
| 18  | ***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***   |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 19  | เมื่อกฟอ.บพล. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 20  | แจ้งกฟอ.บพล. ปลด Short Ground จุด G1   |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 21  | แจ้งกฟอ.บพล. ปลด Short Ground จุด G2   |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 22  | แจ้งกฟอ.บพล. ปลด Short Ground จุด G3   |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 23  | BOU01VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | BOU          |            | CB                |
| 24  | - เมื่อพร้อมจ่ายไฟ   |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 25  | BOU01S-01  | ปลด                                  | สับ                |      | หปร.         |            | Pothead F.1       |
| 26  | BOU01VB-01   | ปลด                                  | สับ                |      | BOU          |            | CB BOU01          |
| 27  | - ย้ายโหลด BOU01 บางส่วนไปรับไฟจาก BOU02   |                                      |                    |      |              |            |                   |

| ที่                             | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------|----------------|
| 28                              | BOU01S-05   | ปลด                                  | สับ                |      | หปร.         |            | SF6      | สี่แยกหนองปรือ |
| 29                              | BOU01S-07   | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน       |      | หปร.         |            | SF6      | บ้านหนองขอน    |
| 30                              | BOU01VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | BOU          |            | CB       |                |
| 31                              | BOU02VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | BOU          |            | CB       |                |
| ***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*** |             |                                      |                    |      |              |            |          |                |

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

สถานีบ่อพลอย ๒

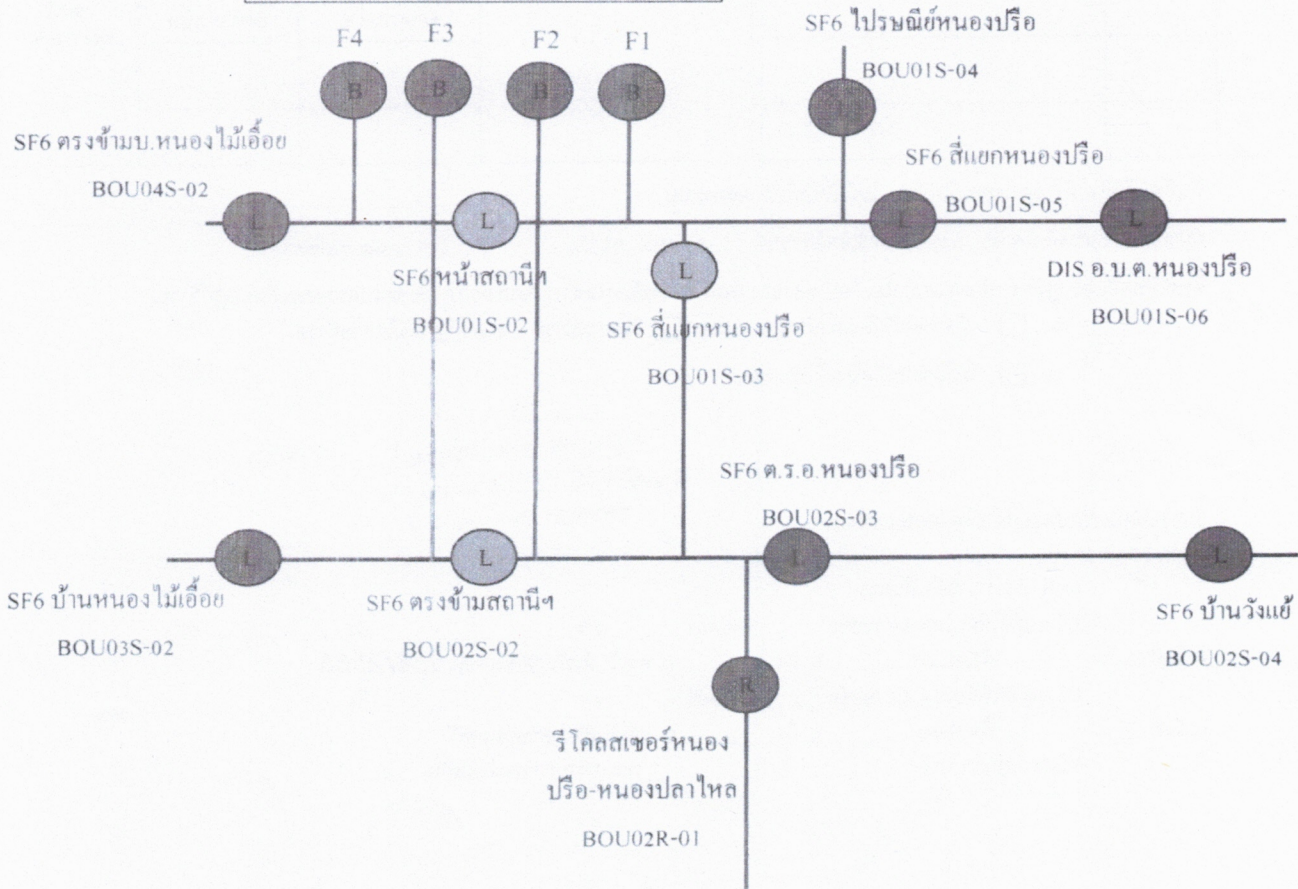

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

สถานีฯ บ่อพลอย ๒

