



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ค.บ.ช.(ก.บ.) ๕๖๘ / ๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายประสาน ประสพผล

# โทรสารขอตัดไฟ

( งานเร่งด่วน )

Switching Deadline

21 มิ.ย. 66


วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ช.ผ.ก.บ. รักษาการแทน ผ.จ.ก.บ.ส.อ.ค.บ.ช.

ด้วย ผ.จ.ก.บ.ส.อ.ค.บ.ช. มีแผนก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี DMA๐๓ ได้ไลน์ ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ด่านมะขามเตี้ย... ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟ.ค.บ.ช. DMA02	๒๒ มิ.ย. ๖๖	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	รื้อถอน Dis / ติดตั้ง SF๖	Dis ชั่วคราว หน้าบีมเซลล์	Dis ชั่วคราว หน้าบีมเซลล์	นายประสาน ๑ โทร ๐๘-๕๑๕๕-๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผ.จ.บ. ได้รับผลกระทบ...ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ช.ผ.ก.บ.ก.บ.ส.อ.ค.บ.ช. โทร. ๐๙๕-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ ก.พ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

( นายประสาน ประสพผล )

ตำแหน่ง ช.ผ.ก.บ. รักษาการแทน ผ.จ.ก.บ.ส.อ.ค.บ.ช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) ก.พ.ก.๓  
เรียน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ DMA02 ฟีดเดอร์ 1 จาก Dis ชั่วคราว หน้าบีมเซลล์ ถึง Dis ชั่วคราว หน้าบีมเซลล์  
ในวันที่ ๒๒ มิ.ย ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 979/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิภพกร จิตรภานะดิศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางประจักษ์ ประสพผล


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.ช.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จ.ก. ก.บ.ส.อ.ค.บ.ช.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

  
( ผ.ค.น.ร.น.ร. วิจิตรภานะดิศักดิ์ )  
๐๙.๖ มิ.ย. ๖๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผ.จ.ก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.ช.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)



## ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย
5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย
6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย
7. สั่งทำสวิตซิ่งโดย

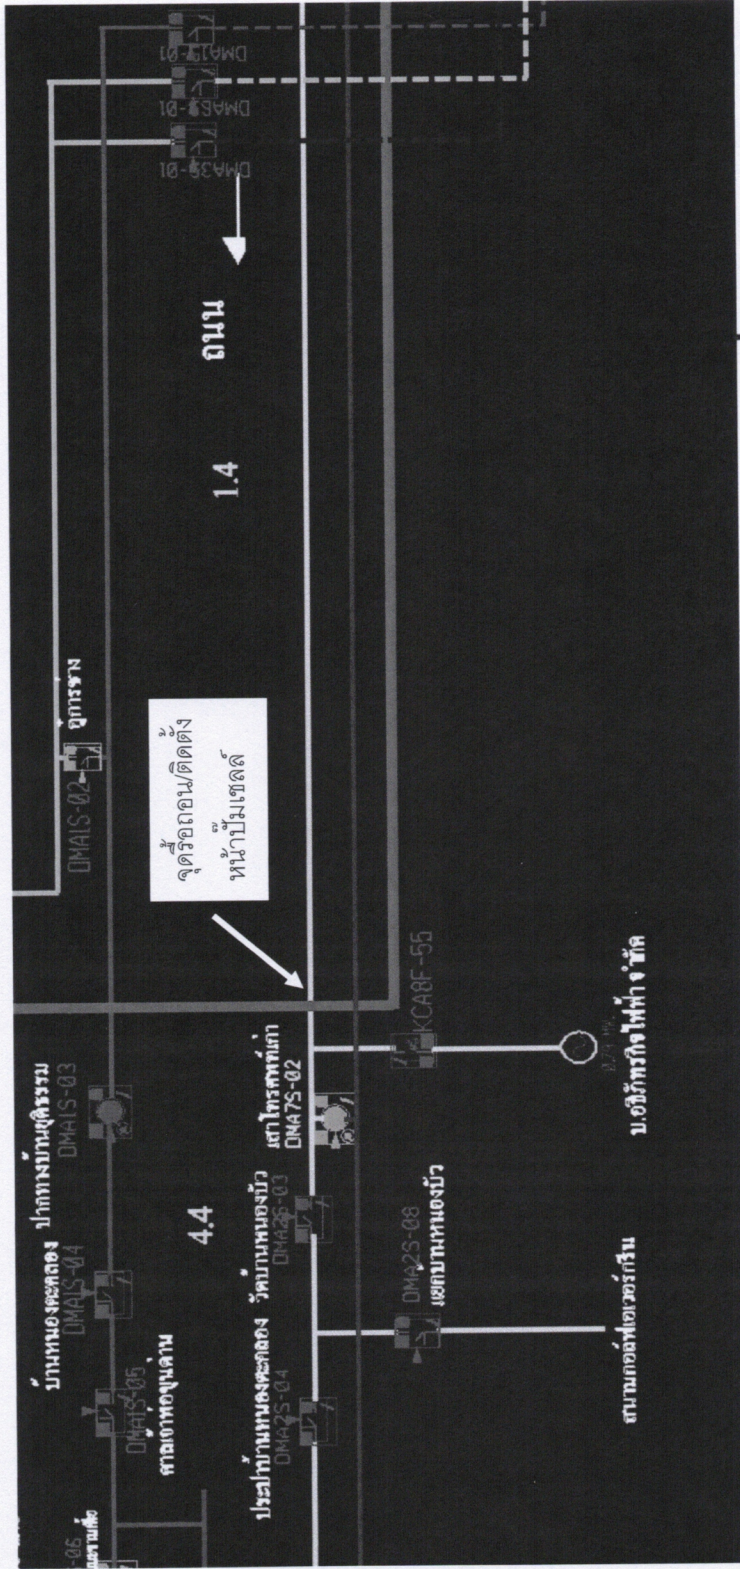
หน้าบีมเซลล์	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	16.30 น.
22 มิ.ย. 66	งานที่ทำ	รื้อถอน DIS /เปลี่ยน SF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน	979/66
กฟส.ตมข.	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่	17 มิถุนายน 2566
			วันที่	17 มิถุนายน 2566
			วันที่	17 มิถุนายน 2566
1. นายนครินทร์, นายณัฐภาณุজন, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวิรัช, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตซิ่ง							
1	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	LOAD 2.8 MW
2	DMA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	LOAD 0.85 MW
3 ย้ายโหลด DMA02 บางส่วนไปรับไฟจาก DMA07							
4	DMA07S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ตมข.	SF6	เสาโทรศัพท์เก่า
5	Dis ชค. DMA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตมข.	DIS	หน้าบีมเซลล์ยางเกาะ
6 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ตมข.ทราบ							
7 ให้ตั้ง Manual DMA02VB-01 , DMA07VB-01 ไว้ในขณะที่ชุดทำงานปฏิบัติงานอยู่							
8 แจ้ง กฟส.ตมข.ปฏิบัติงานได้							
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
9 เมื่อ กฟส.ตมข.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
10 ย้ายโหลด DMA02 บางส่วนกลับจาก DMA07							
11	SF6 ชค. DMA02	ปลด	สับ		ตมข.	SF6	หน้าบีมเซลล์ยางเกาะ
12	DMA07S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตมข.	SF6	เสาโทรศัพท์เก่า
13	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	
14	DMA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							



# รื้อถอน Dis / ติดตั้ง SF๖

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๖



ป.อ.ค.

หมายเหตุ : รื้อถอน Dis ชั่วคราว และติดตั้ง SF๖ เข้าระบบตามหมายเลข WBS
