



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

# Switching Deadline

## 17/07/67

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทท.(ปน) - ๑๓๔/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช วาสกรี

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.กทท.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทท. จะดำเนินการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ เซิงสะพานท่าจีน ๒ จนถึง เสาต้น DDE ฝั่งตรงข้าม  
เสาสายส่ง SD-SA๒ หมายเลข ๒๔๑ พื้นที่ หมู่ที่ ๑ ต.สวนส้ม (เสาสัญญาณ TRUE หมายเลข SMK ๗๒๔๗A) สถานีไฟฟ้า กระทบแบน ๕  
ตามแผนผังแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTE ๐๒ KTE ๐๗	๒๑ ก.ค. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ เซิง สะพานท่าจีน ๒ จนถึง เสาต้น DDE ฝั่งตรงข้ามเสาสายส่ง SD-SA๒ หมายเลข ๒๔๑ พื้นที่ หมู่ที่ ๑ ต.สวนส้ม (เสาสัญญาณ TRUE หมายเลข SMK ๗๒๔๗A)	เซิงสะพานท่าจีน ๒	เสาต้น DDE ฝั่งตรงข้ามเสา สายส่ง SD-SA๒ หมายเลข ๒๔๑ พื้นที่ หมู่ที่ ๑ ต.สวนส้ม	นายนพพร ชาวไชยศรี ท.ป.บ. กฟส.กทท. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ เซิงสะพานท่าจีน ๒ จนถึง เสาต้น DDE ฝั่งตรงข้ามเสาสายส่ง SD-SA๒ หมายเลข ๒๔๑  
พื้นที่ หมู่ที่ ๑ ต.สวนส้ม คือ ๑๖๒ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ท.ป.บ. กฟส.กทท. โทร ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๖๔๒๕๒๑ Long : ๑๐๐.๒๓๑๑๘๘  
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๖๓๔๘๕๗ Long : ๑๐๐.๒๒๑๐๕๖

( นายมานิช วาสกรี )

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.กทท.  
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ KTE2 จาก UTE9S-11 ถึง Dis Ra. ๓๗ DDE  
ในวันที่ 21 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 980/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ UTE7 จาก UTE7S-10 ถึง DDE ฝั่งถนน  
ในวันที่ 21 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เทียมสงู ประสานงานการขอตัดไฟกับ ชลายนพพร ชาวไชยศรี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓), ผ.จก. กฟส.กทท.,  
ก.ร.๑ (บพว.)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

( อภิสิทธิ์ เทียมสงู )  
๑๖ ก. ๕ ๓๗๖ ๖๖๐๗



ขั้นตอนการสวิตซ์ \_\_\_\_\_ แผ่น  
แผนผังแนบ 2 \_\_\_\_\_ แผ่น

ผคฟ. - (สถานี - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปน.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 3  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ม.1 ต.สวนส้ม (KTE02,07)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 980/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง				วันที่	14 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	14 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	14 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	-
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	-
4	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 0.8 MW
5	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 3.0 MW
6	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 2.1 MW
7	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	-
8	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	-
9	BNP04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.	R	รีมคลองดำเนิน
10	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		บพว.	R	แยกวัดราคา
11	ย้ายโหลด KTE07 บางส่วนไปรับไฟจาก BNP10						
12	KTEBVB-01	ปลด	สับ		KTE	-	ขนานบัส
13	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP	-	ขนานบัส
14	BNP04S-12	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 รีมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
15	BNP10S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ก่อนป้อนตำรวจ
16	KTE07S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	ตรงข้ามร้านหมุกระทะเลเชิงสะพานท่าจัน
17	BNP04S-12	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 รีมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
18	KTEBVB-01	สับ	ปลด		KTE	-	ขนานบัส
19	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP	-	ขนานบัส
20	ย้ายโหลด KTE02 บางส่วนไปรับไฟจาก KTE03						
21	KTE02S-16	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 Loop แสนร์กรีสเตอร์
22	KTE02S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	เชิงสะพานท่าจันฝั่งบ้านแพ้ว
23	เมื่อพร้อมดับไฟ						
24	Dis.ไลน์ KTE02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	ชด.เสาต้น DDE ตรงข้ามเสาสายส่ง เลข 281
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลดโหลด วงจร KTE07 บริเวณพื้นที่ดับ (ตามแผนผัง) ออก						
26	หลังจากทำการปลดโหลด วงจร KTE07 บริเวณพื้นที่ดับ (ตามแผนผัง) ออก เรียบร้อย						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด DDE วงจร KTE07 บริเวณต้นบักอาร์มข้ามถนน (ตามแผนผัง) ออก						
28	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE วงจร KTE07 บริเวณต้นบักอาร์มข้ามถนน (ตามแผนผัง) ออก เรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
31	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3						
33	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
34	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
35	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
36	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
37	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
38	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
39	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
40	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
41	BNP04R-02	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		บพว.		R ริมคลองดำเนิน
42	BNP10R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		บพว.		R แยกวัดราช
43	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
44	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
45	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
46	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
47	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G3						
48	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
49	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
50	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
51	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
52	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
53	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
54	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
55	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
56	BNP04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.		R ริมคลองดำเนิน
57	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		บพว.		R แยกวัดราช
58	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
59	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการเชื่อม DDE วงจร KTE07 บริเวณต้นบักอาร์มข้ามถนน (ตามแผนผัง) เข้า						
60	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อม DDE วงจร KTE07 บริเวณต้นบักอาร์มข้ามถนน (ตามแผนผัง) เข้า เรียบร้อย						
61	Dis.ไลน์ KTE02	ปลด	ล๊ับ		กทบ.		DIS ชค.เสาดัน DDE ตรงข้ามเสาสายส่ง เลข 281
62	ย้ายโหลด KTE02 บางส่วนกลับจาก KTE03						
63	KTE02S-11	ปลด	ล๊ับ		กทบ.		DIS เจริญสะพานท่าจีนฝั่งบ้านแพ้ว
64	KTE02S-16	ล๊ับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 Loop แสนร์กรีสมอร์ท


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	ย้ายโหลด KTE07 บางส่วนกลับจาก BNP10						
66	KTEBVB-01	ปลด	สับ		KTE		- ขนนานบัส
67	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		- ขนนานบัส
68	BNP04S-12	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
69	KTE07S-10	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ตรงข้ามร้านหมูกระทะเชิงสะพานท่าจีน
70	BNP10S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ก่อนป้อมตำรวจ
71	BNP04S-12	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
72	KTEBVB-01	สับ	ปลด		KTE		- ขนนานบัส
73	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนนานบัส
74	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
75	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
76	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
77	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
78	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
79	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
80	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
81	BNP04R-02	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		บพว.		R ริมคลองดำเนิน
82	BNP10R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		บพว.		R แยกวัดราช
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนตัดไฟ** บริเวณ ถนน สค. 3011 (ฝั่งไป อ.บ้านแพ้ว)  
ตั้งแต่ เจริงสะพานท่าจีน 2 จนถึง พื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.สวนส้ม (เสาสัญญาณ TRUE หมายเลข SMK 7247A)

เพื่อให้ชุดงาน ผบ.ภ.พ.ส.ท.ท. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ เจริงสะพานท่าจีน 2

จนถึง พื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.สวนส้ม (เสาสัญญาณ TRUE หมายเลข SMK 7247A)


วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

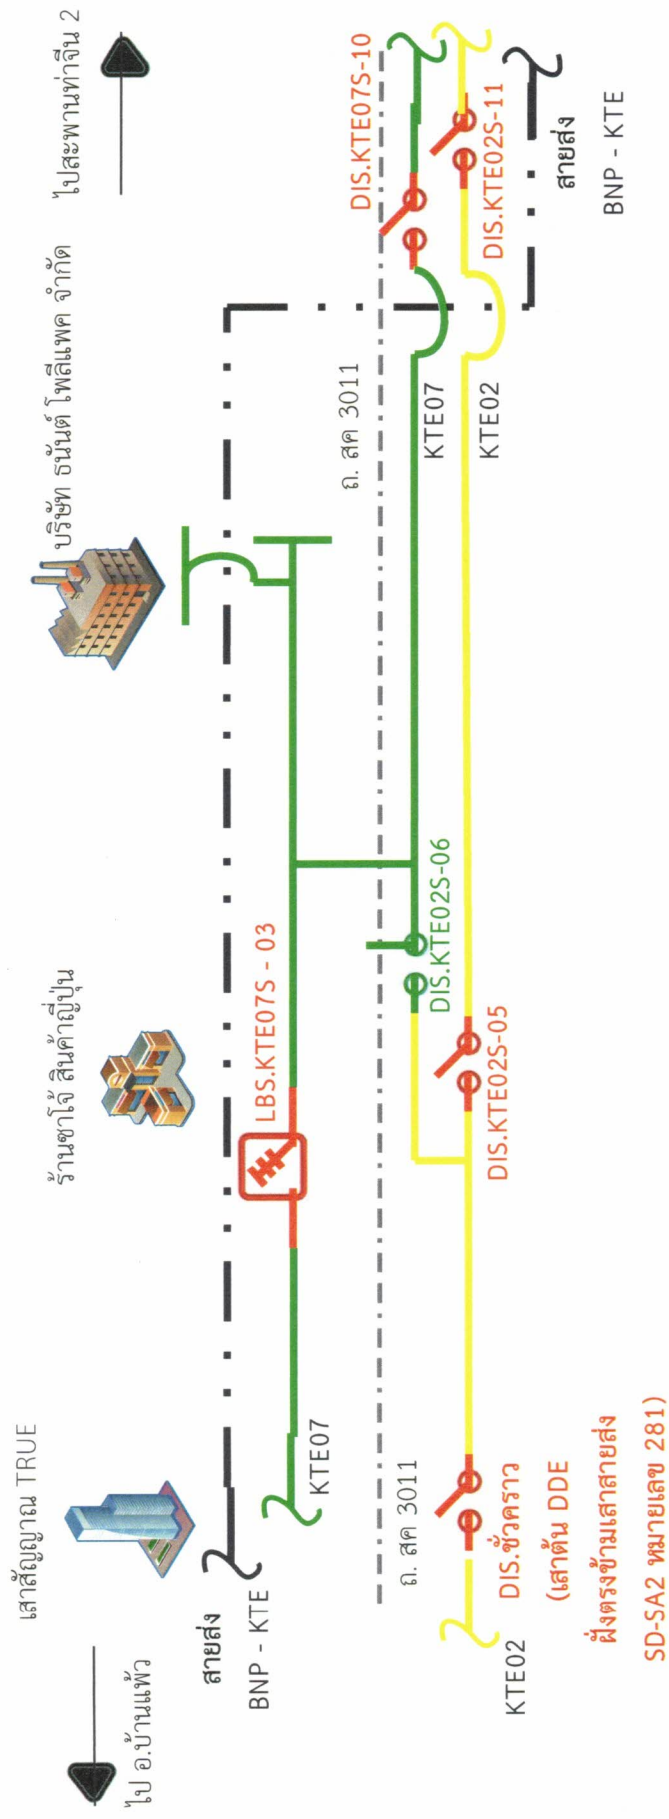

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ ประมาณ 159 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังตัดไฟ บริเวณ ถนน สค. 3011 (ฝั่งไป อ.บ้านแพ้ว)  
ตั้งแต่ เจริงสะพานทำจิ้น 2 จนถึง พื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.สวนส้ม (เสาสัญญาณ TRUE หมายเลข SMK 7247A)  
เพื่อให้ชุดงาน ผบ.ภส.ภทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ เจริงสะพานทำจิ้น 2  
จนถึง พื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.สวนส้ม (เสาสัญญาณ TRUE หมายเลข SMK 7247A)

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

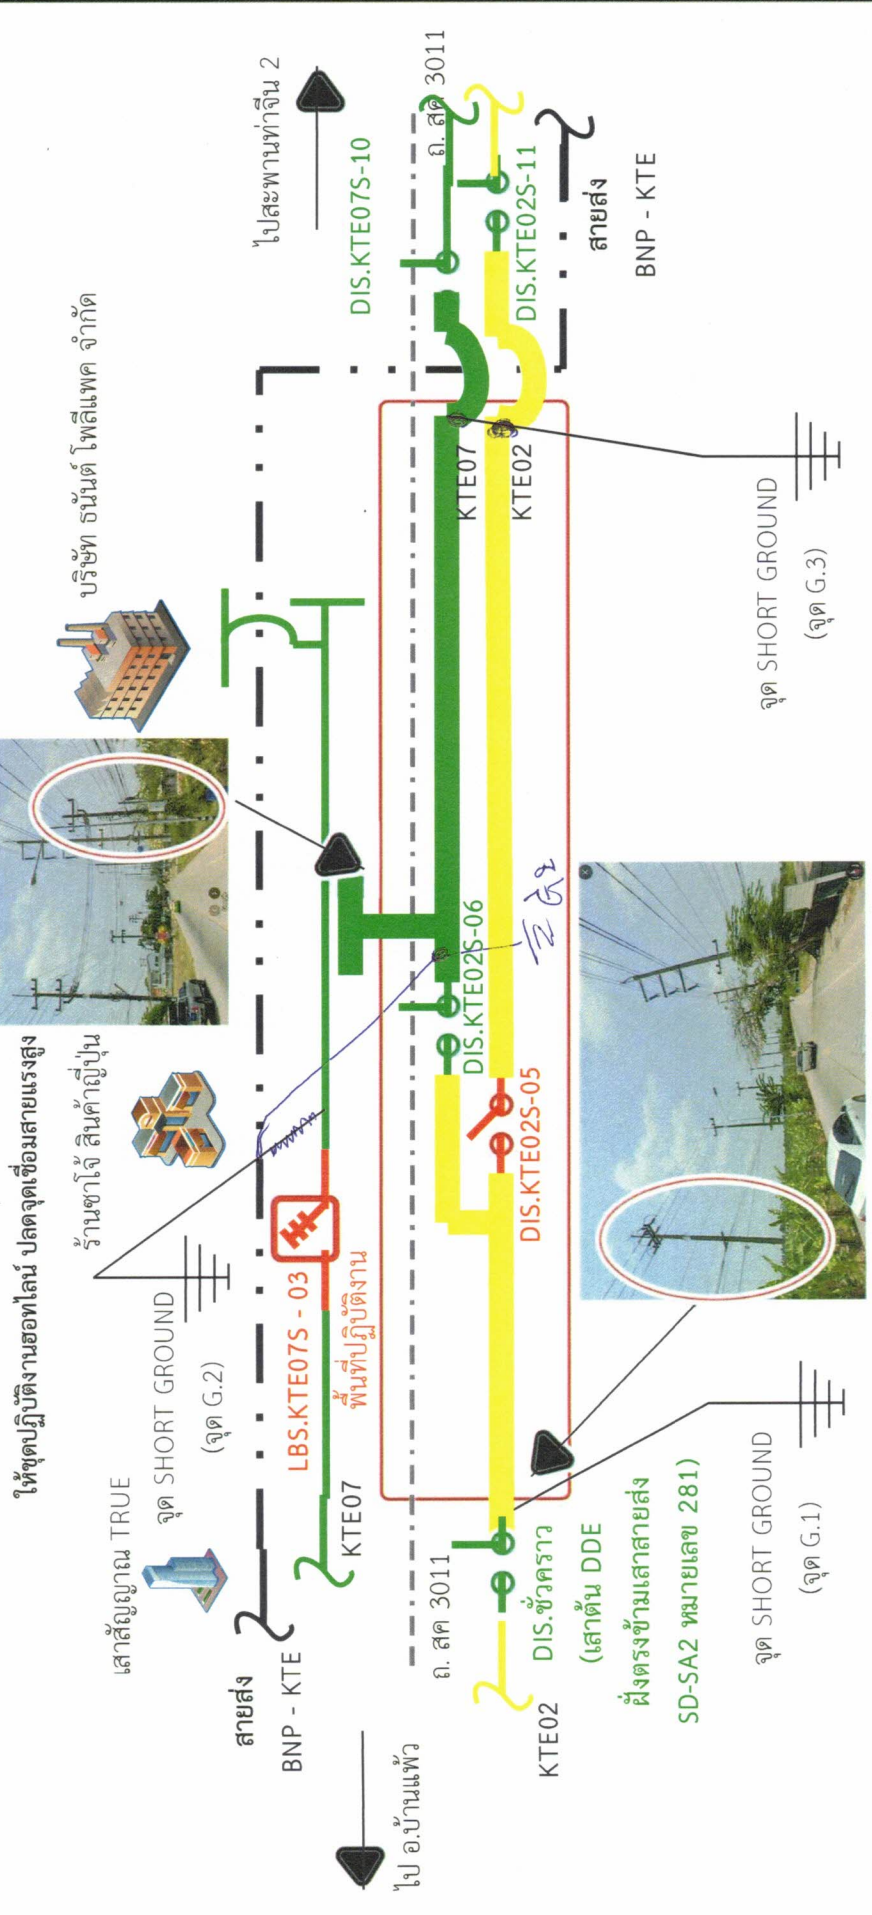

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 159 ราย

ให้ชุดปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า  
ปลดอุปกรณ์ตัดตอนชั่วคราว  
(หัวเสา DDE)

- พื้นที่ดับไฟ
- พื้นที่ดับไฟ
