



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

31 ก.ค. 67

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 719./2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 15 ก.ค. 2567
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมนางนางนงนุช ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย วงจร DAA ๐๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DAA05R-01	3 ส.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา/ พาดสาย หลัง DAA05R-01 หนองหิน	DAA5R-01 หนองหิน	ดิสชั่วคราว ต้นโพธิ์ใหญ่	นายศันรินทร์ แก้วบ้านกัน พงษ.4 ผจก.กฟอ.ดบ. 080-9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 3 ต.หนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสรูด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสรูด ๑.๒ ไม่มีโอกาสรูด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.875804... Long: ...99.848597.....
3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.894619... Long: ... 99.83871.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ลงชื่อ.....

(นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA5 จาก DAA5R-01 ถึง ดิส.ชั่วคราว ต้นโพธิ์ใหญ่
ในวันที่ 3 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 992/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เกษมณู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางวรวิทย์ ศรีศักดิ์

(นายอภิสิทธิ์ เกษมณู)
อ.ก.ปบ. ๕ แทน ผคฟ.ดบ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.ดบ., กฟส.๑๖.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผจก. - (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... -..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองหิน (DAA05R-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา-พาดสาย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 992/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	20 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 2. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ดบ.		R แยกหนองหิน
3	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ดช.		R หนองแกสามหนอง
4	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DAA06						
5	DIS.Tie DAA05-DAA06	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ชค.สามแยกหนองหิน
6	DIS. วงจร DAA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชค.ต้นโพธิ์ใหญ่
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	DAA05R-01	สับ	ปลด		ดบ.		R แยกหนองหิน
9	Sw.Load DAA05R-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS ด้าน Load R.แยกหนองหิน
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
14	DAA06R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ดช.		R หนองแกสามหนอง
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
16	แจ้งจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G2						
19	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
20	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ดช.		R หนองแกสามหนอง
21	เมื่อพร้อมดับไฟ						
22	Sw.Load DAA05R-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ด้าน Load R.แยกหนองหิน
23	DAA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT,GND		ดบ.		R แยกหนองหิน
24	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วนกลับจาก DAA06						
25	DIS. วงจร DAA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ชค.ต้นโพธิ์ใหญ่
26	DIS. วงจร DAA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชค.สามแยกหนองหิน
27	DAA05R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ดบ.		R แยกหนองหิน
28	DAA06R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ดช.		R หนองแกสามหนอง
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผ่นที่ ๕

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย

วงจร DAA 05 บริเวณ DAA5R-01 หนองหิน ถึง ตัดชั่วคราวต้นโพธิ์ใหญ่

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

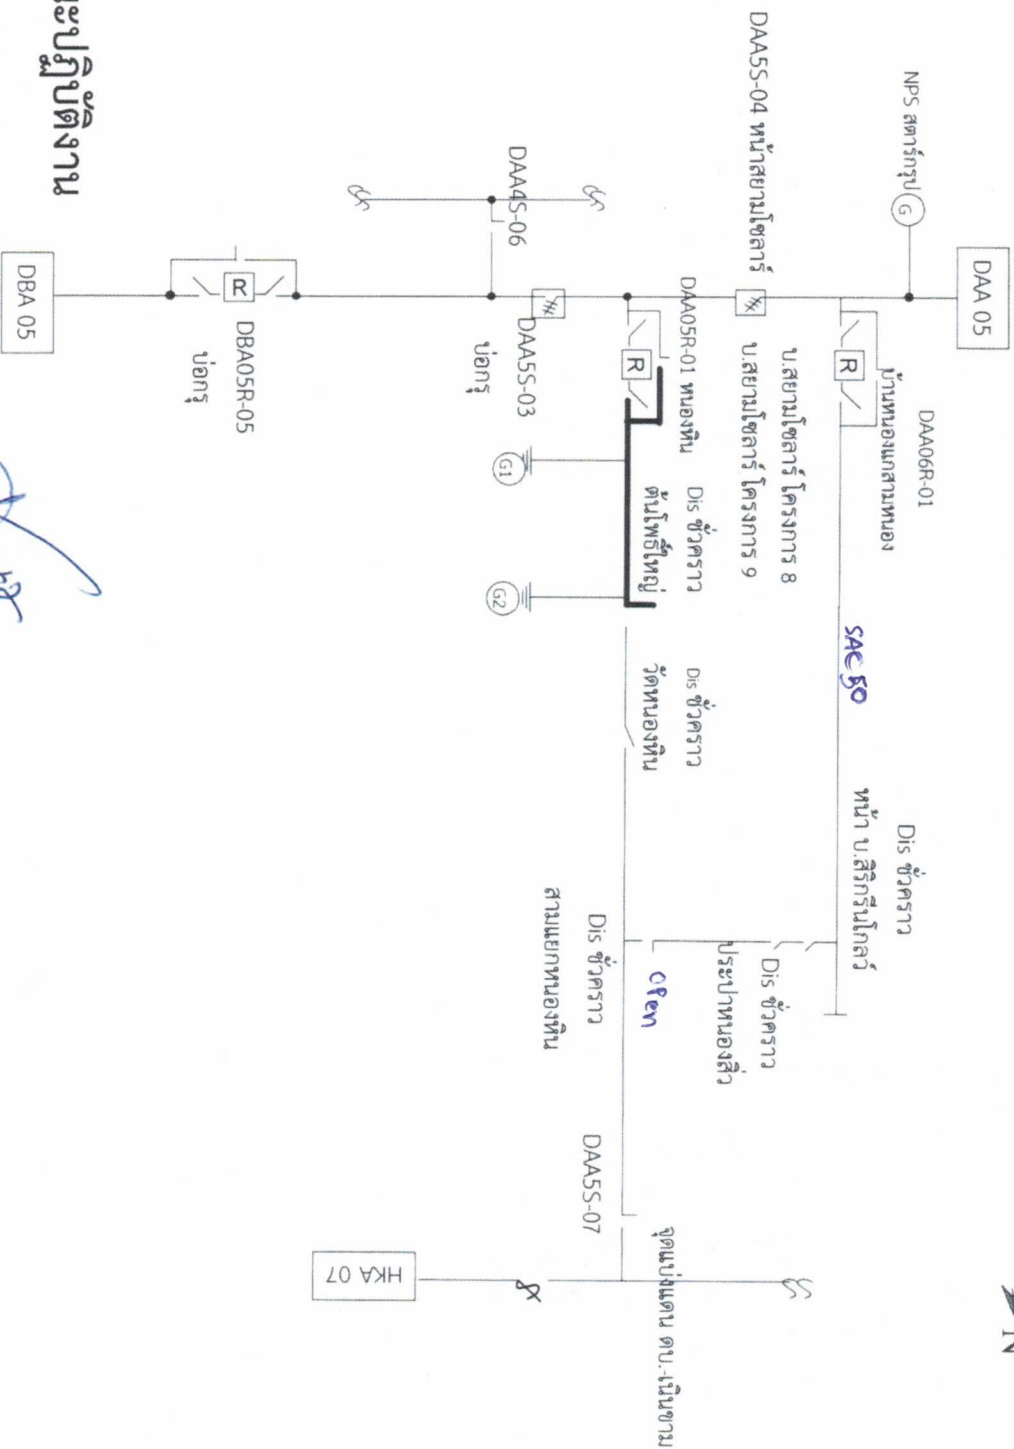

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายหลังรีดลสเซอร์ DAA5R-01 หนองหิน

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

Signature
