

# Switching Deadline

21 ก.ค. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ตจ.(กป.)-๓๑๐๖ ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ DIS ชั่วคราว สามแยกผู้ใหญ่เสม ถึง DIS ชั่วคราวสามแยกตงกระเซา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเคอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ   | จาก                            | ถึง  | ผู้ควบคุมงาน                      |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| ๑.  | ๑        | ๒๔ ก.ค. ๖๔   | ๐๘.๓๐ น.    | ๑๖.๐๐ น. | ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านสวน สัก - บ้านรางผักเอด (P-TDD๒.๓-I-DOJIA.๐๐๓๓) | DIS ชั่วคราว สามแยกผู้ใหญ่ เสม | DIS ชั่วคราว ตงกระเซา<br>นายไพรัช พุ่มวงศ์<br>๑๖.๑๐ น. | นายอาคม แจ่มสว่าง<br>๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).บริเวณสามแยกผู้ใหญ่เสมอ สามแยกตงกระเซา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอาคม แจ่มสว่าง ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์ โทร.๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพรัช พุ่มวงศ์) 14 ก.๗.๖๔  
ผ.จก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1. พิดเคอร์ 10A01 จาก สามแยกผู้ใหญ่เสมอ ถึง DIS ๕๓. ชั่วคราว ตงกระเซา ๑๓.  
ในวันที่ 24 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา ๐8:30 น. ถึง 16:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 995  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย รณภพ อธิวัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย.อาคม. แจ่มสว่าง  
15 ก.ค. 64

นาย รณภพ อธิวัฒน์  
ว.จ.กฟส.อ.ด.จ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผ.จก. กฟส.๑๐.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น  
ผคฟ. (สถานี) )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ส่งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |  |          |   |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | DIS ชค.สามแยกผู้ใหญ่เสม - DIS ชค.บ้านรางฝักกระเฉด  |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 24 ก.ค. 64   | ระหว่าง  | 08.30 น. ถึง 16.00 น.                     |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.ดจ.  | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 995 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์   |          | วันที่ 15 กรกฎาคม 2564                    |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 15 กรกฎาคม 2564                    |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 15 กรกฎาคม 2564                    |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายโมเช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศุภสวัสดิ์,นายสุธี,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. เพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |   |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ         |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|------------------|
| 1   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง |                                      |                      |      |              |            |                  |
| 2   | DOA-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | DOA          | -          | -                |
| 3   | DOA01VB-01   | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose   |      | DOA          | -          | -                |
| 4   | SPC-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SPC          | -          | -                |
| 5   | SPC02VB-01   | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose   |      | SPC          | -          | -                |
| 6   | ย้ายโหลด DOA01 บางส่วนไปรับไฟจาก SPC02             |                                      |                      |      |              |            |                  |
| 7   | DOA01S-08  | ปลด                                  | สับ                  |      | ดจ.          | SCADA      | แยกบ้านดงกระเซา  |
| 8   | DOA01S-13  | ปลด                                  | สับ                  |      | ดจ.          | DIS        | ข้างโรงสีชนพัฒนา |
| 9   | DIS ชค.ไลน์ DOA01                                  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | ดจ.          | DIS        | บ้านรางฝักกระเฉด |
| 10  | DOA01S-08  | สับ                                  | ปลด                  |      | ดจ.          | SCADA      | แยกบ้านดงกระเซา  |
| 11  | เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.                       |                                      |                      |      |              |            |                  |
| 12  | DIS ชค.ไลน์ DOA01                                  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | ดจ.          | DIS        | สามแยกผู้ใหญ่เสม |
| 13  | แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1                 |                                      |                      |      |              |            |                  |
| 14  | แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2                 |                                      |                      |      |              |            |                  |
| 15  | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ                   |                                      |                      |      |              |            |                  |
| 16  | แจ้ง กฟส.ดจ.ปฏิบัติงานทำงานได้                     |                                      |                      |      |              |            |                  |
| 17  | DOA-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | DOA          | -          | -                |
| 18  | DOA01VB-01   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose    |      | DOA          | -          | -                |
| 19  | SPC-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SPC          | -          | -                |
| 20  | SPC02VB-01   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose    |      | SPC          | -          | -                |
| 21  | สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า                         |                                      |                      |      |              |            |                  |
| 22  | เมื่อ กฟส.ดจ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ               |                                      |                      |      |              |            |                  |
| 23  | DOA-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | DOA          | -          | -                |
| 24  | DOA01VB-01   | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose   |      | DOA          | -          | -                |


| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                  |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------|------------------|
| 25  | SPC-TP1                                      | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SPC          |            | -        | -                |
| 26  | SPC02VB-01                                   | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose   |      | SPC          |            | -        | -                |
| 27  | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 |                                      |                      |      |              |            |          |                  |
| 28  | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2 |                                      |                      |      |              |            |          |                  |
| 29  | DIS ชด.ไลน์ DOA01                            | ปลด                                  | สับ                  |      | ดจ.          |            | DIS      | สามแยกผู้ใหญ่เสม |
| 30  | ย้ายโหลด DOA01 บางส่วนกลับจาก SPC02          |                                      |                      |      |              |            |          |                  |
| 31  | DOA01S-08                                    | ปลด                                  | สับ                  |      | ดจ.          | SCADA      | SF6      | แยกบ้านดงกระเซา  |
| 32  | DIS ชด.ไลน์ DOA01                            | ปลด                                  | สับ                  |      | ดจ.          |            | DIS      | บ้านรางฝักกระเดด |
| 33  | DOA01S-13                                    | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | ดจ.          |            | DIS      | ข้างโรงสีชนพัฒนา |
| 34  | DOA01S-08                                    | สับ                                  | ปลด                  |      | ดจ.          | SCADA      | SF6      | แยกบ้านดงกระเซา  |
| 35  | DOA-TP1                                      | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | DOA          |            | -        | -                |
| 36  | DOA01VB-01                                   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose    |      | DOA          |            | -        | -                |
| 37  | SPC-TP1                                      | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SPC          |            | -        | -                |
| 38  | SPC02VB-01                                   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose    |      | SPC          |            | -        | -                |
| 39  | สิ้นสุด Switching ทั้งหมด                    |                                      |                      |      |              |            |          |                  |

# ผังก่อนดับไฟ

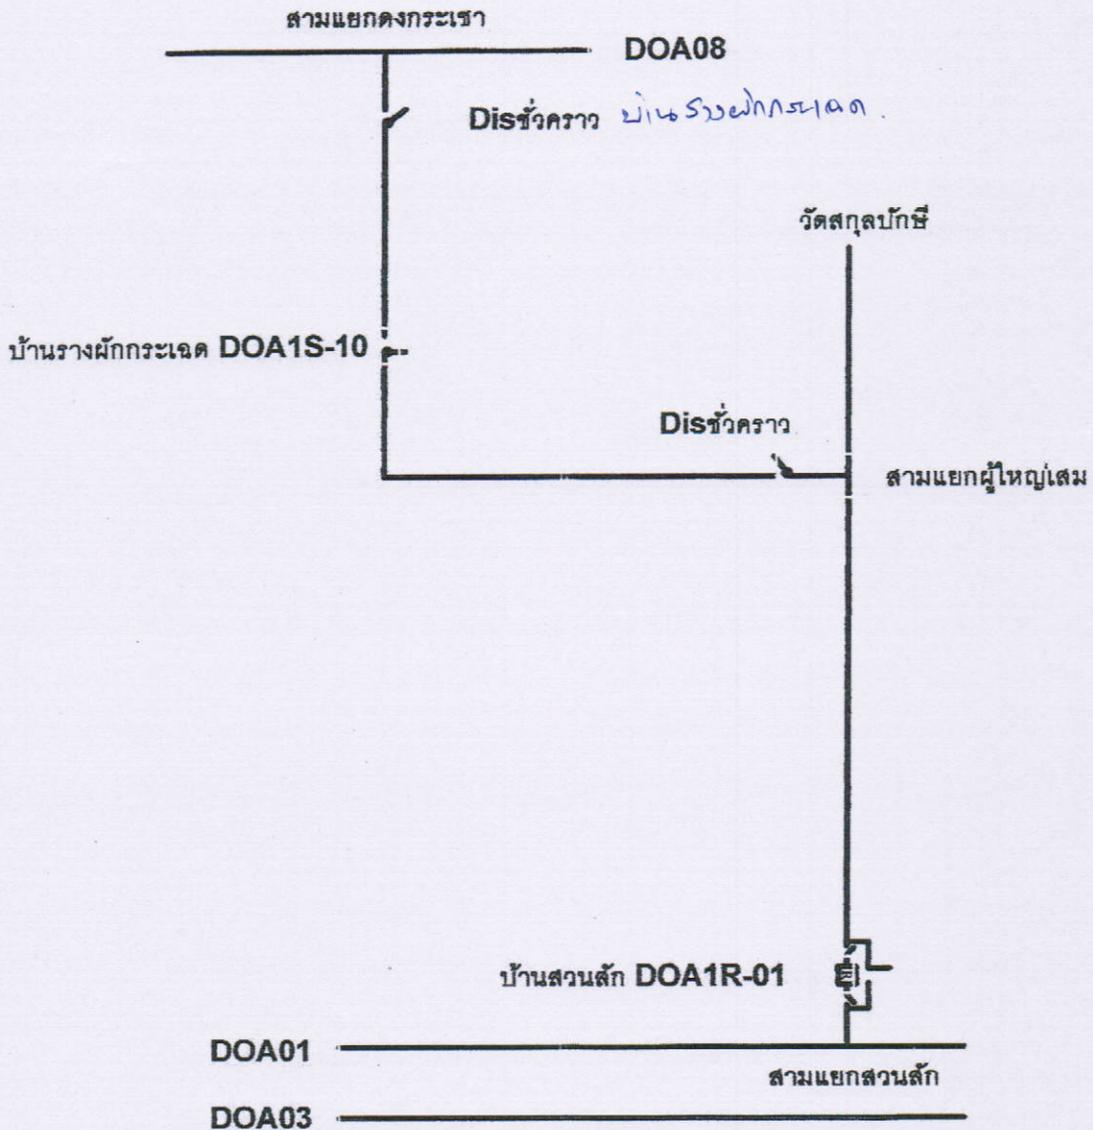

|  |  |   |
|--|--|---|
| กฟส.อ.ดอนเจดีย์<br>ภาค 3 เขต 3   | <b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b>   | ใช้แทนแบบ.....<br>ถูกแทนโดยแบบ.....<br>เขียนเสร็จวันที่.....<br>แก้แบบวันที่.....<br>มิติเป็น.....เมตร.....<br>มาตรฐาน.....<br>แบบเลขที่..... |
| ผู้เขียน นายชวาท แจ่มสว่าง<br>ผู้สำรวจ นายชวาท แจ่มสว่าง<br>หัวหน้าแผนก.....<br>วิศวกร.....<br>ผู้จัดซื้อ.....<br>ผู้อำนวยการกอง.....<br>ผู้อำนวยการเขต..... | แผนผัง Switching<br><br>กฟส.ตจ.บริเวณสามแยกผู้ใหญ่เสม-ดงกระเขา(F1) |   |

# ผังหลังดับไฟ

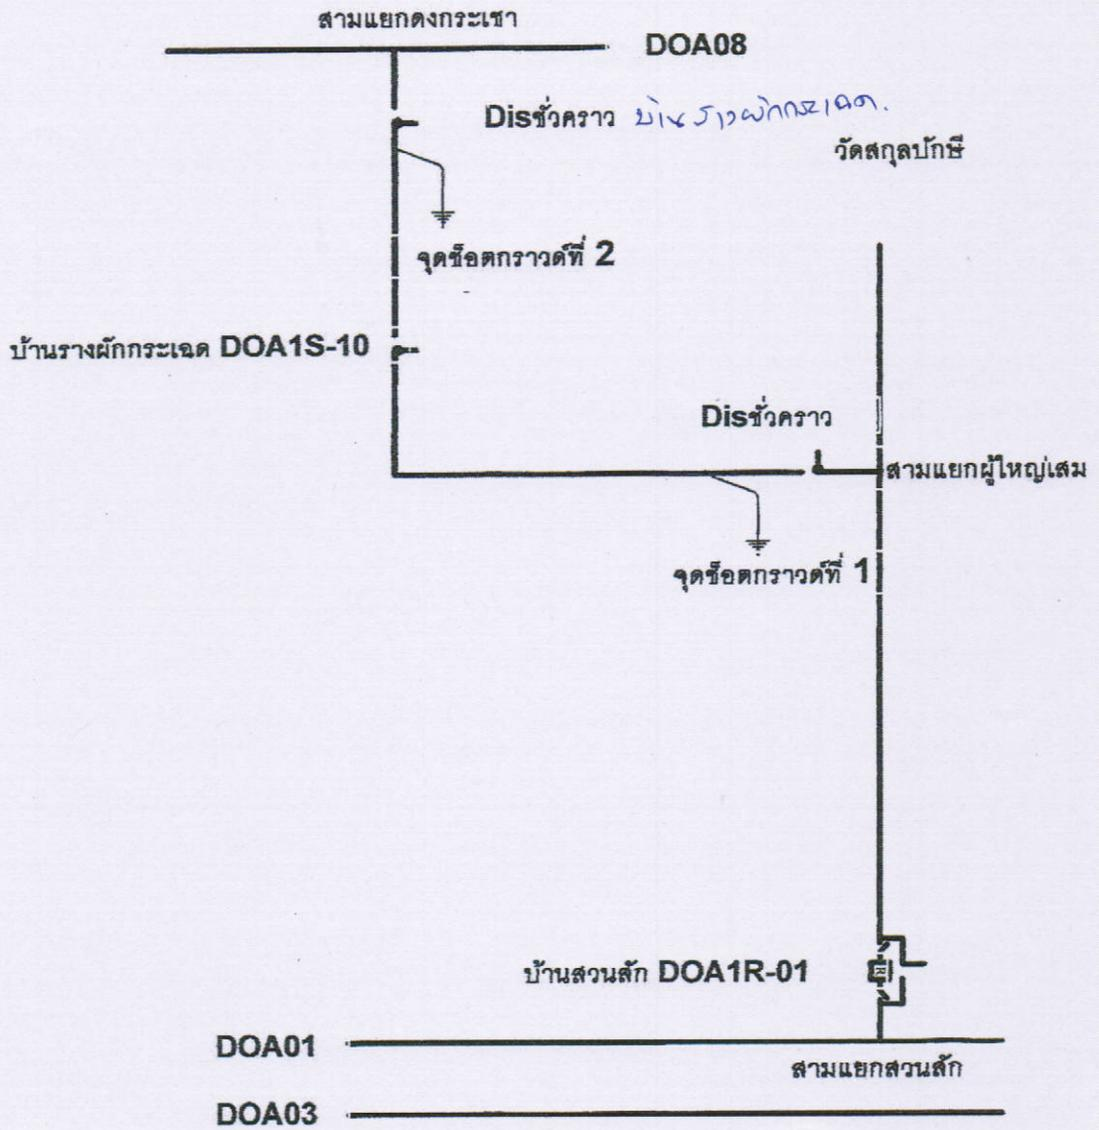

|   |  |   |
|---|--|---|
| กฟส.อ.ดอนเจดีย์<br>ภาค 3 เขต 3  | <b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b>                 | ใช้แทนแบบ.....<br>ถูกแทนโดยแบบ.....<br>เขียนเสร็จวันที่.....<br>แก้แบบวันที่.....<br>มิติเป็น.....เมตร.....<br>มาตรฐาน.....<br>แบบเลขที่..... |
| ผู้เขียน นายอาคม แจ่มสว่าง<br>ผู้สำรวจ นายอาคม แจ่มสว่าง<br>หัวหน้าแผนก.....<br>วิศวกร.....<br>ผู้จัดการ.....<br>ผู้อำนวยการกอง.....<br>ผู้อำนวยการเขต..... | <b>แผนผัง Switching</b>                    |   |
|   | กฟส.ดจ.บริเวณสามแยกผู้ใหญ่เสม-ดงกระเขา(F1) |   |
