



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

23 มิ.ย. 66

เลขที่ ก.๓.สค.(ปบ) ๒๙๐๘ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวนุตร

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.ชั้น๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวเสาไฟเข้าที่ผู้ใช้ไฟ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้


ก	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	THU๐๔	๒๔ มิ.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวเสาไฟเข้าที่ผู้ใช้ไฟ บริเวณ โค้งก่อนออกถนน ซอยอภิทูน (กรณีเร่งด่วน เนื่องจากผู้ใช้ไฟร้องเรียน)	จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า	SMB๑๑S-๐๗ ท้ายช.ต้นโพธิ์	นายสมพาศน์ อางน้อย โทร.๐๖๓-๘๖๙๘๓๓๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ทส.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายยศพัทธ์ บัวนุตร)


ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเตอร์ THU04 จาก จุดตัด DDE ถึง SMB11S-07
ในวันที่ 24 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 996/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิริภัทรา โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอำนาจ เทียนทอง


(นายสิริภัทรา โพธิ์พันธ์)
๑๙๖.๔ 11กน นท.ดพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.สค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1แผ่น
แผนผังแนบ..... 2แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โค้งก่อนออกถนนซอยอภิทุน (THU04)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 มิ.ย. 66	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาไฟเข้าที่ผู้ใช้ไฟ ตามใบขอปฏิบัติงาน 996/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์	วันที่ 21 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	THUBR-04	Normal	Nonreclosing		THU		R
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
4	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลดจุดจัมบริเวณ <u>ก่อน</u> Dis ท้ายขอยตั้นโพธิ์ SMB11S-07 ออกทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
5	เมื่อชุด Hotline กระเช้า ทำการปลดจุดจัมบริเวณ <u>ก่อน</u> Dis ท้ายขอยตั้นโพธิ์ SMB11S-07 ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
6	<u>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ</u>						
7	แจ้ง กฟจ.สค. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
8	แจ้ง กฟจ.สค. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
9	แจ้งให้ กฟจ.สค. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
10	THUBR-04	Nonreclosing	Normal		THU		R
11	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
13	THUBR-04	Normal	Nonreclosing		THU		R
14	แจ้ง กฟจ.สค. ปลด Short ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟจ.สค. ปลด Short ground จุด G2						
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อมจุดจัมบริเวณ <u>ก่อน</u> Dis ท้ายขอยตั้นโพธิ์ SMB11S-07 เข้าทั้ง 3 เฟส						
18	เมื่อชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อมจุดจัมบริเวณ <u>ก่อน</u> Dis ท้ายขอยตั้นโพธิ์ SMB11S-07 เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
19	THUBR-04	Nonreclosing	Normal		THU		R
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

DIS ติดตั้งตัว
BALSS-04

BALSS-07
บ. ปากซ.แยกวัดศิริ

SMBIIS-08
บ. ใต้ถุน กฟผ.

SMBIIS-07
บ. ก๊าซ.ต้นโพธิ์

หน้า บ. ไทยกัลวานิค
THS6S-03

ถนน



ซอย 8

ซอย 7

ซอย 5

ถนน

ถนน

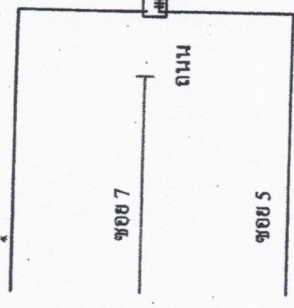

DIS ติดตั้งตัว
BALSS-04

สะพานอากาศสายไฟถนนบริเวณ

BALSS-07
บ. ปากซ. แยกวัดศิริ

SMBILS-08
บ. ใต้โลโก้

SMBILS-07
บ. ท้ายซ. ต้นโพธิ์

จุดตัดสายไฟ
/ ซอยตัดแยกสายไฟ

พื้นที่บริเวณ
* ไม่มีแนวผู้ไฟ

หน้า บ. ไทยกัลวาไนซ์
THS8S-03

ถนน

ซอย 8

ซอย 7

ถนน

ซอย 5

ถนน

