

Switching Deadline

14/07/67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท. ๕๗๖/๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์วิลาศวรรณ์ชล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๑๕-๑๖ กค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ UG ๑๑๕ และ พาดสายส่ง ๑๑๕ เควี แยกไฟสี	ดิสชั่วคราว ร้านปึกไม้ จุดตัด DDE จุดที่ 3	จุดตัด DDE จุดที่ 2, ดิสชั่วคราวแยกไฟสี วงจรถ่าง	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	UTG09	๑๕-๑๖ กค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ UG ๑๑๕ และ พาดสายส่ง ๑๑๕ เควี แยกไฟสี	จุดตัด DDE จุดที่ 1	UTG09s-04 แยกไฟสี	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.ก. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG05 จาก จุดตัด DDE จุดที่ 2 ถึง DIS ชด. ร้านปึกไม้
ในวันที่ 15-16 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 971/67
จุดตัด DDE จุดที่ 3 DIS ชด. แยกไฟสี

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ UTG09 จาก จุดตัด DDE จุดที่ 1 ถึง UTG09s-04
ในวันที่ 15-16 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวุฒิ แก้ววิมล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ
11 ก.ค. 67


(นายจิรวุฒิ แก้ววิมล)
อ.ค. 5 บ.ท.บ. ช.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. พทท. , กฟล. นจก.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	แยกไฟสี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15,16 ก.ค. 67	เวลา	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ UG115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 971/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัฒน์ แก้วสมนึก		วันที่ 11 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโนช, นายวรรณพงษ์ 2. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
4	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
5	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
6	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG05						
7	UTG05S-08	ปลด	สับ		ทกจ.		SF6 ดึงข้ามถนนแยกไฟสี
8	UTG09S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทกจ.		SF6 แยกไฟสีเลาขวัญ
9	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG09						
10	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
11	SF6 ชค. แยกไฟสี	ปลด	สับ		ทกจ.		SF6 แยกไฟสี
12	DIS ชค. UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.		DIS คริวปีกไม้
13	UTG05S-10	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS ตรงข้ามวัดทิพย์
14	DIS ชค. UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.		DIS แยกไฟสี ตรอ
15	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
16	เมื่อพร้อมดับไฟ						
17	DIS ชค. UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.		DIS แยกไฟสี
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
19	แจ้งหน่วยงานไลน์โหลดจาก SF6 UTG09S-04 ถึง จุดตัด DDE จุดที่ 1						
20	แจ้งหน่วยงานไลน์โหลดจาก DIS ชค. คริวปีกไม้ ถึง จุดตัด DDE จุดที่ 2						
21	แจ้งหน่วยงานไลน์โหลดจาก DIS ชค. แยกไฟสี ตรอ ถึง จุดตัด DDE จุดที่ 3						
22	เมื่อหน่วยงานไลน์โหลดจาก SF6 UTG09S-04 ถึง จุดตัด DDE จุดที่ 1 แล้วเสร็จ						
23	เมื่อแจ้งหน่วยงานไลน์โหลดจาก DIS ชค. คริวปีกไม้ ถึง จุดตัด DDE จุดที่ 2 แล้วเสร็จ						
24	เมื่อแจ้งหน่วยงานไลน์โหลดจาก DIS ชค. แยกไฟสี ตรอ ถึง จุดตัด DDE จุดที่ 3 แล้วเสร็จ						
25	แจ้ง Hotline ตัด DDE จุดที่ 1, 2 และ 3						
26	เมื่อ Hotline ตัด DDE จุดที่ 1, 2 และ 3 แล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
30	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
31	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
32	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
33	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
34	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
35	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
36	ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดกลับ						
37	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- -
38	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- -
39	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- -
40	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- -
41	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
42	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
43	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
44	แจ้ง Hotline เชื่อม DDE จุดที่ 1,2 และ 3						
45	เมื่อ Hotline เชื่อม DDE จุดที่ 1,2 และ 3 แล้วเสร็จ						
46	DIS ชค. UTG05	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS แยกไฟสี่
47	ย้ายโหนด UTG05 กลับจาก UTG09						
48	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
49	DIS ชค. UTG05	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS แยกไฟสี่ ทรอ
50	UTG05S-10	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		ทกจ.		DIS ตรงข้ามวัดทิพย์
51	DIS ชค. UTG05	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS ครั้วปีกไม้
52	SF6 ชค. แยกไฟสี่	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทกจ.		SF6 แยกไฟสี่
53	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
54	ย้ายโหนด UTG09 กลับจาก UTG05						
55	UTG09S-04	ปลด	สับ		ทกจ.		SF6 แยกไฟสี่เลาขวัญ
56	UTG05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทกจ.		SF6 ดึงข้ามถนนแยกไฟสี่
57	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
58	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
59	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
60	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ผู้ควบคุม

- 1) เริ่ม UTCS-08
- 2) เปิด UTCS-04
- 3) เปิด DDE ชุดที่ 1 (เปิด Hotline)
- 4) เปิด สวิตช์การวาง เครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์
- 5) เริ่ม SF 6 ซึ่งการวางเหล็กไฟ
- 6) เปิด DDE ชุดที่ 2 (เปิด Hotline)
- 7) เปิด สวิตช์การวางเหล็กไฟและอุปกรณ์
- 8) เปิด DDE ชุดที่ 3 (เปิด Hotline)

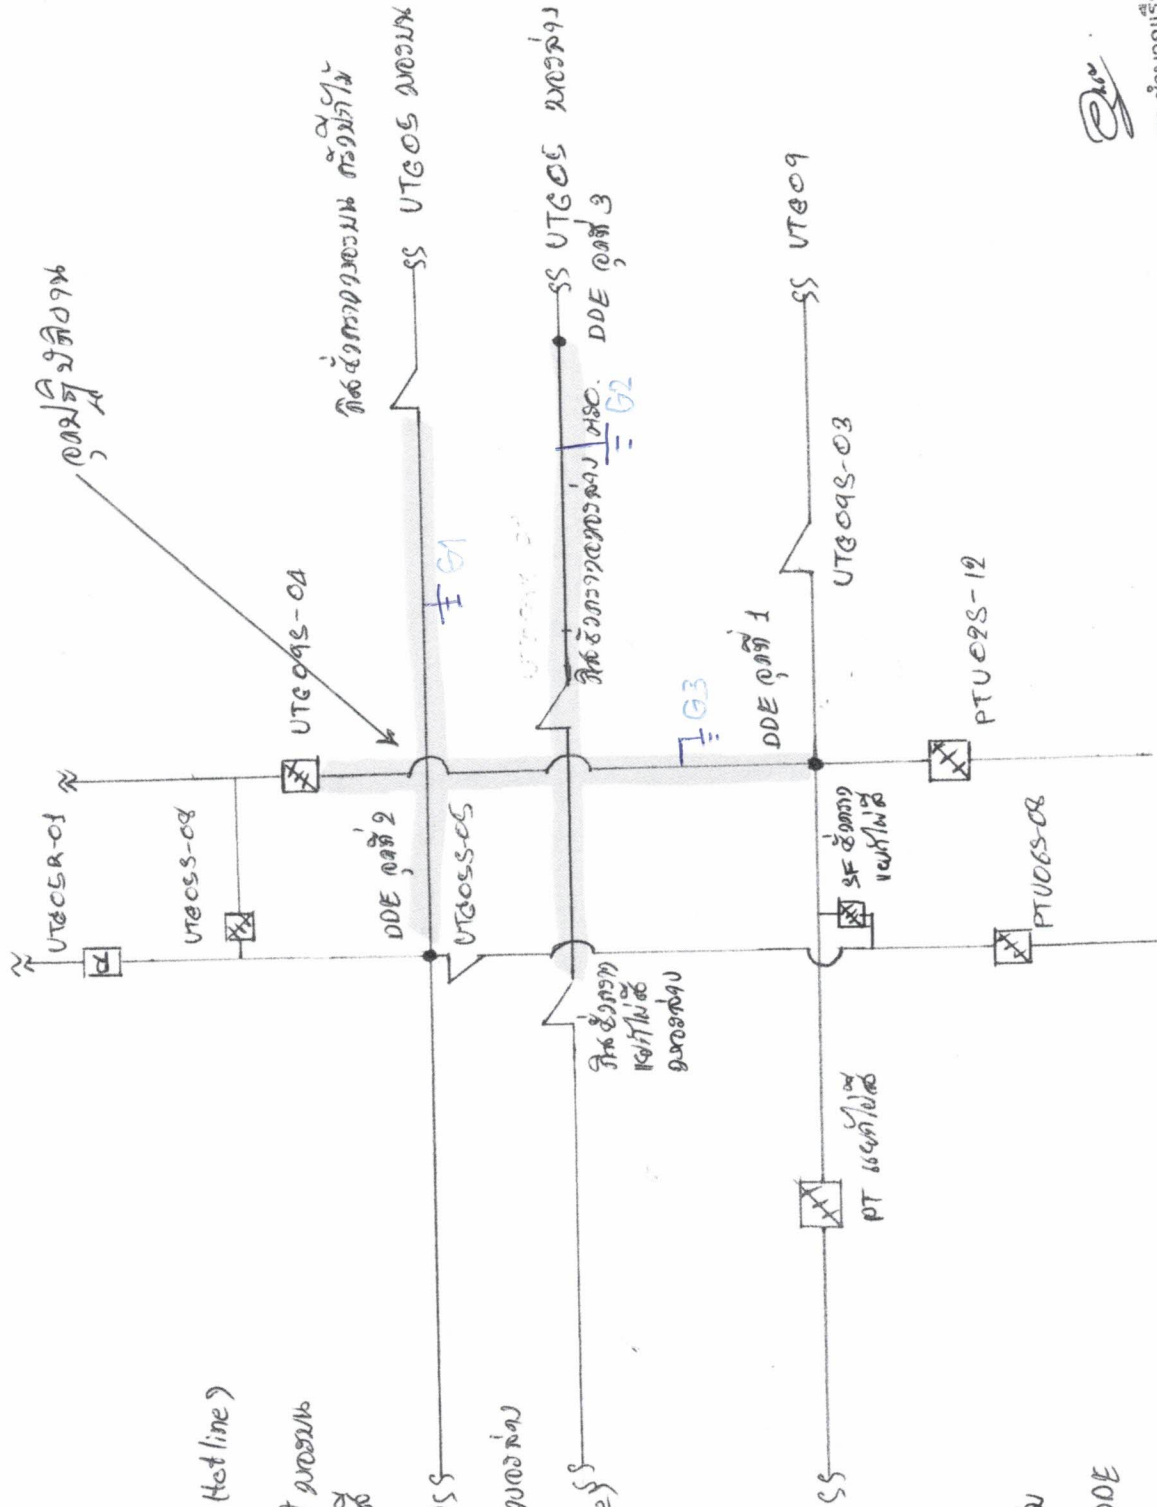

ผู้ควบคุม

- เปิด DDE

(นายอนุชา ชำนาญเรือ)
 ชม.กบ.กฟส.อ.พพน.
