วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
18 เม.ย. 68

เลขที่ ก.๓ อมน.(ปบ.) 594 /2568
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ 11 เมษายน 2568
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการ กฟส.อ้อมน้อย ขอดับไฟระบบ 115 เควี ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไร่ขิ่งระยะที่ 3 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	115 kV	21 เม.ย. 68	08.00 น.	17.00 น.	ขอดับไฟระบบ 115 เควี ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไร่ขิ่งระยะที่ 3	SAA06YS-01	OYK03YS-01	นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู 063-246-4953
2.	115 kV	22 เม.ย. 68	08.00 น.	17.00 น.		SAA06YS-01	OYK03YS-01	
3.	115 kV	23 เม.ย. 68	08.00 น.	17.00 น.		SAA06YS-01	OYK03YS-01	
4.	115 kV	24 เม.ย. 68	08.00 น.	17.00 น.		SAA06YS-01	OYK03YS-01	
5.	115 kV	25 เม.ย. 68	08.00 น.	17.00 น.		SAA06YS-01	OYK03YS-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.6 ผปบ. โทร 063-246-4953

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. ☑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☑ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3 . ☑ พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : 13.7226547,100.2985613

3.2 สิ้นสุด Lat : 13.722336,100.2985421

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.
11 เมษายน 2568

แผนกปฏิบัติการฯ
โทร 02-420-6656

<u>สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓</u>

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-5 ฟีดเดอร์ 115kV จาก SAA64B-01 ถึง OYU34B-01 ในวันที่ 21,22,23,24,25 พ.ย.68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 629/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.......... ฟีดเดอร์.......... จาก.......... ถึง.......... ในวันที่.......... ตั้งแต่เวลา.......... น. ถึง.......... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่..........

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.......... ฟีดเดอร์.......... จาก.......... ถึง.......... ในวันที่.......... ตั้งแต่เวลา.......... น. ถึง.......... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.......... ฟีดเดอร์.......... จาก.......... ถึง.......... ในวันที่.......... ตั้งแต่เวลา.......... น. ถึง.......... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.......... ฟีดเดอร์.......... จาก.......... ถึง.......... ในวันที่.......... ตั้งแต่เวลา.......... น. ถึง.......... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศุภสวัสดิ์ ธาราจารุสวัสดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเด่นรัสมิ์ภัทร์ ทวนนุ

(signature)

(นายวิวัฒน์ ศาสตร์โพธิ์ทา)

หผค.7 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

<u>สำหรับผู้อนุมัติ</u>

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อ.เมือง, กฟส.นช, กฟส.ศพร., กฟส.พทท.

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

<u>อนุมัติ</u> และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานีฯ SAA, OYU)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(signature)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(signature)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน บริเวณชุมชนไร่ขิง (ดับ 115 เควี SAA-OYK) ดับเช้า-จ่ายเย็น
2. กำหนดวันที่ทำงาน 21-25 เม.ย. 68 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.อมน. งานที่ทำ กรมทางฯ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ตามใบขอปฏิบัติงาน 629/2568
4. เตรียมการ Switching โดย นายศุภสวัสดิ์ ธาราจารุสวัสดิ์ วันที่ 15 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบ Switching โดย (ลายมือชื่อ) วันที่ 15 เมษายน 2568
6. อนุมัติ Switching โดย (ลายมือชื่อ) วันที่ 15 เมษายน 2568
7. สั่งทำ Switching โดย
   1. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
   2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
   3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
	งานที่ทำ : 1) วันที่ 21,22,23,24 และ 25 เม.ย. 68 ดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ SAA-OYK (Open Loop) ดับเช้า-จ่ายเย็น							
	2)วันที่ 21,22,23,24 และ 25 เม.ย. 68 ระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี กฟส.อ้อมน้อย จะขอ Manuan เข้ามา และครอบการ์ดไว้							
1	**ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำ Switching**							
2	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟระบบ 115 เควี ที่สถานีฯ นครชัยศรี 1 BUS 115 kV จ่ายไฟอยู่ตามสภาพปกติ							
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์115 เควี รหัส NCABYB-01 สถานะ OPEN และใบมีด 115 เควี รหัส NCABYS-01,02 สถานะ Close							
4	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟระบบ 115 เควี สถานีฯ นครชัยศรี 1 Loop NCA01YB-01, NCA05YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ							
5	**Open Loop NCA01YB-01, NCA05YB-01 สถานีฯ นครชัยศรี 1**							
6	OYM01YB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		OYM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	OYM01YB-01	สับ	**ปลด**		OYM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	**ทำการจัด BUS 115 kV สถานีฯ นครชัยศรี 1 (ย้ายโหลดเบย์ NCA01Y ไปจ่ายจาก BUS 2 (115 kV Inc.2))**							
9	NCA01YB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		NCA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	NCABYB-01	ปลด	**สับ**		NCA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	NCA01YS-02	ปลด	**สับ**		NCA		-	ใบมีด 115 เควี
12	NCA01YS-01	สับ	**ปลด**		NCA		-	ใบมีด 115 เควี
13	NCABYB-01	สับ	**ปลด**		NCA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	NCA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		NCA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟระบบ 115 เควี สถานีฯ สามพราน 1 Loop SAA05YB-01, SAA06YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ							
16	**Open Loop SAA05YB-01, SAA06YB-01 สถานีฯ สามพราน 1**							
17	PMB01YB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		PMB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	PMB01YB-01	สับ	**ปลด**		PMB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	**ย้ายโหลดสถานีฯ พุทธมณฑล 2 และสถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ นครชัยศรี 1**							
20	SAA06YB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	OYK03YB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	PMB05YB-01	ปลด	**สับ คง "OFF" Auto Reclose**		PMB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	OYK03YB-01	สับ	**ปลด**		OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	OYK03YS-01	สับ	**ปลด**		OYK		-	ใบมีด 115 เควี
25	OYK03YS-03	สับ	**ปลด**		OYK		-	ใบมีด 115 เควี
26	PMB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		PMB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	SAA06YB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	**เมื่อพร้อมดับไฟ**							
29	SAA06YB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
30	SAA06YB-01	สับ	**ปลด**		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
31	SAA06YS-01	สับ	**ปลด**		SAA		-	ใบมีด 115 เควี
32	SAA06YS-03	สับ	**ปลด**		SAA		-	ใบมีด 115 เควี
33	**แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย**							
34	**แจ้งให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้**							
	******* สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *******							
35	**หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงใน Wesafe เรียบร้อย**							
36	**เมื่อพร้อมจ่ายไฟ**							
37	SAA06YS-01	ปลด	**สับ**		SAA		-	ใบมีด 115 เควี
38	SAA06YS-03	ปลด	**สับ**		SAA		-	ใบมีด 115 เควี
39	SAA06YB-01	ปลด	**สับ คง "OFF" Auto Reclose**		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
40	SAA06YB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
41	**ย้ายโหลดสถานีฯ พุทธมณฑล 2 และสถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 กลับจากสถานีฯ นครชัยศรี 1**							
42	PMB05YB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		PMB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
43	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		SAC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
44	OYK03YS-01	ปลด	**สับ**		OYK		-	ใบมีด 115 เควี
45	OYK03YS-03	ปลด	**สับ**		OYK		-	ใบมีด 115 เควี
46	OYK03YB-01	ปลด	**สับ คง "OFF" Auto Reclose**		OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
47	PMB05YB-01	สับ	**ปลด**		PMB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
48	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SAC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
49	OYK03YB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
50	**จ่ายไฟ Close Loop SAA05YB-01, SAA06YB-01 สถานีฯ สามพราน 1**							
51	PMB01YB-01	ปลด	**สับ คง "OFF" Auto Reclose**		PMB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
52	PMB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		PMB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
53	**ทำการจัด BUS 115 kV สถานีฯ นครชัยศรี 1 กลับสภาพปกติ**							
54	NCA01YB-01	"ON" Auto Reclose	**"OFF" Auto Reclose**		NCA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
55	NCABYB-01	ปลด	**สับ**		NCA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
56	NCA01YS-01	ปลด	**สับ**		NCA		-	ใบมีด 115 เควี
57	NCA01YS-02	สับ	**ปลด**		NCA		-	ใบมีด 115 เควี
58	NCABYB-01	สับ	**ปลด**		NCA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
59	NCA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		NCA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
60	**จ่ายไฟ Close Loop NCA01YB-01, NCA05YB-01 สถานีฯ นครชัยศรี 1**							
61	OYM01YB-01	ปลด	**สับ คง "OFF" Auto Reclose**		OYM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
62	OYM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		OYM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
	******* สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *******							

กฟส. อ้อมน้อย เลขที่รับ ๑๒๘๔
วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๕

ที่ นฐ ๐๐๒๒/ ๓๕๑

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น ๓ (ส่วนต่อเติม)
นฐ ๗๓๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไร่ขิง ระยะที่ ๓ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. สัญญาจ้างผู้ให้บริการ เลขที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือผู้ให้บริการ ที่ รข ๓.๐๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

ตามสัญญาที่อ้างถึง ๑. และ ๒. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไร่ขิง ระยะที่ ๓ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และได้ว่าจ้างบริษัท พีคคอนซัลแท้นส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง นั้น

จากการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ พบว่า พื้นที่ก่อสร้างบริเวณฝั่งซ้ายและขวา กม.๗+๕๕๐ ถึง กม.๗+๖๐๐ แนวตอกเสาเข็มอยู่ในแนวที่สายไฟฟ้าพาดผ่าน ทำให้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างงานลำเลียงเสาเข็มและงานตอกเสาเข็ม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม จึงขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายบรรจง สีดา ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๗๕๓ ๐๐๕๙ และนายเอกบุรุษ เผ่าพงษ์ไพบูลย์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๓๔๕๐ ๐๑๒๐ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลิต ไหวไว)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

	รจก.(ล)
✓	รจก.(ท)
	ผชน.๙
	ผชน.๘
	นวช.๙
	นวช.๘
	นตก.
	วศก.
	หผ.สน
	หผ.บร
	หผ.มต
	หผ.บส
✗	หผ.ปบ
	หผ.กส
	หผ.
	จป.
	ห้อง LAN

☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
☑ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)
ผจก. กฟส.อ้อมน้อย
๕ มี.ค. ๒๕๖๘

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร./โทรสาร ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๔๘

" ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที "

บริษัท พีคคอนซัลแท้นส์ จำกัด
PEAK CONSULTANTS CO.,LTD.

1/312 ซ. งามวงศ์วาน 47 แยก 10-7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 Tel/Fax : 02-9547028 Email : Peakcon58@gmail.com

ที่ รขต.๐๑๗/๒๕๖๘

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผู้รับจ้างขอความอนุเคราะห์รื้อย้ายแนวสายไฟฟ้าทั้งหมด
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไร่ขิง ระยะที่ ๓ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. สัญญาจ้างผู้ให้บริการเลขที่ ๑๗/๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

603
- 4 มี.ค. 2568
11.45

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือผู้รับจ้างที่ NWR/N.๕๗๑/GEN/๐๑๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

ตามสัญญาที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไร่ขิง ระยะที่ ๓ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และได้ว่าจ้างบริษัท พีคคอนซัลแท้นส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างนั้น

จาการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างบริเวณฝั่งซ้ายและฝั่งขวา กม.๗+๕๕๐ ถึง กม.๗+๖๐๐ แนวตอกเสาเข็มอยู่ในแนวที่สายไฟฟ้าพาดผ่าน ทำให้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างงานลำเลียงเสาเข็มและงานตอกเสาเข็ม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ติดต่อประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รื้อย้ายแนวสายไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคกับงานก่อสร้าง บริเวณดังกล่าวให้กับโครงการฯด้วย

โดยมีรายชื่อผู้ติดต่อประสานงานดังนี้

๑.นายบรรจง	สีดา	ช่างไฟฟ้า	เบอร์โทรศัพท์ ๐๖-๑๗๕๓-๐๐๕๙
๒.นายเอกบุรุษ	เผ่าพงษ์ไพบูลย์	วิศวกรโยธา	เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๓๔๕๐-๐๑๒๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระ เตชะเลิศไพศาล)
วิศวกรโครงการ

☐ หน.วข ☐ หน.ฝป
☐ หน.ผม ☐ หน.บท
☐ คุณพิมพกานต์
ทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้าฯ
เพื่อ........................

(นายชลิต ไหวไว)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ NWR/N.571/GEN/017/2568

วันที่ 4 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รื้อย้ายแนวสายไฟฟ้าทั้งหมด
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไร่ขิง ระยะที่ 3 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เรียน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม (ผ่านผู้ให้บริการ)

อ้างถึง 1.สัญญาจ้างเลขที่ 204/2565 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565
2.สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.เอกสารสัญญาโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไร่ขิง ระยะที่ 3 จำนวน 1 ชุด
2.ภาพถ่ายตำแหน่งสายไฟฟ้าที่เป็นอุปสรรคในงานก่อสร้าง

ตามที่อ้างถึง (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไร่ขิง ระยะที่ 3 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และได้มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมตามอ้างถึง (2) นั้น

บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รื้อย้ายแนวสายไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคกับงานก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไร่ขิง ระยะที่ 3 เนื่องจากแนวตอกเสาเข็มอยู่ในแนวที่สายไฟฟ้าพาดผ่าน ทำให้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างงานลำเลียงเสาเข็มและงานตอกเสาเข็มฝั่งขวาและฝั่งซ้ายจาก STA.7+550 ถึง STA.7+600 โดยมีรายละเอียดตำแหน่งเสาไฟฟ้าแรงสูงจาก STA.7+550 ถึง STA.7+600 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตามแบบก่อสร้างเป็นหลักดัง (ภาพถ่ายแนบ)

โดยมีรายชื่อผู้ติดต่อประสานงานดังนี้

1.นายบรรจง	สีดา	ช่างไฟฟ้า	เบอร์โทรศัพท์ 06-1753-0059
2.นายเอกบุรุษ	เผ่าพงษ์ไพบูลย์	วิศวกรโยธา	เบอร์โทรศัพท์ 083-4500120

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไร่ขิง
ระยะที่ 3 กรมโยธาธิการและผังเมือง
เลขรับที่ รข3. 013/2568
วันที่ 4 มี.ค. 68
ลงชื่อ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาเขตต์ รัศมิทัต)
ผู้จัดการโครงการ

ชั้น 18 และ 19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต.บางแก้ว อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 Tax ID: 0107538000096
18th-19th Fl., Bangna Towers A Building, 2/3 Moo14 Bangna-trad Rd., Km. 6.5 Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540
T (66) 2 730 2100
F (66) 2 751 9484-6
sales@nawarat.co.th
www.nawarat.co.th

ภาพถ่ายตำแหน่งสายไฟฟ้าที่เป็นอุปสรรคในงานก่อสร้าง

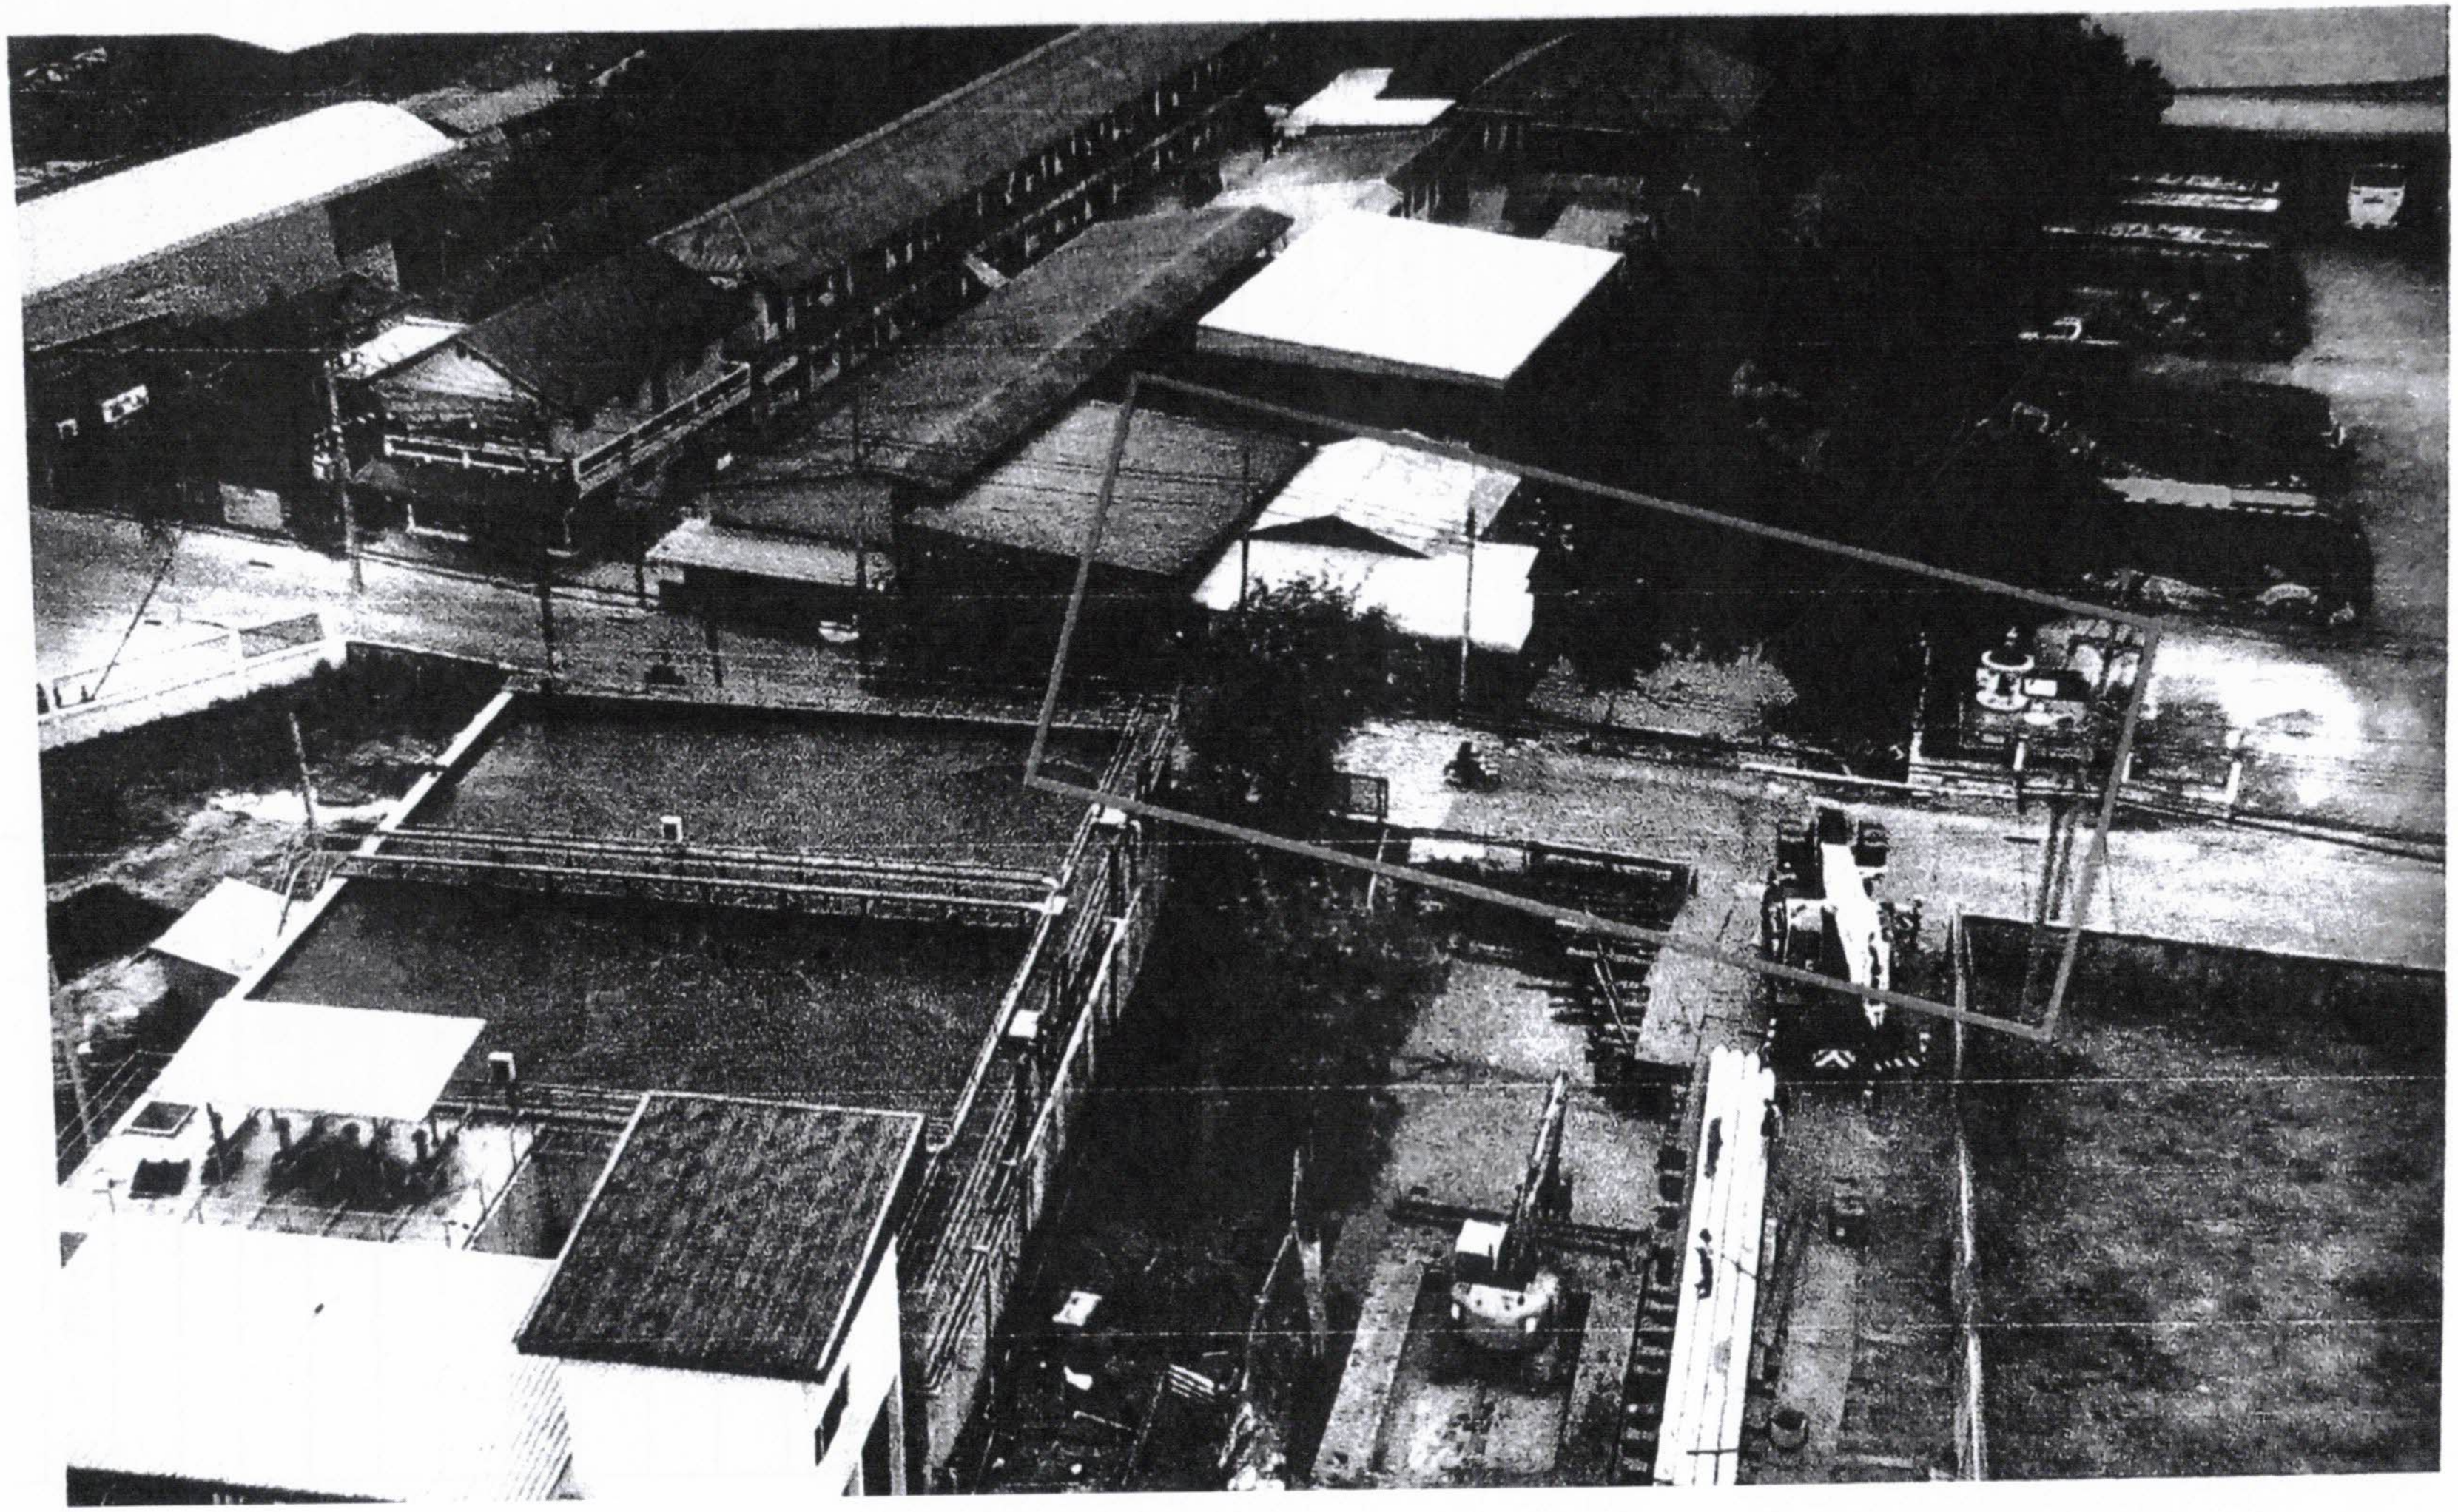

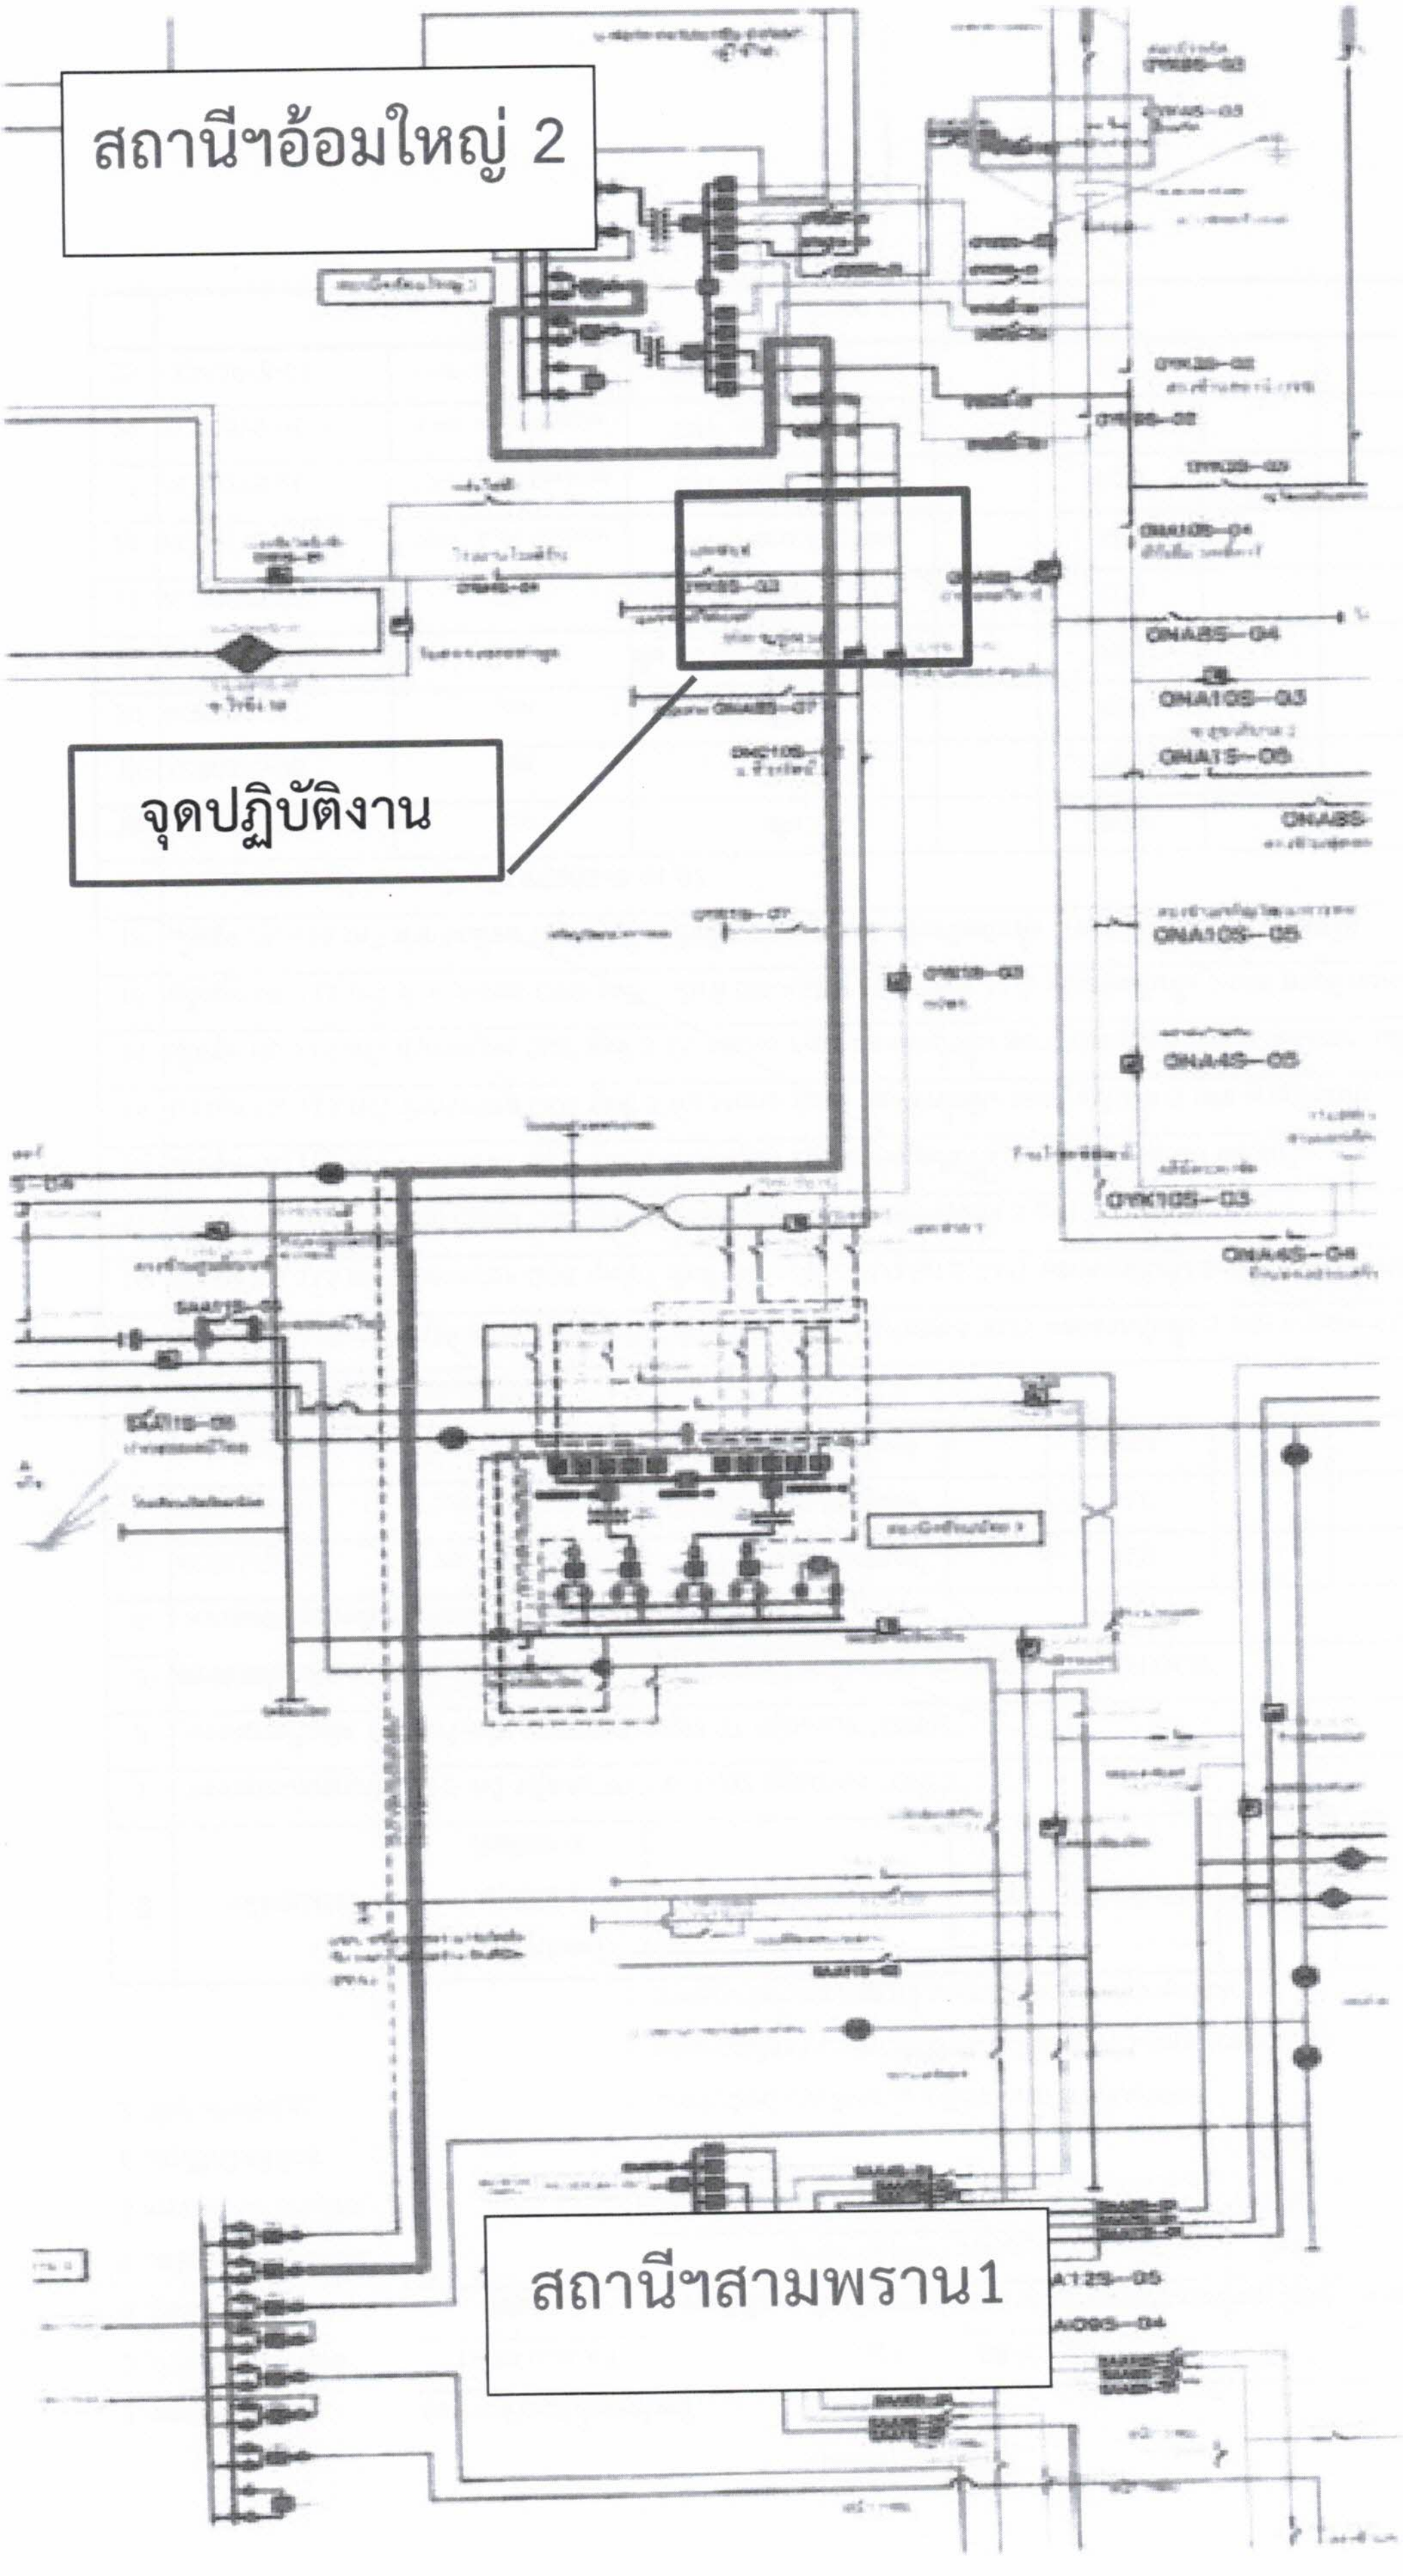
สถานีฯอ้อมใหญ่ 2
จุดปฏิบัติงาน
สถานีฯสามพราน1
ONA8S-04
ONA10S-03
ONA1S-06
ONA10S-05
ONA4S-05
OYK10S-03
ONA4S-04
