Switching Deadline
1 พ.ค. 68

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓ สค.(ปน) ๒๔๗๖ /๒๕๖๘ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล ตำแหน่ง อก.ปน.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง / รื้อถอน Sheet Pile ของงาน Pipe Jacking สำหรับงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าท่าทราย ๑ บริเวณหน้าสถานีฯท่าทราย ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	THS๑๑	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ติดตั้ง / รื้อถอน Sheet Pile ของงาน Pipe Jacking สำหรับงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าท่าทราย ๑	THS๑๑S-๐๑ หน้าสถานีฯท่าทราย ๑	THS๐๒S-๐๒ โมเดิร์นซอฟ	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร. ๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐
๒	THS๑๑	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		THS๑๑S-๐๑ หน้าสถานีฯท่าทราย ๑	THS๐๘S-๐๒ ตรงข้าม บ.ลัคกี้	
๓	THS๑๓	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		THS๑๓S-๐๑ หน้าสถานีฯท่าทราย ๑	SMB๑๓S-๐๕ ข้างสยามบูลมาร์ค	
๔	THS๑๓	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		THS๑๓S-๐๑ หน้าสถานีฯท่าทราย ๑	THS๐๑S-๐๒ เอน เอส แอล	
๕	THS๑๓	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		THS๑๓S-๐๑ หน้าสถานีฯท่าทราย ๑	จุดตัดเบรกโดยวิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี ซอย ๓ ฝั่ง URC	
๖	THS๐๙ (ปัจจุบันจ่ายจาก THU๐๓)	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		THS๐๙S-๐๒ ข้าง บ.ลัคกี้	THS๐๙S-๐๒ ข้าง บ.ลัคกี้	
๗	THS๐๙ (ปัจจุบันจ่ายจาก THU๐๓)	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		THS๐๙S-๐๒ ข้าง บ.ลัคกี้	THS๐๙S-๐๑ (ปัจจุบัน รื้อถอนแล้ว)	

๘	๑๑๕ kV	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๒	SMB๐๑YS-๐๑ พูลทรัพย์แคน	
๙	๑๑๕ kV	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๒	SMB๐๑YS-๐๓ บ.ลัคกี้	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ หน้าสถานีฯ ท่าทราย ๑ ถึง นิคมซอย ๓

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๖. โทร ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นาย วิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ THS11 จาก THS11S-01 ถึง THS025-02
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ THS11 จาก THS11S-01 ถึง THS085-02
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ THS13 จาก THS13S-01 ถึง SMB135-05
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ THS13 จาก THS13S-01 ถึง THS015-02
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเดอร์ THS13 จาก THS13S-01 ถึง กฟย ชัยนาท ฝั่ง URC
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 ฟีดเดอร์ THV03 จาก THS095-02 ถึง THS065-03
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 7 ฟีดเดอร์ THV03 จาก THS095-02 ถึง THS095-01
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 8 ฟีดเดอร์ 115kV จาก SN2-7012 ถึง SMB215S-02
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 9 ฟีดเดอร์ 115kV จาก SN2-7012 ถึง SMM01TS-03
ในวันที่ 1 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 687/68

พนักงานศูนย์ฯ นาย วีเกียรติ เสนพ่วง ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย จิรวัฒน์ บุญเพ็ญ
25 เม.ย. 68

(นายจิรวัฒน์ แก้วมณี)
วศก.5 ปฏิบัติงานแทน หย.ศฟฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟฮ.สค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 7 แผ่น
แผนผังแนบ 4 แผ่น

ผจฟ. - (สถานีฯ -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิ่ง

1. สถานที่ทำงาน หน้าสถานี ท่าทราย 1 ถึง นิคมซอย 3
2. กำหนดวันที่ทำงาน 1 พ.ค. 68 เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.สค. งานที่ทำ รื้อถอน/ติดตั้ง Sheet Pile ตามใบขอปฏิบัติงาน 689/2568
4. เตรียมการสวิทชิ่งโดย นายวีรวัชร์ เสมามิ่ง วันที่ 25 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิทชิ่งโดย วันที่ 25 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิทชิ่งโดย วันที่ 25 เมษายน 2568
7. สั่งทำสวิทชิ่งโดย
   1. นายจิรวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายวัฒนา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
   2. น.ส.พิชยา,น.ส.สุภัชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
   3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิ่ง							
2	มีงาน Switching ข้างเคียง 480/2568 (115kV ดับพื้นที่ เดียวกันเบรกเกอร์115 kV SN2 ถึง SMB01YS-03)							
3	ตรวจสอบ SF6 THS06S-03 ข้าง บ.ลักกี้ อยู่สถานะ OPEN+LOCK							
4	ตรวจสอบ SF6 THS13S-05 ซอยข้าง บ.สยามบลูมาร์ค อยู่สถานะ OPEN+LOCK							
5	ตรวจสอบ SF6 THS01S-02 บ.เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด อยู่สถานะ OPEN+LOCK							
6	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS			
7	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU			
8	SN2-KTA1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
9	THS11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS			
10	THS13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS			
11	SMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB			
12	THUBR-01	Normal	Nonreclosing		THU			
13	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU			
14	THUBR-03	Normal	Nonreclosing		THU			
15	ย้ายโหลด THS11 บางส่วนไปรับไฟจาก THU02 และ THS13 ไปรับจาก THU01							
16	THS08S-04	ปลด,ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6	หน้า บ.ที.อาร์.ซี
17	THS10S-02	ปลด	สับ		สค.	Scada	SF6	ข้าง บ.น่ารักเทียร่า
18	THU08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	ตรงข้าม บ.ลักกี้
19	THS13VB-01	สับ	ปลด		THS		CB	THS13
20	ย้ายโหลด THS11 ไปรับไฟจาก SMB01							
21	SMB01S-05	ปลด	สับ		สค.	Scada	SF6	ปากซอยนิคม
22	THS11VB-01	สับ	ปลด		THS		CB	THS11
23	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน							
24	ตรวจสอบ เบรกเกอร์ 115 kV SN7012 และ SN7017 อยู่สถานะ OPEN							
25	ตรวจสอบ ABS SMB01YS-03 อยู่สถานะ OPEN+ล็อคกุญแจ							
26	THS11S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS	POT HEAD F.11
27	THS13S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS	POT HEAD F.13
28	THS02S-02	สับ	ปลด,ล็อคคาน		สค.		SF6	บ.โมเดิร์น โปรดักส์ จำกัด
29	THS09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	ตรงข้าม บ.ลักกี้
30	แจ้งชุดงาน ไลน์โหลด ตั้งแต่ THS13S-01 ถึง จุด ตัด DDE นิคม ซอย 3 ออกทั้งหมด							
31	เมื่อชุดงาน ไลน์โหลด ตั้งแต่ THS13S-01 ถึง จุด ตัด DDE นิคม ซอย 3 ออกทั้งหมด แล้วเสร็จ							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	แจ้งชุด HOTLINE ตัด DDE THS13 บริเวณ นิคม ซอย 3 ออกทั้ง 3 เฟส							
33	เมื่อชุด HOTLINE ตัด DDE THS13 บริเวณ นิคม ซอย 3 ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
34	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน้างานรับทราบ							
35	แจ้งหน้างานเทสไฟ ช๊อตกราวด์ จุด G1							
36	แจ้งหน้างานเทสไฟ ช๊อตกราวด์ จุด G2							
37	แจ้งหน้างานเทสไฟ ช๊อตกราวด์ จุด G3							
38	แจ้งหน้างานเทสไฟ ช๊อตกราวด์ จุด G4							
39	แจ้งหน้างานเทสไฟ ช๊อตกราวด์ จุด G5							
40	แจ้งหน้างานเทสไฟ ช๊อตกราวด์ จุด G6							
41	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และช๊อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย							
42	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
43	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS			
44	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU			
45	SN2-KTA1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
46	SMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			
47	THUBR-01	Nonreclosing	Normal		THU			
48	THUBR-02	Nonreclosing	Normal		THU			
49	THUBR-03	Nonreclosing	Normal		THU			
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
50	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับ							
51	แจ้งหน้างาน ปลดช๊อตกราวด์ จุด G1							
52	แจ้งหน้างาน ปลดช๊อตกราวด์ จุด G2							
53	แจ้งหน้างาน ปลดช๊อตกราวด์ จุด G3							
54	แจ้งหน้างาน ปลดช๊อตกราวด์ จุด G4							
55	แจ้งหน้างาน ปลดช๊อตกราวด์ จุด G5							
56	แจ้งหน้างาน ปลดช๊อตกราวด์ จุด G6							
57	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS			
58	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU			
59	SN2-KTA1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
60	SMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			
61	THUBR-01	Nonreclosing	Normal		THU			
62	THUBR-02	Nonreclosing	Normal		THU			
63	THUBR-03	Nonreclosing	Normal		THU			
64	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
65	แจ้งชุด HOTLINE เชื่อม DDE THS13 บริเวณ นิคม ซอย 3 เข้าทั้ง 3 เฟส							
66	เมื่อชุด HOTLINE เชื่อม DDE THS13 บริเวณ นิคม ซอย 3 เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
67	THS02S-02	ปลด,ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6	บ.โมเดิร์น โปรดักส์ จำกัด
68	THS09S-02	ปลด	สับ		สค.		DIS	ตรงข้าม บ.ลักกี้
69	THS11S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS	POT HEAD F.11
70	THS13S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS	POT HEAD F.13
71	ย้ายโหลด THS11 กลับจาก SMB01							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
72	THS11VB-01	ปลด	**สับ คง OFF Auto Reclose**		THS		CB	THS11
73	SMB01S-05	สับ	**ปลด**		สค.	Scada	SF6	ปากซอยนิคม
74	**ย้ายโหลด THS11 บางส่วนกลับจาก THU02 และ THS13 กลับจาก THU01**							
75	THS13VB-01	ปลด	**สับ คง OFF Auto Reclose**		THS		CB	THS13
76	THU08S-02	ปลด	**สับ**		สค.		DIS	ตรงข้าม บ.ลักกี้
77	THS08S-04	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		สค.		SF6	หน้า บ.ที.อาร์.ซี
78	THS10S-02	สับ	**ปลด**		สค.	Scada	SF6	ข้าง บ.น่ารักเทียร่า
79	THS-TP3	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		THS			
80	THU-TP1	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		THU			
81	SN2-KTA1	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		EGAT			
82	THS11VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		THS			
83	THS13VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		THS			
84	SMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		SMB			
85	THUBR-01	Nonreclosing	**Normal**		THU			
86	THUBR-02	Nonreclosing	**Normal**		THU			
87	THUBR-03	Nonreclosing	**Normal**		THU			
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

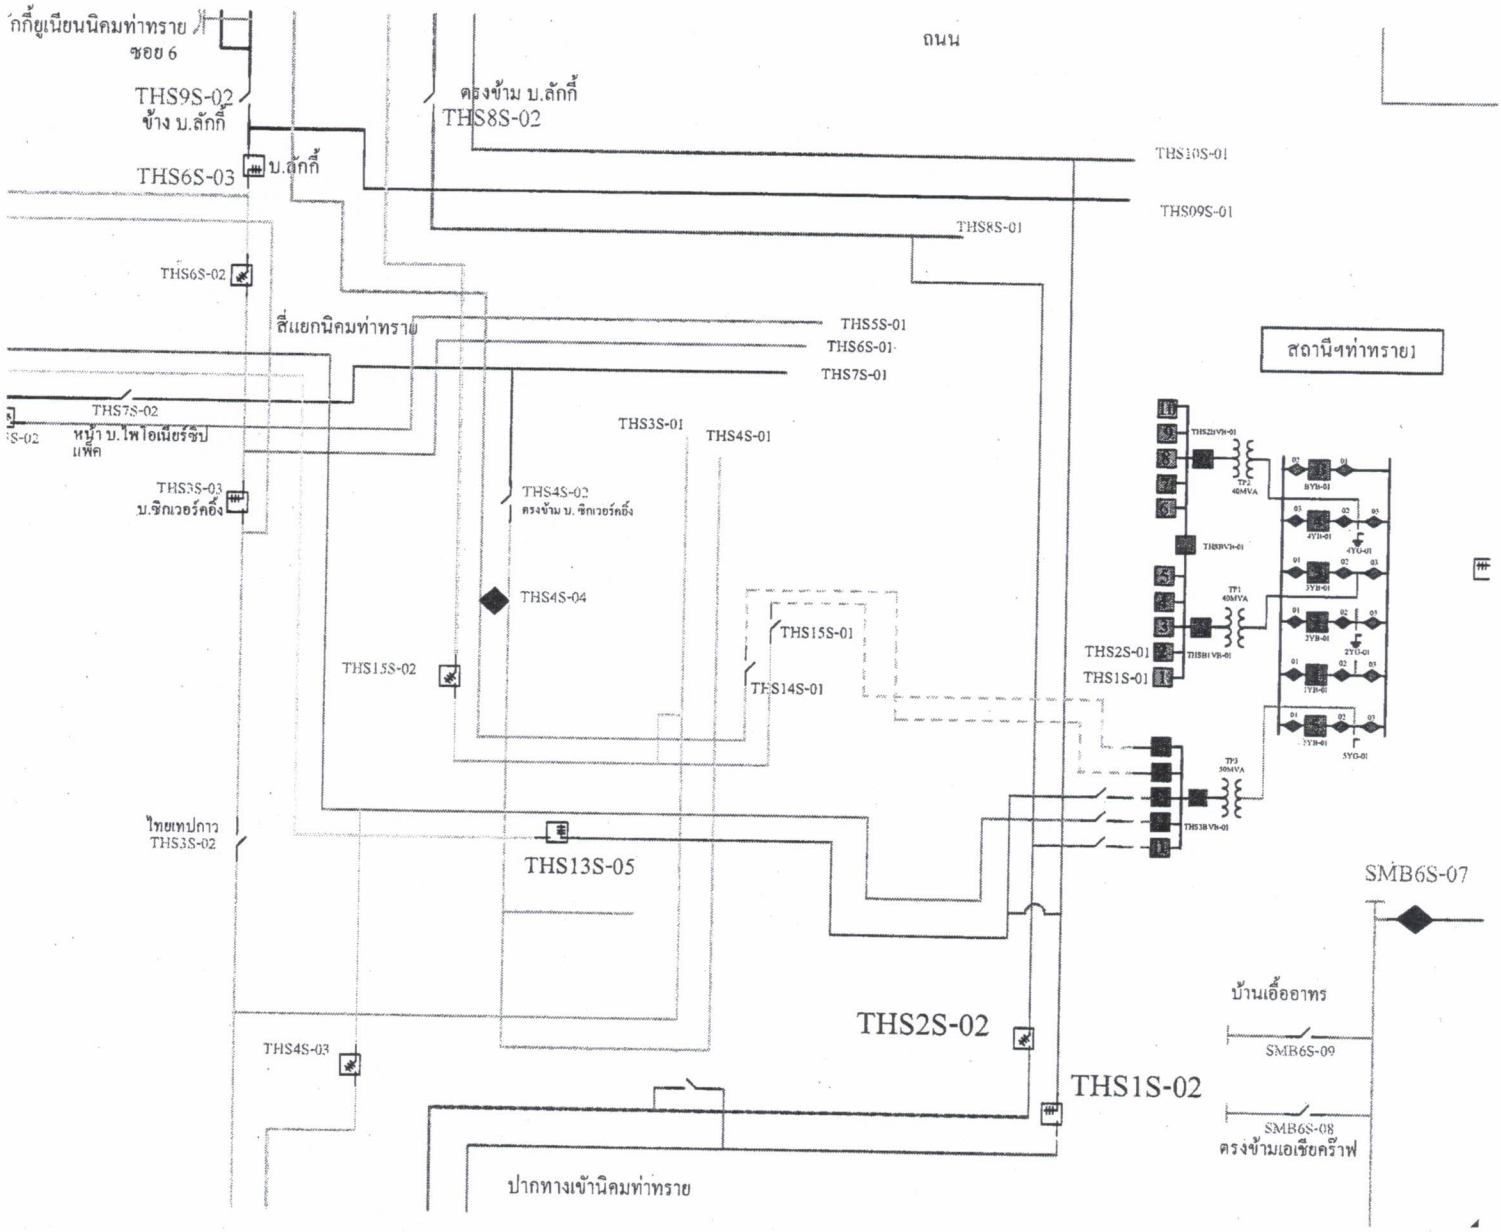

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

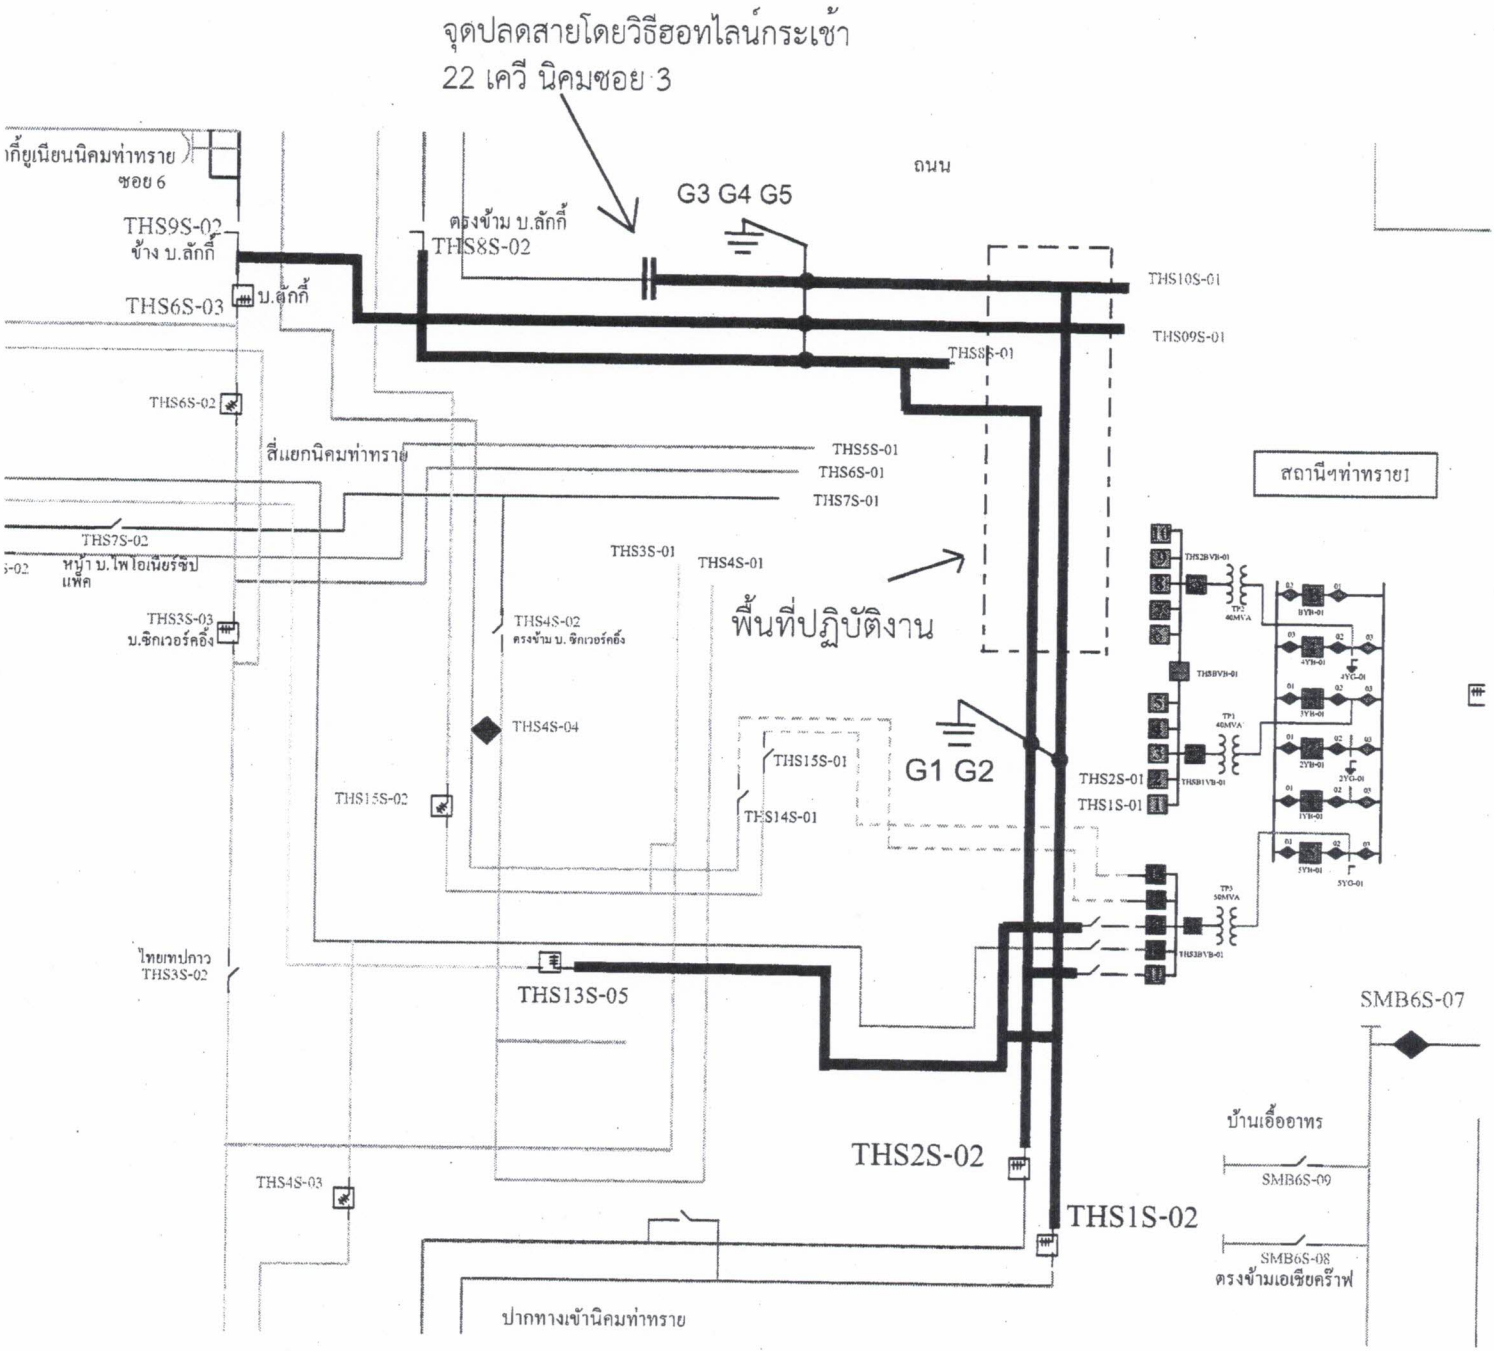

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

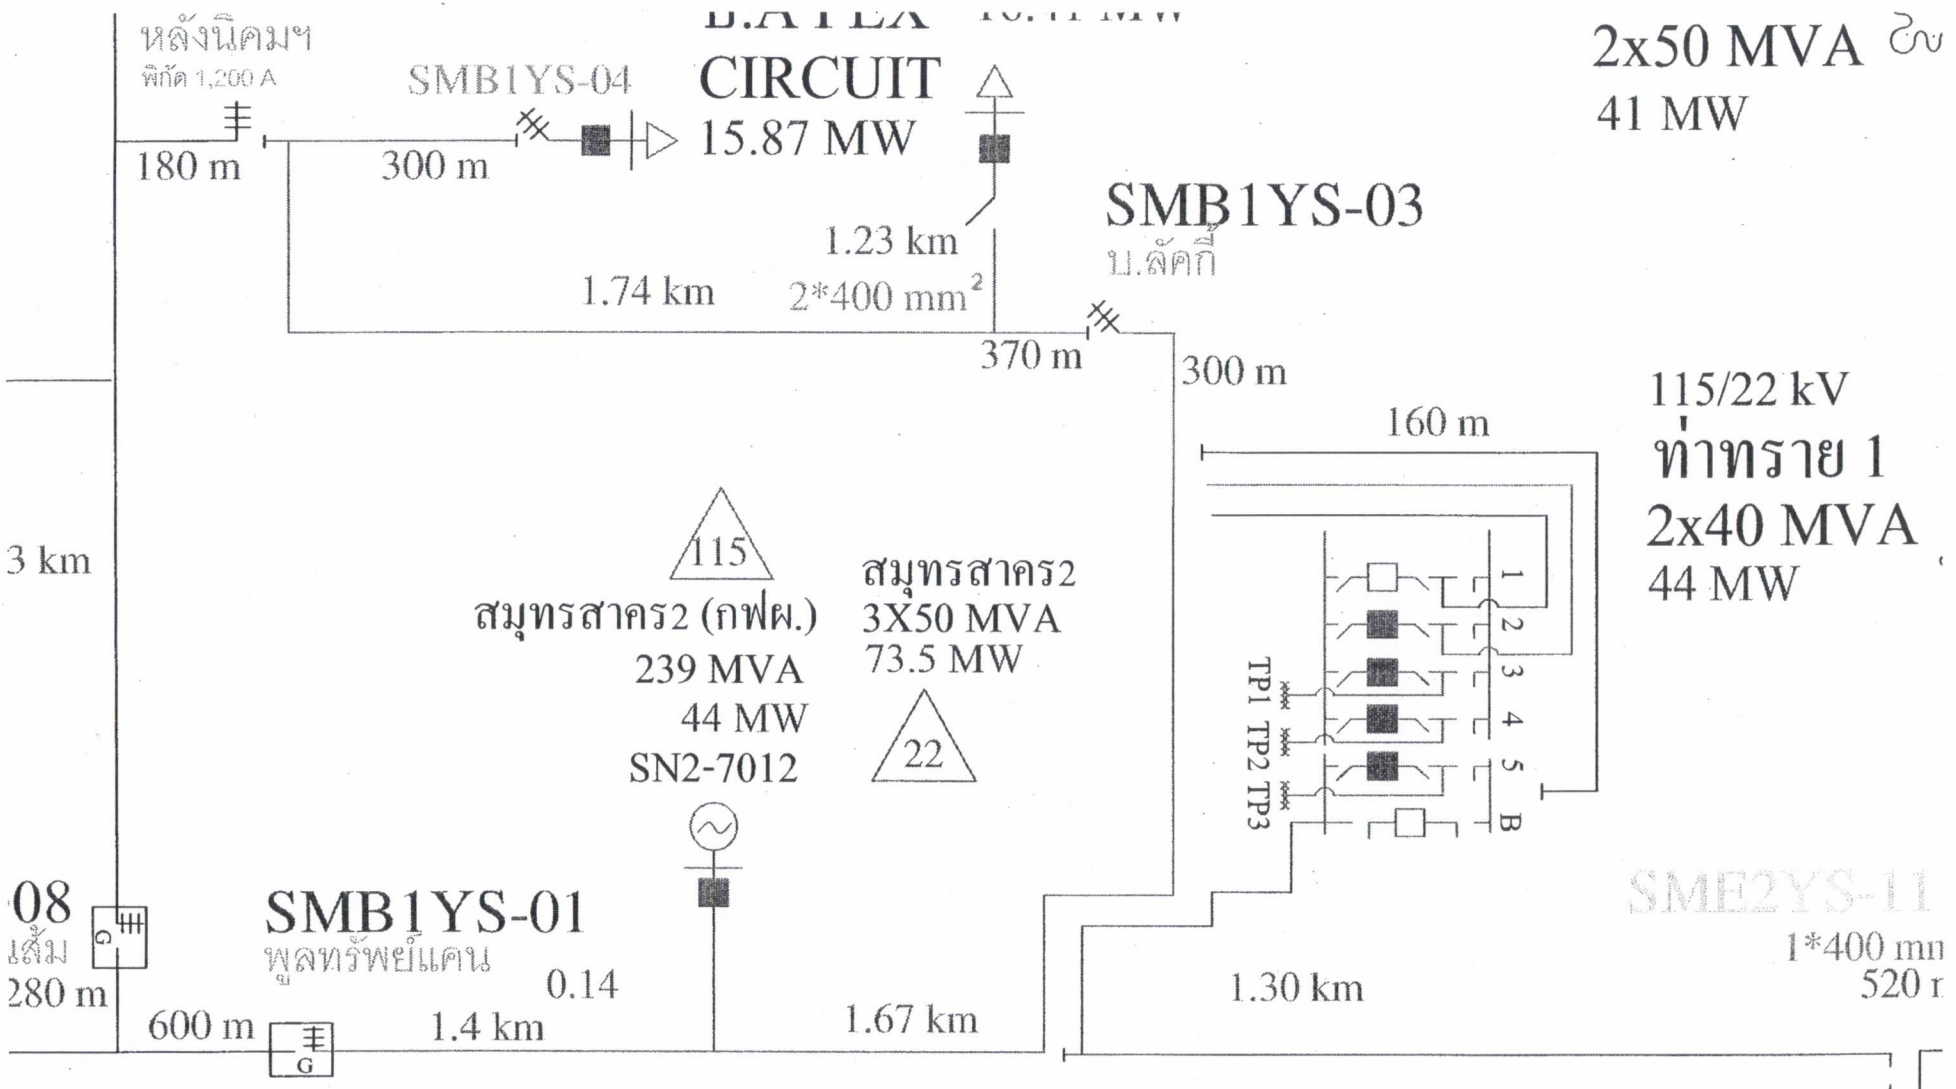
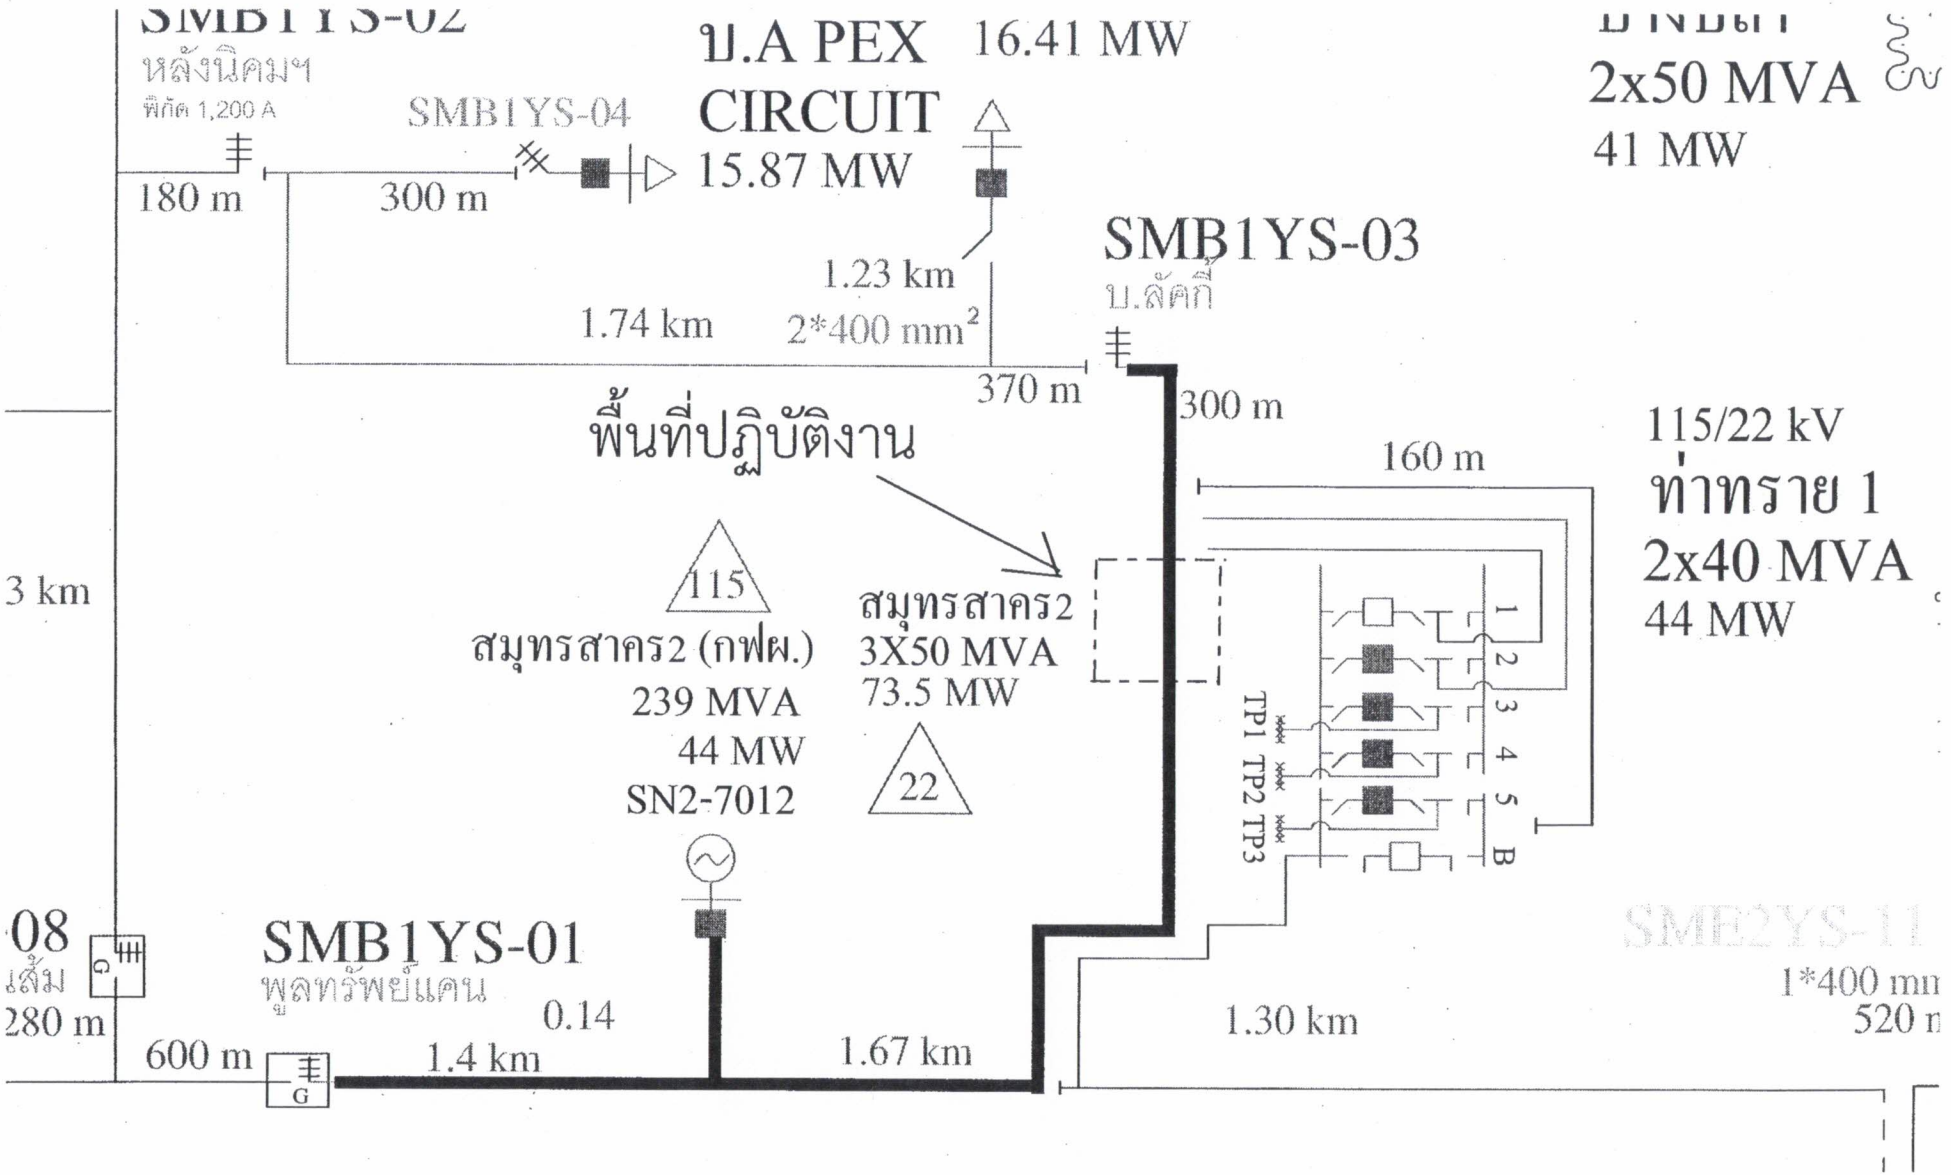
สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน
